

# 平潭综合实验区公安指挥情报中心 水土保持设施验收报告



厦门市国水水务咨询有限公司

二〇一八年一月



# 生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书 (正本)

单位名称：厦门市国水水务咨询有限公司

法定代表人：曹声九

单位等级：★★(2星)

证书编号：水保方案(闽)字第0051号

有效期：自2016年06月01日至2019年05月31日

发证机构：中国水土保持学会

发证时间：2016年05月31日

## 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 前 言.....                     | 1  |
| 1 项目及项目区概况 .....             | 1  |
| 1.1 项目概况.....                | 1  |
| 1.1.1 地理位置.....              | 1  |
| 1.1.2 主要技术指标 .....           | 1  |
| 1.1.3 项目投资.....              | 2  |
| 1.1.4 项目组成及布置 .....          | 2  |
| 1.1.5 施工组织及工期 .....          | 5  |
| 1.1.6 土石方情况.....             | 7  |
| 1.1.7 征占地情况.....             | 8  |
| 1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建情况 ..... | 8  |
| 1.2 项目区概况.....               | 8  |
| 1.2.1 自然条件.....              | 8  |
| 1.2.2 水土流失及防治情况 .....        | 9  |
| 2 水土保持方案和设计情况 .....          | 11 |
| 2.1 主体工程设计.....              | 11 |
| 2.2 水土保持方案.....              | 11 |
| 2.3 水土保持设计变更 .....           | 11 |
| 2.4 水土保持后续设计.....            | 12 |
| 3 水土保持方案实施情况 .....           | 13 |
| 3.1 水土流失防治责任范围 .....         | 13 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 3.1.1 批复的水土流失防治责任范围 .....  | 13        |
| 3.1.2 实际扰动和影响范围 .....      | 14        |
| 3.1.3 水土流失防治责任范围变化情况 ..... | 14        |
| 3.2 弃渣场设置 .....            | 16        |
| 3.3 取土场设置 .....            | 16        |
| 3.4 水土保持措施总体布局 .....       | 16        |
| 3.4.1 水土流失防治分区 .....       | 16        |
| 3.4.2 水土保持设施总体布局情况 .....   | 17        |
| 3.4.3 水土保持措施工程量及概算 .....   | 17        |
| 3.5 水土保持设施完成情况 .....       | 21        |
| 3.5.1 水土保持工程措施完成情况 .....   | 21        |
| 3.5.2 水土保持植物措施完成情况评估 ..... | 22        |
| 3.5.3 水土保持临时措施完成情况 .....   | 24        |
| 3.6 水土保持投资完成情况 .....       | 26        |
| 3.6.1 水土保持方案批复投资 .....     | 26        |
| 3.6.2 水土保持工程实际完成投资 .....   | 26        |
| 3.6.3 投资变化情况 .....         | 27        |
| <b>4 水土保持工程质量评价 .....</b>  | <b>31</b> |
| 4.1 质量管理体系 .....           | 31        |
| 4.1.1 建设单位质量管理体系 .....     | 31        |
| 4.1.2 监理单位质量管理体系 .....     | 31        |
| 4.1.3 施工单位质量管理体系 .....     | 32        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定 .....    | 32        |
| 4.2.1 项目划分及结果 .....          | 33        |
| 4.2.2 各防治分区工程质量评定 .....      | 33        |
| 4.3 弃渣场稳定性评估 .....           | 34        |
| 4.4 总体质量评价.....              | 36        |
| <b>5 项目初期运行及水土保持效果 .....</b> | <b>37</b> |
| 5.1 初期运行情况.....              | 37        |
| 5.2 水土保持效果.....              | 37        |
| 5.2.1 扰动土地整治率 .....          | 37        |
| 5.2.2 水土流失总治理度 .....         | 37        |
| 5.2.3 土壤流失控制比 .....          | 38        |
| 5.2.4 拦渣率.....               | 38        |
| 5.2.5 林草植被恢复率 .....          | 38        |
| 5.2.6 林草覆盖率.....             | 39        |
| 5.3 公众满意程度.....              | 39        |
| <b>6 水土保持管理 .....</b>        | <b>41</b> |
| 6.1 组织领导.....                | 41        |
| 6.2 规章制度.....                | 41        |
| 6.3 建设管理.....                | 42        |
| 6.4 水土保持监测.....              | 42        |
| 6.4.1 监测工作组织 .....           | 42        |
| 6.4.2 监测实施方案制定 .....         | 43        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 6.4.3 工作制度的制定 .....         | 43        |
| 6.4.4 监测分区及监测重点 .....       | 43        |
| 6.4.5 监测内容和方法 .....         | 43        |
| 6.4.6 监测过程 .....            | 44        |
| 6.4.7 监测结果 .....            | 45        |
| 6.5 水土保持监理 .....            | 46        |
| 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况 ..... | 46        |
| 6.7 水土保持补偿费缴纳情况 .....       | 46        |
| 6.8 水土保持设施管理维护 .....        | 46        |
| <b>7 结论 .....</b>           | <b>48</b> |
| 7.1 结论 .....                | 48        |
| 7.2 遗留问题安排 .....            | 49        |

## 附图：

附图 01 平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持设施竣工图

附图 02 平潭综合实验区公安指挥情报中心实施部分照片

## 附件：

- 1、平潭综合实验区水土保持监督站以平水保监审批 [2013]9 号
- 2、缴纳水土保持补偿费发票
- 3、《中华人民共和国建筑工程施工许可证》

## 前 言

随着平潭科学发展、跨越发展的全面深入，公安机关担负的维护稳定、服务发展的使命日益艰巨，为适应平潭大开放、大开发的工作需要，2011 年 5 月，福建省委编办批复同意设立平潭综合实验区公安局，内设立 4 个执法勤务机构和 1 个政工监察机构，拟在 5 年内公安民警达到编制为 600 人。平潭原有公安局位于平潭旧城区合掌街，周边民宅环绕，出入通道狭窄，难以适应公安机关快速反应的工作需要，刑侦大队综合楼位于偏僻的旧城西区，与区实验小学毗邻，上下学高峰期警车无法正常通行，且公安局综合楼和刑侦大队综合楼分别建成于 80 年代和 50 年代，年久失修，亟需搬迁改建。为尽快开展工作，更好地服务于平潭构建“两岸同胞合作建设、先行先试、科学发展的共同家园”的工作大局，建设平潭综合实验区公安指挥情报中心正是在这种背景下提出的。

受平潭综合实验区公安局委托，厦门象屿工程咨询管理有限公司和厦门中合现代工程设计有限公司于 2012 年 5 月完成《平潭综合实验区公安指挥情报中心项目建议书》，经平潭综合实验区经济发展局审查形成《平潭综合实验区经济发展局关于平潭综合实验区公安指挥情报中心项目建议书的复函》（岚综实经发函〔2011〕20 号 2011 年 11 月 3 日），于 2011 年 11 月完成《平潭综合实验区公安指挥情报中心可行性研究报告》经平潭综合实验区经济发展局审查形成《平潭综合实验区经济发展局关于平潭综合实验区公安指挥情报中心可行性研究报告的复函》（岚综实经发函〔2011〕24 号 2011 年 12 月 1 日）。

2013 年 6 月 17 日，平潭综合实验区水土保持监督站以平水保监审批 [2013]9 号文对《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》（报批稿）予以批复。

根据《中华人民共和国水土保持法》第二十七条，依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。2017年9月，《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）取消了各级水行政主管部门实施的生产建设项目水土保持设施验收审批行政许可事项，转为生产建设单位按照有关要求自主开展水土保持设施验收。2017年11月，水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知（水保〔2017〕365号）下发。

施工单位中建三局集团有限公司，完成了《平潭综合实验区公安指挥情报中心竣工验收自评报告》。监理单位厦门高诚信建设监理有限公司于2015年底编制完成了《平潭综合实验区公安指挥情报监理总结报告》。监测单位福州市闽华工程设计有限公司于2016年8月编制完成了《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持监测总结报告》。受平潭综合实验区公安局委托，厦门市国水水务咨询有限公司作为第三方机构负责编制水土保持设施验收报告。

厦门市国水水务咨询有限公司承担平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持设施验收报告工作。公司成立了验收组。验收组结合工程的实际情况，确定了验收工作遵循和执行的法规与技术标准，确定了工作程序和方法。

附表：平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持设施验收基本情况表

|                                  |           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 验收工程名称                           |           | 平潭综合实验区公安<br>指挥情报中心                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         | 验收工程地点                                                                                                          |           | 平潭综合实验区北厝镇                                                                                                                                                                                                         |  |
| 验收工程性质                           |           | 新建工程                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | 验收工程规模                                                                                                          |           | 用地面积 20310.048m <sup>2</sup> ,其中建筑用地面积 17453.860 m <sup>2</sup> 。设地下一层,地上十二层;一层至三层为裙房用房;总建筑面积 43012.92 m <sup>2</sup> ,地下建筑面积 12624.32 m <sup>2</sup> ,地上建筑面积 30388.6 m <sup>2</sup> ,建筑高度: 55.2m,屋顶直升机坪高度 65.20m。 |  |
| 所在流域                             |           | 太湖流域                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | 所属省级水土流失<br>重点防治区                                                                                               |           | 省级水土流失重点治理区                                                                                                                                                                                                        |  |
| 水土保持方案批复<br>部门、时间及文号             |           | 平潭综合实验区水土保持监督站, 2013.6.17 (平水保监审批 [2013]9 号)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 工期                               |           | 2012 年 5 月~2015 年 7 月                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 防治责任范围(hm <sup>2</sup> )         |           | 水土保持方案确定的防治责任范围                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |           | 2.31                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                  |           | 实际扰动和影响范围                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |           | 2.20                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                  |           | 验收建设单位防治责任范围                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |           | 2.20                                                                                                                                                                                                               |  |
| 方案<br>拟定<br>水土<br>流失<br>防治<br>目标 | 扰动土地整治率%  | 95                                                                                                                                                                                            | 实际完成水土流失<br>防治指标                                                                                                                                        |                                                                                                                 | 扰动土地整治率%  | 95                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                  | 水土流失总治理度% | 97                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 水土流失总治理度% | 97                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                  | 土壤流失控制比   | 1.0                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 土壤流失控制比   | 1.05                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                  | 拦渣率%      | 95                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 拦渣率%      | 95                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                  | 林草植被恢复率%  | 98                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 林草植被恢复率%  | 98                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                  | 林草覆盖率%    | 27                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 | 林草覆盖率%    | 27                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 主要工程量                            |           | 工程措施                                                                                                                                                                                          | 雨水管1232m, 透水砖213m <sup>3</sup> , 覆土0.17万m <sup>3</sup> , 土地整治0.56hm <sup>2</sup>                                                                        |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                  |           | 植物措施                                                                                                                                                                                          | 绿化面积 0.56hm <sup>2</sup> , 铺马尼拉草皮 0.56hm <sup>2</sup> 、种植小叶榕 319 株、南洋杉 3 株、羊蹄甲 3 株、三角梅 14 株、红花紫荆 1 株、紫叶美人蕉 333 株、黄杨球 16 株、黄金榕 53 株、红花檵木 162 株、鸡蛋花 180 株 |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                  |           | 临时措施                                                                                                                                                                                          | 铺塑料薄膜 1110m <sup>2</sup> , 浆砌石排水沟 417m, 浆砌石沉沙池 8 座, 砌砖挡墙 86m, 砌砖集水井 4 座                                                                                 |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 工程质量评定                           |           | 评定项目                                                                                                                                                                                          | 总体质量评定                                                                                                                                                  |                                                                                                                 | 外观质量评定    |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                  |           | 工程措施                                                                                                                                                                                          | 合格                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 合格        |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                  |           | 植物措施                                                                                                                                                                                          | 合格                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 合格        |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 投资(万元)                           |           | 水土保持方案投资(万元)                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | 182.28                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                  |           | 实际投资(万元)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         | 157.22                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                  |           | 投资增减原因                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                         | ① 地形因素的影响造成措施类型和工程量增加②降雨的影响造成措施类型和工程量增加③实际施工过程中措施工程量的变化④植物措施的特殊性⑤人工单价和材料费的变化⑥独立费用中, 水土保持监理费、水土保持监测费减少, 咨询服务费不计。 |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 工程总体评价                           |           | 工程水土保持方案审批手续完备, 水土保持工程管理、设计、施工、监理、监测、财务等建档资料齐全。水土保持设施按批准的水土保持方案要求建成, 符合要求。六项防治目标达到了方案目标值。水土保持设施具备正常运行条件, 且能持续、安全、有效运转, 符合交付使用要求, 且水土保持设施的管理、维护措施已得到落实。总体达到了验收标准, 已具备水土保持设施竣工验收条件, 水土保持设施验收合格。 |                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 方案编制单位                           |           | 福建省水利水电勘测设计研究院                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 主要施工单位                                                                                                          |           | 中建三局集团有限公司                                                                                                                                                                                                         |  |
| 水保监测单位                           |           | 福州市闽华工程设计有限公司                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | 主要监理单位                                                                                                          |           | 厦门高诚信建设监理有限公司                                                                                                                                                                                                      |  |
| 验收评估单位                           |           | 厦门市国水水务咨询有限公司                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         | 建设单位                                                                                                            |           | 平潭综合实验区公安局                                                                                                                                                                                                         |  |
| 地 址                              |           | 厦门市湖里区枋湖北二路 1521 号六层 H1 单元                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                         | 地 址                                                                                                             |           | 福建省福州市平潭县北厝镇天山北路 1 号                                                                                                                                                                                               |  |

|      |                                                        |      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 联系人  | 唐文彬                                                    | 联系人  | 林而凤                                                    |
| 电 话  | 15880005081                                            | 电 话  | 13805026283                                            |
| 电子邮箱 | <a href="mailto:Fjjezxgs@126.com">Fjjezxgs@126.com</a> | 电子邮箱 | <a href="mailto:451949006@qq.com">451949006@qq.com</a> |

## 1 项目及项目区概况

### 1.1 项目概况

#### 1.1.1 地理位置

平潭综合实验区公安指挥情报中心位于平潭综合实验区北厝镇，渔平大道南侧，天大山东路东侧。原始用地主要为水域和排洪沟，地势低洼，经场地吹填平整。

项目周边临近金井湾商务营运中心，西侧为平潭协和医院。地块地处平潭主要入岛干道，北眺牛寨山。

#### 1.1.2 主要技术指标

平潭综合实验区公安指挥情报中心位于平潭综合实验区北厝镇，渔平大道南侧，天大山路东侧。主体工程总用地面积  $20310.048\text{m}^2$ ，其中建筑用地面积  $17453.860\text{m}^2$ 。地上总建筑面积  $30950\text{m}^2$ ，地下建筑面积  $12550\text{m}^2$ ，设地下一层，地上十二层。工程总投资为  $19873.74$  万元，其中土建投资  $16537.52$  万元，项目设计建设期为  $2.25$  年，从  $2012$  年  $5$  月至  $2014$  年  $7$  月。工程实际工期  $39$  个月( $2012$  年  $5$  月~ $2015$  年  $7$  月)。

本工程水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区，防治责任范围共计  $2.31\text{hm}^2$ ，其中项目建设区面积  $2.04\text{hm}^2$ ，直接影响区面积  $0.27\text{hm}^2$ 。

本工程所在地基本由金井湾组团平整完毕，项目产生弃方来自于地下室(包括地下室本身、基坑、桩基)开挖，本项目土石方开挖量  $77500\text{m}^3$ ，回填利用方量  $36600\text{m}^3$ ，弃方量  $40900\text{m}^3$ ，弃方由相关部门统一调配进行综合利用，项目区绿化覆土由该项目施工阶段园林绿化公司负责。

本工程特性及主要技术指标如下。

表 1.1-1 主要工程技术指标

| 序号 | 项 目    |        | 单位             | 数量        |
|----|--------|--------|----------------|-----------|
| 1  | 总用地面积  |        | m <sup>2</sup> | 20310.048 |
| 2  | 建设用地面积 |        | m <sup>2</sup> | 17453.860 |
| 3  | 总建筑面积  |        | m <sup>2</sup> | 43500     |
|    | 其中     | 地上建筑面积 | m <sup>2</sup> | 30950     |
|    |        | 地下建筑面积 | m <sup>2</sup> | 12550     |
| 4  | 建筑占地面积 |        | m <sup>2</sup> | 5585      |
| 5  | 绿地面积   |        | m <sup>2</sup> | 5236      |
| 6  | 建筑密度   |        | %              | 32.0      |
| 7  | 容积率    |        | /              | 1.77      |
| 8  | 绿地率    |        | %              | 30.0      |
| 9  | 停车数    |        | 部              | 342       |
|    | 其中     | 地面停车数  | 部              | 48        |
|    |        | 地下停车数  | 部              | 294       |

### 1.1.3 项目投资

总投资为 19873.74 万元，其中土建投资 16537.52 万元，本项目建设资金由中央与地方按比例投入，由国家发改委、公安部专项拨款和平潭综合实验区财政拨款解决。

实际完成投资 12757.9 万元。

### 1.1.4 项目组成及布置

#### 1.1.4.1 项目组成

### ①总体布局

考虑周边建筑群体关系及对外展示的形象，公安指挥情报中心以“H”布局，板式高层建筑，形成坐北朝南的建筑体量。裙房主要布置于东西两侧，形成主要的对外功能用房及后勤用房，并能够对应相适应的道路等级。主楼为 12 层板式高层，南北朝向，具有良好的朝向及景观，总体布局中已考虑北侧城市主干道（渔平大道）的景观要求，南北立面效果相同。

### ②广场·景观

公安指挥情报中心根据不同的功能要求，西侧沿天大山路设置市民步行广场，为对外功能设置。南侧沿规划道路设置主要机动车出入口，并设置主要入口广场，组织进入大楼的不同车行路线。东侧为后勤组织广场。并留有充足的活动场地。场地北侧设置有大量的停车场地。

### ③主要出入口

出入口布置结合功能与区域划分的原则，充分考虑人车分流，交通顺畅的原则。主要车行出入口：根据主要的城市道路走向，西侧天大山路为主要城市车流必经道路，考虑外来人员进出，方案将办证大厅、对外的服务窗口及信访入口设置于此。南侧为内部办公主要出入口，并设置地下室出入口。东侧沿城市支路设置后勤入口。充分利用现状地形地貌、周边条件。根据城市道路规划要求在西侧城市主干道天大山路、南侧及西侧城市支路设置机动车出入口。

### ④院区绿化与院落空间

院区绿化，总体规划中考虑合理利用北侧渔平大道 30m 绿化带，结合休闲设施，形成优美的景观环境。屋面绿化：考虑南方气候特点，在屋面设计“空中化园”，结合行政办公流行的“茶吧”统一考虑充分体现生态绿化的建筑特色。空中绿化：利用盆栽植物美化建筑空间，

体现“处处见绿”的办公建筑新形象。

#### ⑤停车位

遵循人车分流的原则，停车以地下停车为主，是城市办公建筑的特点。停车库结合地下空间设计，停车位为 294 辆；汽车出入口设置两个，结合南侧主要广场设计。西北侧设置有 48 部地面停车位，可供外来人员使用。

⑥消防车道：结合城市现有的环状交通路线，形成建筑的环形交通兼消防车道。

#### 1.1.4.2 项目布置

项目设地下一层，地上十二层；一层至三层为裙房用房；四至十二层均为指挥中心业务用房及办公用房。

平面布置采用方格网布置，形成合理的办公及地下停车柱距。

不同功能分层布置，充分考虑各种人员流线的短捷、方便、动力设备布置集中。

采用单侧核心筒布置，有利于办公的功能布置。

方整、宽阔的底层大堂，充分展示政法建筑形象。各层布局如下：

-1F：设备，地下车库，人防

1F：食堂，信访大厅，办证大厅，办案用房，网络安全及信息通讯机房

2F：大堂，档案房，物资仓库，装备库、警务技能训练用房

3F：视频会议室，报告厅

4F：刑侦技术用房（法医实验室、理化实验室、DNA 检验室等）

5F：技术业务用房

6F~7F：机关办公用房、备勤用房

8F~10F：技术业务用房、备勤用房

11F~12F：指挥中心用房，机要工作用房

## ②屋面停机坪

为满足公安现代化工作及应急指挥需要，项目在屋顶层专门设置直升机专用停机坪，作为一个专门的子项。

### 1.1.1.5 施工组织及工期

#### 1.1.1.5.1 主要建筑材料及水电供应

本工程所需的主要建筑材料砖、砂料、石料等全部从邻近地区市场采购，采购砂、石料等建筑材料要选择合法的料场，水土流失防治由相应料场经营者负责，其水土流失防治不在项目水土保持方案编制内容中。钢筋、水泥选用大厂生产的、质量稳定的产品，由厂家直接供应。

根据平潭总体性规划，主要岛内供水是从已建的福清闽江调水工程龙高支线东林水库取水，首期规模为 4.11 万  $\text{m}^3/\text{日}$ ，二期规模为 7.32 万  $\text{m}^3/\text{日}$ ；中远期考虑从闽江大樟溪古城村取水，经过长乐三溪水库或福清东张水库分水后，供应给实验区的水量最终规模为 51.8 万  $\text{m}^3/\text{日}$ 。主岛规划两座自来水厂。一座在三十六脚湖附近的原北楼山自来水厂厂址上扩建；另一座位于主岛北部的中楼村附近。由水厂引管至项目区供水。

供电规划期内主岛设置 1 座 500kV 变电站，5~6 座 220kV 变电站，14 座 110kV 变电站。220kV 网架以 500kV 平潭变电站为中心，形成两个双环网网架。同时由主岛引 2 回与福清华塘变电站连接。项目区电力供应通过就近开闭所及变电站解决。

#### 1.1.1.5.2 交通运输

平潭目前的交通条件已大大改善。2010 年 11 月 30 日，福建省第一座真正意义上的跨海特大桥平潭海峡大桥建成通车；2011 年 12 月，渔平高速公路正式通车，使平潭岛对外陆路交通结束了轮渡历史，

并且使平潭从海岛经济形态变成半岛经济形态，更加有利于开放开发。

从福州、厦门、泉州等中心城市通往平潭均已实现全程高速公路交通，二、三个小时即可到达。平潭海峡大桥副桥也于 2013 年底建成通车，合福高铁平潭上岛铁路、长乐至平潭高速公路也已开工建设。交通条件大改善将为平潭腾飞插上翅膀。项目所在区域为金井湾组团，交通条件十分便捷。

#### 1.1.5.3 施工生产生活区

本工程设施工生产生活区一处，位于主体工程西北侧，占地  $0.02\text{hm}^2$ ， $0.01\text{hm}^2$  位于主体工程区内， $0.01\text{hm}^2$  位于主体工程区外。

#### 1.1.5.4 临时堆置区

本工程设临时堆置区一处，主要堆放需转运它处综合利用的工程土方，位于主体工程北侧，占地  $0.04\text{hm}^2$ ，位于主体工程区内。

#### 1.1.5.5 工期

平潭综合实验区公安指挥情报中心设计建设总工期 2.25 年，拟于 2012 年 5 月开工，2014 年 7 月竣工。本项目设计施工进度详见表 1.1-2。

工程实际工期 39 个月（2012 年 5 月～2015 年 7 月）。开工日期：2012 年 5 月 26 日，竣工日期 2015 年 7 月 15 日，本工程施工许可证编号为 350400201212270201。

表 1.1-2 设计施工进度表

| 序号 | 年度、季度<br>工程项目名称 | 2012年 |   |   |   | 2013年 |   |   |   | 2014年 |   |   |   |
|----|-----------------|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|
|    |                 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 |
| 1  | 前期工作            |       | — |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 2  | 地下室工程           |       |   | — | — |       |   |   |   |       |   |   |   |
| 3  | 地上建安工程          |       |   |   |   | —     | — | — | — |       |   |   |   |
| 4  | 室外配套工程          |       |   |   |   |       |   |   | — | —     |   |   |   |
| 5  | 竣工              |       |   |   |   |       |   |   |   |       | — |   |   |

### 1.1.6 土石方情况

本工程所在地现已基本由金井湾组团平整完毕，项目产生弃方来自于地下室（包括地下室本身、基坑、桩基）开挖，本项目土石方开挖量 77500m<sup>3</sup>，回填利用方量 36600m<sup>3</sup>，弃方量 40900m<sup>3</sup>，弃方由相关部门统一调配进行综合利用，后期项目区绿化覆土由该项目施工阶段园林绿化公司负责。

弃方由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配，由平潭综合实验区

金井湾组团建设指挥部协力科技园区回填工程进行综合利用，相应水土流失责任 应由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部负责。

由于本项目所需土料采用外购，因此其水土流失防治责任属于土料场的开采单位或个人；土料在周边合法料场采购，在购置合同中明确水土流失防治责任。

项目实际挖方量 7.33 万 m<sup>3</sup>，填方量 3.92 万 m<sup>3</sup>；弃方 3.41 万 m<sup>3</sup>，弃方由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配至协力科技园区回填工程进行综合利用。

### 1.1.7 征占地情况

表 1.1-3

工程占地一览表

单位:  $\text{hm}^2$ 

| 序号 | 项目内容    | 建设用地 | 占地类型  |
|----|---------|------|-------|
| 1  | 主体工程区   | 2.03 | 永久    |
| 2  | 临时堆置区   | 0.04 | 临时    |
| 3  | 施工生产生活区 | 0.02 | 临时    |
| 4  | 合计      | 2.04 | 永久+临时 |

注: 1.临时堆置区占地  $0.04\text{hm}^2$ , 位于主体工程区占地范围内;  
 2.施工生产生活区占地  $0.02\text{hm}^2$ ,  $0.01\text{hm}^2$ 位于主体工程区占地范围内,  
 $0.01\text{hm}^2$ 位于主体工程区占地范围外;  
 3.合计中不计重复占地部分。

### 1.1.8 移民安置和专项设施改(迁)建情况

本项目不涉及移民和安置和专项设施建设。

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 自然条件

#### 1.2.1.1 地形地貌

项目区北侧为 305 省道, 场地总体地势平坦, 局部为池塘, 西北面分布有河道, 场地附近店面标高约在  $0.3\sim 3\text{m}$  之间, 场地地貌单元主要为冲淤积平原地貌, 地质分区属淤积、冲积区, 所在地基本地震加速度值为  $0.10g$ , 抗震设防烈度 7 度, 特征周期为  $0.45\text{s}$ 。

#### 1.2.1.2 地质条件

工程地质分区属淤积、冲积区。岩土层多为冲淤积成因类型, 基底为不同风化程度的花岗岩。场地地层结构及岩性特征自上而下描述如下: 耕植土(厚度  $2\sim 3\text{m}$ )—淤泥质土(厚度  $10\sim 15\text{m}$ )—粘土(厚度  $6\sim 10\text{m}$ )—淤泥质土(厚度  $8\sim 12\text{m}$ )—粉质粘土(厚度  $4\sim 6\text{m}$ )—残积粘性土(厚度约  $9\text{m}$ )—全风化花岗岩(厚度  $1.6\text{m}$ )—强风化花岗岩(厚

度 2~8m) 一中风化花岗岩 (厚度约 6m)。

### 1.2.1.3 气象

项目区属亚热带海洋性季风气候, 多年平均气温 19.6℃, 多年平均日照 1919.7h。多年平均降水量 1172mm, 蒸发量 1300mm, 风力年平均风速 6.9m/s, 气象灾害主要是台风、大风、暴雨、干旱等。

### 1.2.1.4 水文

项目区 10 年一遇高水位 4.61m, 50 年一遇高水位 4.96m, 100 年一遇高水位 5.11m, 200 年一遇高水位 5.23m。

项目区北侧有一个排洪渠, 宽约 5.0m, 深约 3.5m。根据实际调查咨询, 基本能满足周边排水。

### 1.2.1.5 土壤、植被

项目区土壤以红壤为主, 土壤有机质含量较低, 土壤团粒结构差, 土壤保水和渗透能力较差, 极易被流水冲蚀, 一旦地表扰动和植被破坏后, 不但产生严重水土流失, 且流失量加大。

本项目场地为盐田吹填造地, 地表土壤为素填土。

平潭植被主要有木麻黄林、黑松林、台湾相思树林等, 项目所在地无植被覆盖。

## 1.2.2 水土流失及防治情况

工程涉及平潭综合实验区金井湾片区北厝镇。

该工程占地区域地形起伏不大, 原地表水土流失以面状水力侵蚀为主, 风力侵蚀不突出。根据批准的水土保持方案报告书, 项目区土壤侵蚀背景值为 400 ( $t/km^2 \cdot a$ ), 容许土壤流失量为 500 ( $t/km^2 \cdot a$ )。

根据《福建省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》(闽政〔1999〕文 205 号), 项目所在的平潭综合实验区金井湾片区北厝镇属于省级水土流失重点治理区。

工程所经地区水土流失的主要类型为水力侵蚀，以面蚀和沟蚀为主，风力侵蚀不占主导因素，造成水土流失的主要原因是该地区降雨强度大且集中，形成地表径流的冲刷力大，一旦地表植被破坏，极易造成严重的水土流失。

该工程为新建建设类项目，施工过程中不可避免的发生一定的水土流失。工程建设过程中易产生水土流失的区域主要为扰动地表裸露迹等，主要包含以下几个方面：

本工程地处南方丘陵区，挖填方量较小，工程所在地已基本由金井湾组团平整完毕，项目产生弃方来自于地下室（包括地下室本身、基坑、桩基）开挖，且无永久弃渣，施工造成的水土流失主要是在地下室边坡和临时堆置区。

本工程水土流失主要产生于施工期，尤其是雨季施工，容易造成溅蚀、沟蚀，甚至是塌方等侵蚀现象。另外，建设过程中，由于工程施工机械化程度高，机械的使用将不可避免的扰动和破坏原地貌、植被，引起部分水土流失。

项目水土流失主要集中在主体工程区，施工过程中地下室、基坑、建筑物桩基）开挖扰动裸露面和土石方临时转运水土流失较为严重，产生的水土流失会淤积沟道、破坏生态，对周边地区的生产和生活带来不良影响。工程在施工过程中采取了覆盖、拦挡、排水、沉沙等水土保持措施，有效地防治了项目施工过程中的水土流失，最大程度的降低了项目区的水土流失危害。

## 2 水土保持方案和设计情况

### 2.1 主体工程设计

2011 年 11 月，厦门象屿工程咨询管理有限公司、厦门中合现代工程设计有限公司编制完成《平潭综合实验区公安指挥情报中心可行性研究报告》。

2011 年 12 月，平潭综合实验区经济发展局审查形成《平潭综合实验区经济发展局关于平潭综合实验区公安指挥情报中心可行性研究报告的复函》（岚综实经发函〔2011〕24 号）。

2012 年 12 月，平潭综合实验区交通与建设局印发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》。

开工日期：2012 年 5 月 26 日，竣工日期 2015 年 7 月 15 日，施工许可证编号为 350400201212270201。

### 2.2 水土保持方案

2013 年 4 月，福建省水利水电勘测设计研究院编制完成《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》（送审稿）。

2013 年 5 月，编制单位完成《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》（报批稿）。

2013 年 4 月 18 日，平潭综合实验区水土保持监督站以平水保监审批[2013]9 号文对《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》（报批稿）予以批复

### 2.3 水土保持设计变更

平潭综合实验区公安指挥情报中心建设按批复的《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》实施，没有水土保持设计变更。

## 2.4 水土保持后续设计

为了切实做好本工程水土保持工作，平潭综合实验区公安局将经平潭综合实验区水土保持监督站批复的《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》，作为水土保持工程的设计依据， 并将方案制订的防治措施内容和投资纳入主体工程后续设计文件中。不再行水土保持初步设计、施工图设计。

### 3 水土保持方案实施情况

#### 3.1 水土流失防治责任范围

##### 3.1.1 批复的水土流失防治责任范围

根据平潭综合实验区水土保持监督站《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书（报批稿）》的批复（平水保监审批 [2013]9号）。同意该工程水土流失防治责任范围面积为  $2.31\text{hm}^2$ ，其中项目建设区  $2.04\text{hm}^2$ ，直接影响区  $0.27\text{hm}^2$ 。项目区的防治责任范围详见表 3.1-1。

水土保持防治责任范围表

表 3.1-1

单位： $\text{hm}^2$

| 项目    | 建设区域    | 占地面积 | 占地性质 | 行政区划            | 备注            |
|-------|---------|------|------|-----------------|---------------|
| 项目建设区 | 主体工程区   | 2.03 | 永久   | 平潭综合实验区金井湾片区北厝镇 |               |
|       | 施工生产生活区 | 0.02 | 临时   |                 |               |
|       | 临时堆置区   | 0.04 | 临时   |                 |               |
|       | 小计      | 2.04 |      |                 |               |
| 直接影响区 | 主体工程区   | 0.27 | 临时   | 平潭综合实验区金井湾片区北厝镇 | 取占地范围外围 5m 区域 |
|       | 施工生产生活区 |      | 临时   |                 |               |
|       | 临时堆置区   |      | 临时   |                 |               |
|       | 小计      | 0.27 |      |                 |               |
| 合计    |         | 2.31 |      |                 |               |

注：1.临时堆置区占地 $0.04\text{hm}^2$ ，位于主体工程区占地范围内；

- 2.施工生产生活区占地  $0.02\text{hm}^2$ ， $0.01\text{hm}^2$  位于主体工程区占地范围内， $0.01\text{hm}^2$  位于主体工程区占地范围外；
- 3.合计中不计重复占地部分。

### 3.1.2 实际扰动和影响范围

根据验收组查阅相关用地批复并现场实地核实，本工程建设实际征占地面积  $2.04\text{hm}^2$ 。实际直接影响区  $0.16\text{hm}^2$ ，实际水土流失防治责任范围  $2.2\text{hm}^2$ ，比方案批复面积  $2.31\text{hm}^2$  减少  $0.11\text{hm}^2$ 。项目建设产生的防治责任范围与水保方案批复情况对比详见表 3.1-2。

表 3.1-2 工程实际水土保持防治责任范围表 单位： $\text{hm}^2$

| 项目    | 建设区域    | 占地面积 | 占地性质 | 行政区划            | 备注              |
|-------|---------|------|------|-----------------|-----------------|
| 项目建设区 | 主体工程区   | 2.03 | 永久   | 平潭综合实验区金井湾片区北厝镇 |                 |
|       | 施工生产生活区 | 0.02 | 临时   |                 |                 |
|       | 临时堆置区   | 0.04 | 临时   |                 |                 |
|       | 小计      | 2.04 |      |                 |                 |
| 直接影响区 | 主体工程区   | 0.16 | 临时   | 平潭综合实验区金井湾片区北厝镇 | 取占地范围外围 1-3m 区域 |
|       | 施工生产生活区 |      | 临时   |                 |                 |
|       | 临时堆置区   |      | 临时   |                 |                 |
|       | 小计      | 0.16 |      |                 |                 |
| 合计    |         | 2.20 |      |                 |                 |

注：1. 临时堆置区占地  $0.04\text{hm}^2$ ，位于主体工程区占地范围内；

2. 施工生产生活区占地  $0.02\text{hm}^2$ ， $0.01\text{hm}^2$  位于主体工程区占地范围内， $0.01\text{hm}^2$  位于主体工程区占地范围外；

3. 合计中不计重复占地部分。

### 3.1.3 水土流失防治责任范围变化情况

本工程建设实际征占地面积  $2.04\text{hm}^2$ 。实际直接影响区  $0.16\text{hm}^2$ ，实际水土流失防治责任范围  $2.2\text{hm}^2$ ，比方案批复面积  $2.31\text{hm}^2$  减少  $0.11\text{hm}^2$ 。

项目建设产生的防治责任范围与水保方案批复情况对比详见表 3.1-3。

水土流失防治责任范围对比表

表 3.1-3

单位:  $\text{hm}^2$

| 项目区     | 批复的水土流失防治责任范围 |       |      | 实际防治责任范围 |         |      | 实际与批复比较 |
|---------|---------------|-------|------|----------|---------|------|---------|
|         | 项目建设区         | 直接影响区 | 合计   | 实际项目建设区  | 实际直接影响区 | 合计   |         |
| 主体工程区   | 2.03          | 0.27  | 2.3  | 2.03     | 0.16    | 2.19 | -0.11   |
| 施工生产生活区 | 0.02          |       | 0.02 | 0.02     |         | 0.02 | 0       |
| 临时堆置区   | 0.04          |       | 0.04 | 0.04     |         | 0.04 | 0       |
| 合计      | 2.04          | 0.27  | 2.31 | 2.04     | 0.16    | 2.2  | -0.11   |

水土流失防治责任范围发生变化的主要原因为:

一、原设计主体工程区直接影响区取主体工程区四周外侧各 5m 计算, 因工程施工期间围墙拦挡, 则直接影响区较原设计减少  $0.11\text{hm}^2$ 。

二、建设前现状用地主要为水域和排洪沟, 地势低洼, 但在建设前已基本由金井湾组团场地吹填平整完毕, 建设条件较成熟, 则直接影响区减少。

### 3.1.5 验收后水土流失防治责任范围

项目建设区包括项目永久占地、临时占地、租用和管辖范围的土地, 即项目征、占、用、管的土地, 该区是直接造成地表扰动和水土流失的区域, 是水土流失防治的重要区域。本项目总用地面积  $2.04\text{hm}^2$  (不计重复占地部分), 永久占地包括主体工程区, 面积  $2.03\text{hm}^2$ ; 临时占地为临时堆置区和施工生产生活区, 其中: 临时堆置区占地  $0.04\text{hm}^2$ , 位于主体工程区占地范围内; 施工生产生活区占地  $0.02\text{hm}^2$ , 其中  $0.01\text{hm}^2$  位于主体工程区占地范围内,  $0.01\text{hm}^2$  位于主体工程区占地范围外, 面积  $0.06\text{hm}^2$ , 占地类型为建设用地。永久占地范围内建设单位

承担项目建设全过程的水土流失防治义务；通过水土保持专项验收前，临时占地范围水土流失防治义务也归建设单位。

工程验收后，根据土地管理权限和实际情况，建设单位水土流失防治责任范围总面积共计 2.03hm<sup>2</sup>。

项目竣工后，施工生产生活区、临时堆置区等临时用地归还当地负责管理。

### 3.2 弃渣场设置

本工程所在地基本由金井湾组团平整完毕，项目产生弃方来自于地下室（包括地下室本身、基坑、桩基）开挖，土石方开挖量 77500m<sup>3</sup>，回填利用方量 36600m<sup>3</sup>，弃方量 40900m<sup>3</sup>，弃方由相关部门统一调配进行综合利用，后期项目区绿化覆土由该项目施工阶段园林绿化公司负责。实际挖方量 7.33 万 m<sup>3</sup>，填方量 3.92 万 m<sup>3</sup>；弃方 3.41 万 m<sup>3</sup>，弃方由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配至协力科技园区回填工程进行综合利用，不设弃渣场。

### 3.3 取土场设置

本工程所需的主要建筑材料砖、砂料、石料等全部从邻近地区市场采购，不设取土场。

采购砂、石料等建筑材料选择合法的料场，水土流失防治由相应料场经营者负责。

### 3.4 水土保持措施总体布局

#### 3.4.1 水土流失防治分区

根据《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书（报批稿）》，本工程防治分区包括主体工程防治区、施工生产生活区防治区、临时堆置区防治区。

### 3.4.2 水土保持设施总体布局情况

根据《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书（报批稿）》，工程各水土保持分区水土保持措施及水土流失防治工程量见下列各表。

水土保持防治措施体系表

表 3.4-1

| 序号                            | 防治分区    | 措施分类 | 主要措施内容        |
|-------------------------------|---------|------|---------------|
| 1                             | 主体工程区   | 工程措施 | 土地整治、排水       |
|                               |         | 植物措施 | 景观绿化          |
|                               |         | 临时措施 | 临时覆盖、排水、沉沙    |
| 2                             | 施工生产生活区 | 临时措施 | 临时排水、沉沙       |
| 3                             | 临时堆置区   | 临时措施 | 临时覆盖、拦挡、排水、沉沙 |
| 直接影响区主要通过加强项目建设区施工管理，不列具体防治措施 |         |      |               |

### 3.4.3 水土保持措施工程量及概算

根据《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书（报批稿）》，水土保持措施总投资 182.28 万元。其中，工程措施投资 12.61 万元，植物措施投资 41.89 万元，施工临时工程投资 10.93 万元。

表 3.4-2 水土保持方案工程量及概算总表

| 序号          | 工程或费用名称   | 建安工程费 | 林草工程费 | 独立费用  | 合计(万元) | 其中主体工程界定为水保投资 |
|-------------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| 第一部分 工程措施   |           | 12.61 |       |       | 12.61  |               |
| 1           | 主体工程区     | 12.61 |       |       | 12.61  |               |
| 第二部分 植物措施   |           |       | 41.89 |       | 41.89  | 41.89         |
| 1           | 主体工程区     |       | 41.89 |       | 41.89  | 41.89         |
| 第三部分 施工临时工程 |           | 10.93 |       |       | 10.93  |               |
| 1           | 主体工程区     | 8.17  |       |       | 8.17   |               |
| 2           | 施工生产生活区   | 0.24  |       |       | 0.24   |               |
| 4           | 临时堆置区     | 1.43  |       |       | 1.43   |               |
| 6           | 其他临时措施    | 1.09  |       |       | 1.09   |               |
| 第四部分 独立费用   |           |       |       | 97.86 | 97.86  |               |
| 1           | 建设管理费     |       |       | 1.31  | 1.31   |               |
| 2           | 工程建设监理费   |       |       | 22.50 | 22.50  |               |
| 3           | 科研勘测设计费   |       |       | 11.50 | 11.50  |               |
| 4           | 水土保持监测费   |       |       | 52.75 | 52.75  |               |
| 5           | 咨询服务费     |       |       | 1.80  | 1.80   |               |
| 6           | 水土保持竣工验收费 |       |       | 8.00  | 8.00   |               |
| 五           | 一至四部分合计   |       |       |       | 163.28 |               |
| 六           | 预备费       |       |       |       | 9.80   |               |
| 1           | 基本预备费     |       |       |       | 9.80   |               |
| 七           | 水土保持补偿费   |       |       |       | 9.20   |               |
|             | 水土保持总投资   |       |       |       | 182.28 | 41.89         |

表 3.4-3 水土保持方案设计的工程措施工程量及概算表

| 编号  | 工程名称        | 单位              | 工程量    | 单价（元）  | 合计（万元） |
|-----|-------------|-----------------|--------|--------|--------|
|     | 第一部分 工程措施   |                 |        |        | 12.61  |
| 一   | 主体工程区       |                 |        |        | 12.61  |
| 1   | 整地          | hm <sup>2</sup> | 0.52   | 996.13 | 0.05   |
| 2   | 排水沟         | m               | 542    |        | 12.55  |
| 2.1 | 人工挖排水沟      | m <sup>2</sup>  | 682.92 | 20.57  | 1.40   |
| 2.2 | M7.5 浆砌石排水沟 | m <sup>3</sup>  | 390.24 | 285.70 | 11.15  |

表 3.4-4 水土保持方案设计的植物措施工程量及概算表

| 编号 | 工程名称      | 单位             | 工程量  | 单价（元） | 合计（万元） |
|----|-----------|----------------|------|-------|--------|
|    | 第二部分 植物措施 |                |      |       | 41.89  |
| 一  | 主体工程区     |                |      |       | 41.89  |
| 1  | 景观绿化      | m <sup>3</sup> | 5236 | 80.00 | 41.89  |

表 3.4-5 水土保持方案设计临时工程措施工程量及概算表

| 编号  | 工程名称        | 单位             | 工程量    | 单价（元）  | 合计（万元） |
|-----|-------------|----------------|--------|--------|--------|
|     | 第三部分 施工临时工程 |                |        |        | 10.93  |
| 一   | 主体工程区       |                |        |        | 8.17   |
| 1   | 排水沟         | m              | 270    |        | 0.28   |
| 1.1 | 人工挖排水沟      | m <sup>3</sup> | 135.00 | 20.57  | 0.28   |
| 2   | 沉砂池         | 个              | 4      |        | 1.41   |
| 2.1 | 人工挖土        | m <sup>3</sup> | 110.03 | 21.54  | 0.24   |
| 2.2 | M7.5 浆砌石    | m <sup>3</sup> | 46.03  | 254.21 | 1.17   |
| 3   | 编织袋土填筑      | m <sup>3</sup> | 450    | 120.29 | 5.41   |
| 4   | 编织袋土拆除      | m <sup>3</sup> | 450    | 11.81  | 0.53   |
| 5   | 铺塑料薄膜       | m <sup>2</sup> | 2800   | 1.93   | 0.54   |
| 二   | 施工生产生活区     |                |        |        | 0.24   |
| 1   | 排水沟         | m              | 28     |        | 0.03   |
| 1.1 | 人工挖排水沟      | m <sup>3</sup> | 14     | 20.57  | 0.03   |
| 2   | 沉砂池         | 个              | 2      |        | 0.20   |
| 2.1 | 人工挖土        | m <sup>3</sup> | 10.82  | 21.54  | 0.02   |
| 2.2 | M7.5 浆砌石    | m <sup>3</sup> | 6.82   | 254.21 | 0.17   |
| 3   | 铺塑料薄膜       | m <sup>2</sup> | 67     | 1.93   | 0.01   |
| 三   | 临时堆置区       |                |        |        | 1.43   |
| 1   | 排水沟         | m              | 80     |        | 0.08   |
| 1.1 | 人工挖排水沟      | m <sup>3</sup> | 40     | 20.57  | 0.08   |
| 2   | 沉砂池         | 个              | 2      |        | 0.20   |
| 2.1 | 人工挖土        | m <sup>3</sup> | 10.82  | 21.54  | 0.02   |
| 2.2 | M7.5 浆砌石    | m <sup>3</sup> | 6.82   | 254.21 | 0.17   |
| 3   | 编织袋土填筑      | m <sup>3</sup> | 80     | 120.29 | 0.96   |
| 4   | 编织袋土拆除      | m <sup>3</sup> | 80     | 11.81  | 0.09   |
| 5   | 铺塑料薄膜       | m <sup>2</sup> | 500    | 1.93   | 0.10   |
| 四   | 其他临时措施      |                |        |        | 1.09   |

### 3.5 水土保持设施完成情况

#### 3.5.1 水土保持工程措施完成情况

##### 3.5.1.1 工程措施实施情况及工程量

主体工程防治区设计雨水管网，通过雨水管网，可以有效的收集地表径流，使区内汇水以有序的、安全的方式出流，很好的保证了项目区排水的畅通，可以避免因雨水冲刷而造成的新的水土流失，具有较好的水土保持作用和防治效果。

本项目地上停车场等采取透水砖铺装，透水砖能有效增加降雨入渗量，具有蓄水保土的作用。

在绿化工程实施前，对景观绿化用地采取土地整治措施，土地整治包括平整土地、施肥、翻土碎土、剔除石块等，整地力求平整，深度约0.3m。绿化覆土平均厚度0.3m。

水土保持措施完成的工程量为：表土剥离1.12万m<sup>3</sup>，覆土0.17万m<sup>3</sup>，土地整治0.56hm<sup>2</sup>，雨水管1232m，透水砖m<sup>2</sup>。

防治分区水土保持工程措施实施情况见表3.5-1。

水土保持工程措施实施表

表 3.5-1

| 序号 | 措施内容    | 单位               | 工程量  | 投资（万元） | 完成时间           |
|----|---------|------------------|------|--------|----------------|
| 合计 |         |                  |      | 57.18  |                |
| 一  | 主体工程防治区 |                  |      | 57.18  |                |
| 1  | 土地整治    | hm <sup>2</sup>  | 0.56 | 0.51   | 2015.3~2015.5  |
| 2  | 覆土      | 万 m <sup>3</sup> | 0.17 | 2.11   | 2015.3~2015.5  |
| 3  | 雨水管     | m                | 1232 | 51.74  | 2012.6~2012.12 |
| 4  | 透水砖     | m <sup>2</sup>   | 213  | 2.81   | 2015.1~2015.5  |

### 3.5.1.2 水土保持工程措施完成情况评价

主体工程于 2012 年 5 月开工建设，2015 年 7 月完工。水土保持工程措施在主体工程施工期内完成，进度满足主体工程和水土保持要求。

各项工程措施质量合格，虽然工程量与水土保持方案相比有变化，并且有些新增的工程类型，如雨水管、透水砖。但各项措施基本能够按照水土保持方案编制的原则实施，且经过现场调查均已发挥了较好的水土流失防治效果，能够满足水土保持的要求。

### 3.5.2 水土保持植物措施完成情况评估

#### 3.5.2.1 植物措施实施情况及工程量

场区绿化工程主要包括：广场绿化、行道树绿化和建筑物四周空地绿化等。采取铺种草皮、栽植乔木、灌木球体和色带植物相结合的方式，适当引进适宜本地区生长的优良植物；在发挥林草防护与观赏等综合功能的前提下，尽可能做到美观、生态。

水土保持植物措施完成的工程量为：绿化面积  $0.56\text{hm}^2$ ，铺马尼拉草皮  $0.56\text{hm}^2$ 、种植小叶榕 319 株、南洋杉 3 株、羊蹄甲 3 株、三角梅 14 株、红花紫荆 1 株、紫叶美人蕉 333 株、黄杨球 16 株、黄金榕 53 株、红花檵木 162 株、鸡蛋花 180 株。

工程各防治分区水土保持工程措施实施情况见表 3.5-2。

水土保持植物措施实施表

表 3.5-2

| 序号  | 措施内容    | 单位 | 工程量 | 投资（万元） | 完成时间 |
|-----|---------|----|-----|--------|------|
| 合计  |         |    |     | 47.89  |      |
| 一   | 种植费     |    |     | 9.40   |      |
| (一) | 主体工程防治区 |    |     | 9.40   |      |

| 序号  | 措施内容    | 单位              | 工程量  | 投资（万元） | 完成时间          |
|-----|---------|-----------------|------|--------|---------------|
| 1   | 铺马尼拉草皮  | hm <sup>2</sup> | 0.56 | 5.54   | 2015.1~2015.5 |
| 2   | 种植小叶榕   | 株               | 319  | 1.06   | 2015.1~2015.5 |
| 3   | 种植南洋杉   | 株               | 3    | 0.04   | 2015.1~2015.5 |
| 4   | 种植羊蹄甲   | 株               | 3    | 0.65   | 2015.1~2015.5 |
| 5   | 种植三角梅   | 株               | 14   | 0.14   | 2015.1~2015.5 |
| 6   | 种植红花紫荆  | 株               | 1    | 0.21   | 2015.1~2015.5 |
| 7   | 种植紫叶美人蕉 | 株               | 333  | 0.69   | 2015.1~2015.5 |
| 8   | 种植黄杨球   | 株               | 16   | 0.15   | 2015.1~2015.5 |
| 9   | 种植黄金榕   | 株               | 53   | 0.28   | 2015.1~2015.5 |
| 10  | 种植红花檵木  | 株               | 162  | 0.29   | 2015.1~2015.5 |
| 11  | 种植鸡蛋花   | 株               | 180  | 0.36   | 2015.1~2015.5 |
| 二   | 苗木草种费   |                 |      | 38.49  |               |
| (一) | 主体工程防治区 |                 |      | 38.49  |               |
| 1   | 马尼拉草    | hm <sup>3</sup> | 0.56 | 6.61   | 2015.1~2015.5 |
| 2   | 小叶榕     | 株               | 319  | 2.28   | 2015.1~2015.5 |
| 3   | 南洋杉     | 株               | 3    | 0.02   | 2015.1~2015.5 |
| 4   | 羊蹄甲     | 株               | 3    | 21.49  | 2015.1~2015.5 |
| 5   | 三角梅     | 株               | 14   | 0.10   | 2015.1~2015.5 |
| 6   | 红花紫荆    | 株               | 1    | 7.06   | 2015.1~2015.5 |
| 7   | 紫叶美人蕉   | 株               | 333  | 0.38   | 2015.1~2015.5 |
| 8   | 黄杨球     | 株               | 16   | 0.19   | 2015.1~2015.5 |
| 9   | 黄金榕     | 株               | 53   | 0.06   | 2015.1~2015.5 |
| 10  | 红花檵木    | 株               | 162  | 0.13   | 2015.1~2015.5 |
| 11  | 鸡蛋花     | 株               | 180  | 0.16   | 2015.1~2015.5 |

### 3.5.2.2 水土保持植物措施完成情况

水土保持植物措施在主体工程施工后期完成，整个施工进度控制在主体工程工期内，进度满足主体工程和水土保持要求。

水土保持植物措施实施的质量合格，成活率满足相关标准。各分区内植物措施类型基本按照水土保持方案设计的要求实施，绿化效果也达

到了防治水土流失的目的。与绿化措施相关的灌溉和后期管护责任也明确，能够满足水土保持方案的要求。

### 3.5.3 水土保持临时措施完成情况

#### 3.5.3.1 临时措施实施情况及工程量

水土保持临时措施在施工期间实施，实施了主体工程防治区、施工生产生活区防治区、临时堆置区防治区的排水沟、沉沙池、集水井、拦挡、彩条布覆盖措施。

水土保持临时措施完成的工程量为：铺塑料薄膜 1110m<sup>2</sup>，浆砌石排水沟 417m，浆砌石沉沙池 8 座，砌砖挡墙 86m，砌砖集水井 4 座。

工程各防治分区水土保持工程措施实施情况见表3.5-3。

水土保持临时措施实施表

表 3.5-3

| 序号 | 措施内容       | 单位             | 工程量    | 投资（万元） | 完成时间          |
|----|------------|----------------|--------|--------|---------------|
|    | 合计         |                |        | 18.45  |               |
| 一  | 临时工程       |                |        | 16.35  |               |
| 一  | 主体工程防治区    |                |        | 8.61   |               |
| 1  | 排水沟        | m              | 282    | 6.18   | 2012.5~2013.2 |
| 2  | 沉沙池        | 座              | 4      | 1.64   | 2012.5~2013.2 |
| 3  | 集水井        | 座              | 4      | 0.79   | 2012.5~2013.2 |
| 二  | 施工生产生活区防治区 |                |        | 1.43   |               |
| 1  | 排水沟        | m              | 28     | 0.61   | 2012.5~2013.2 |
| 2  | 沉沙池        | 座              | 2      | 0.82   | 2012.5~2013.2 |
| 三  | 临时堆置区防治区   |                |        | 6.30   |               |
| 1  | 排水沟        | m              | 107    | 2.34   | 2012.5~2013.2 |
| 2  | 沉沙池        | 座              | 2      | 0.82   | 2012.5~2013.2 |
| 3  | 砌砖挡墙       | m              | 86     | 2.46   | 2012.5~2013.2 |
| 4  | 铺塑料薄膜      | m <sup>2</sup> | 1110   | 0.68   | 2012.5~2013.2 |
| 二  | 其他临时工程     | 万元             | 105.06 | 2.10   |               |

### 3.5.2.2 水土保持临时措施完成情况

因工期较长，达 39 个月。临时工程，原设计排水沟为土质结构，施工过程中改为浆砌石结构。原设计编织土袋挡墙，改成砌砖挡墙。

水土保持临时措施在施工期间实施，整个进度控制在主体工程工期内，进度满足主体工程和水土保持要求，起到了防治和控制施工过程中水土流失的作用。

水土保持临时措施基本按照水保方案设计的要求实施，临时防治效果也达到了防治水土流失的目的，能够满足水土保持方案的要求。

### 3.6 水土保持投资完成情况

通过查阅批复的水土保持方案确定的水土保持投资组成，收集、整理、分析工程实际完成的水土保持工程计量结算资料，对照监理总结报告、水土保持方案实施工作总结报告、主体工程施工总结报告等，对水土保持投资完成情况及资金管理情况予以评价。

#### 3.6.1 水土保持方案批复投资

根据平潭综合实验区水土保持监督站（平水保监审批 [2013]9号）批复文件和《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》（报批稿），平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持总投资182.28万元，其中：工程措施 12.61 万元，植物措施41.89 万元，施工临时工程 10.93 万元，独立费用 97.86 万元（其中水土保持监理费 22.50 万元，水土保持监测费 52.75 万元，水土保持竣工验收费8.0万元），基本预备费 9.80 万元，水土保持补偿费 9.20 万元。

#### 3.6.2 水土保持工程实际完成投资

依据平潭综合实验区公安指挥情报中心决算材料，结合现场实地核实，本工程建设过程中实际完成水土保持措施总投资157.22万元，其中工程措施投资57.18万元，植物措施投资47.89万元，临时措施投资18.45万元，独立费用49.07万元，实际缴纳水土保持补偿费9.20万元。工程实际完成的水土保持总投资见表3.6-1。

工程实际完成的水土保持总投资表

表 3.6-1

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称            | 合计            |
|----|--------------------|---------------|
| 一  | <b>第一部分工程措施</b>    | <b>57.18</b>  |
| 1  | 主体工程防治区            | <b>57.18</b>  |
|    | 一小计                | <b>57.18</b>  |
| 二  | <b>第二部分 植物措施</b>   | <b>47.89</b>  |
| 1  | 主体工程防治区            | <b>47.89</b>  |
|    | 二小计                | <b>47.89</b>  |
| 三  | <b>第三部分 施工临时工程</b> | <b>18.45</b>  |
| 1  | 临时工程               | <b>16.35</b>  |
| 2  | 其他临时工程             | <b>2.1</b>    |
|    | 三小计                | <b>123.51</b> |
|    | 一至三小计              | <b>123.51</b> |
| 四  | <b>第四部分 独立费用</b>   | <b>24.5</b>   |
| 1  | 建设管理费              | <b>0</b>      |
| 2  | 工程建设监理费            | <b>0</b>      |
| 3  | 科研勘测设计费            | <b>11.5</b>   |
| 4  | 水土保持监测费            | <b>8</b>      |
| 5  | 水土保持竣工验收费          | <b>5</b>      |
| 五  | 一至四部分合计            | <b>148.02</b> |
| 六  | 水土保持补偿费            | <b>9.2</b>    |
| 七  | 总投资                | <b>157.22</b> |

### 3.6.3 投资变化情况

#### 3.6.3.1 实际完成水土保持投资

工程施工过程中实际完成的水土保持总投资为 157.22 万元，较工程水土保持方案概算总投资 182.28 万元减少 25.06 万元。其中：工程措施投资增加 44.57 万元，植物措施投资增加 6.00 万元，临时措施投资增加 7.52 万元，独立费用减少 73.35 万元，水土保持补偿费未变化。

工程实际完成和批复的水土保持投资对比见表 3.6-2。

工程实际完成和批复的水土保持投资对比表

表 3.6-2

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案投资   | 实际投资   | 增减数    |
|----|---------|--------|--------|--------|
| 1  | 工程措施    | 12.61  | 57.18  | 44.57  |
| 2  | 植物措施    | 41.89  | 47.89  | 6      |
| 3  | 临时工程    | 10.93  | 18.45  | 7.52   |
| 4  | 独立费用    | 97.85  | 24.5   | -73.35 |
| 5  | 基本预备费   | 9.80   | 0      | -9.8   |
| 6  | 水土保持补偿费 | 9.20   | 9.2    | 0      |
| 7  | 水土保持总投资 | 182.28 | 157.22 | -25.06 |

### 3.6.3.2 工程量变化情况

#### (1) 工程措施工程量变化：

工程建设过程中，实际落实的水土保持工程措施量有所变化，并根据实际情况进行了调整。方案设计的 M7.5 浆砌石排水沟 542m，实际实施雨水管 1232m；方案设计的土地整治为 0.52hm<sup>2</sup>，实际实施的面积为 0.56hm<sup>2</sup>；实际实施了后期绿化覆土 0.17 万 m<sup>3</sup>，实际实施了透水砖 213m<sup>2</sup>。

#### (2) 植物措施工程量变化：

方案设计的景观绿化面积为 5236m<sup>2</sup>，实际实施的绿化面积为 0.56hm<sup>2</sup>。

方案推荐选用的地被植物有黄心梅、花叶鹅掌柴树、狗牙根等；小灌木有：海桐树、黄金榕、非洲茉莉、红绒球、四季桂、扶桑球、夹竹

桃、毛杜鹃、紫薇、美蕊花等；乔木有：高山榕、异叶南洋杉、刺桐、塔柏、红叶石楠、降香黄檀、银 海枣、美人树、大王椰子、小叶榕、华棕、黄花槐等，实际实施的铺马尼拉草皮  $0.56\text{hm}^2$ 、种植小叶榕 319 株、南洋杉 3 株、羊蹄甲 3 株、三角梅 14 株、红花紫荆 1 株、紫叶美人蕉 333 株、黄杨球 16 株、黄金榕 53 株、红花檵木 162 株、鸡蛋花 180 株。

### （3）临时措施工程量变化：

方案设计的临时措施主要为土质排水沟、编织土袋拦挡、覆盖彩条布等，由于工期较长，达 39 个月，施工过程中土质排水沟改为浆砌石结构；编织土袋拦挡改为砌砖挡墙；主体工程区增加了砌砖集水井。

### 3.6.3.3 投资变化原因

投资变化的主要原因有以下六个方面原因：

#### （1）地形因素

本工程本项目为盐田吹填造地，地表土壤为素填土，在实际施工中调整排水沟工程量，防治水土流失危害，确保主体工程安全。造成实际投资增加。

#### （2）降雨因素

雨季施工期间，增加彩条布等覆盖工程量，防治了降雨对土石方和砂石料的冲刷；受降雨量大的影响，在临时施工用地区增浆砌石排水沟、编织土袋拦挡改为浆砌砖结构，降低和控制施工期间的水土流失危害。以上工程量变化使得投资增加。

#### （3）施工实际情况

由于工期较长，达 39 个月，施工生产生活区及临时堆置区排水沟拦挡等均依场地实际进行调整。

#### （4）植物措施特殊性

植物措施在实施后,需要抚育和补植,以及在植物措施管护过程中,由于人工价增加导致的管护费用增加,从而增加了实际植物措施的投资。

#### (5) 人工单价和材料费

由于原水保方案部分概算是利用水保定额编制的,且该定额较低,而实际工程施工中的人工单价和定额相对较高,在相同工程量的情况下,投资增加。水保方案采取的价格水平年是 2013 年,工程实际施工时材料价格较方案设计水平年有所提高,投资相应增加。

#### (6) 独立费用

原水保方案部分概算水土保持监测费为 52.75 万元,实际有所降低。本工程动土量较小,水土保持监理依附厦门高诚信建设监理有限公司主体工程监理一并开展,实际水土保持监测费和水土保持竣工资收费也比原水保方案概算投资减少,因此独立费用投资减小。

综上,工程在施工过程中,虽然增加了措施类型和工程量,调整部分措施位置和结构,以及材料和人工单价变化等原因,造成水土保持措施投资有所增加,但独立费用减少幅度大,因此总投资减少。

验收组认为,工程在实际实施过程中,调整和补充完善了水土保持措施,使得水土保持措施体系较原方案设计更加合理,有效的控制了因工程的实施造成的水土流失,投资增加客观、合理,符合实际,达到预期目标和效果。

## 4 水土保持工程质量评价

### 4.1 质量管理体系

平潭综合实验区公安局对工程实行了“建设单位+监理”的工程质量管理工作。下属的基建工程部具体负责水土保持设施建设的技术管理工作，监理具体负责工程质量、安全、进度、投资等方面的工作。

#### 4.1.1 建设单位质量管理体系

工程建设施工过程中，平潭综合实验区公安局严格生态环境和安全管理，对监理单位厦门高诚信建设监理有限公司和施工单位中建三局集团有限公司严格质量要求。为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，平潭综合实验区公安局在工程建设过程中建立了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了一系列质量管理制定，涵盖了计划管理、招标管理、合同管理、质量和进度控制、结算管理等各个环节。

#### 4.1.2 监理单位质量管理体系

监理单位厦门高诚信建设监理有限公司建立以项目总监陈长桥为第一负责人的质量管理体系，土建专业监理工程师：薛尔平，水电监理工程师：方智杰，监理员：陈小平、张易勇、刘四英、林船珍。组织机构健全，运行正常。归口管理工程施工过程中的质量工作，协调解决施工单位施工过程中的有关质量问题。从突出工程质量的事前控制，督促和检查各施工单位认真执行国家颁发的各项质量法规、施工规范和施工质量验评标准，定期召开和主持施工质量工作例会，根据施工质量验评标准严把质量关，监督、检查施工过程中工序、工艺质量控制与各项技术措施的执行。

根据平潭综合实验区公安局建设管理体系要求，编制了“监理规划”、“工程管理制度”以及“监理实施细则”，保证监理部以较强的监理能力，开展工程施工过程中的以控制质量、进度和投资为核心的“三控制、二管理、一协调”监理技术服务工作。

监理部严格按照国家现行有关规范、标准以及本公司的贯标要求，依照事前预控、事中监控、事后核验和旁站、巡视跟踪检查的监理程序进行层层把关、严格管理。并协助、指导施工单位做好施工组织设计编制及工程施工技术资料的收集、整理、归档等工作。在工地例会上，监理将施工现场出现（存在）的问题及处理方法等情况向业主汇报，督促施工单位加强施工现场的质量、安全管理，并及时将新的规范、标准以及通知精神向与会各方介绍，为该工程能够高质量、高标准的完成提供了科学的依据。同时，在工程监理过程中也得到业主、设计单位、施工单位的大力支持和理解，各方合作较为默契。

#### 4.1.3 施工单位质量管理体系

施工单位中建三局集团有限公司建立以项目经理为第一责任人的质量保证体系，要求体系完整、正常运转，各项质量管理制度完整，质量部门的人员配备能满足工程现场质量管理工作的需要。认真执行设计单位提供的技术文件。遵守平潭综合实验区公安局发布的各项质量管理制度和监理单位制订、发布的有关规定，接受建设单位、施工监理的质量监督和检查。做好监检中的配合工作和监检后的整改、信息反馈工作。

#### 4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

水土保持工程验收组从竣工资料核查和现场核查等两方面进行质量评价。竣工资料核查主要对象为施工总结、质量验收评定资料。现场

核查主要依据《水土保持工程质量评审规程》和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》，对水土保持工程措施进行项目划分的同时，确定重点评估范围和重要单位工程，明确现场核查内容与要求，最终通过现场核查评价外观质量和运行情况。

#### 4.2.1 项目划分及结果

根据工程水土保持措施的特点，划分为防洪排导工程、土地整治、植被建设工程、临时防护工程 4 个单位工程，防洪导流设施、覆土、土地整治、点片状植被、临时拦挡、临时排水、临时沉沙、临时覆盖等 8 个分部工程，按规定的工程量分为 14 个单元工程。具体见表 4.2-1。

表 4.2-1 水土保持措施分部、单元工程划分表

| 单位工程   | 分部工程   | 单元工程    | 个数 |
|--------|--------|---------|----|
| 防洪排导工程 | 防洪导流设施 | 排水沟     | 11 |
|        |        | 沉沙池     | 6  |
|        |        | 集水井     | 2  |
|        |        | 雨水管     | 2  |
|        |        | 透水砖     | 2  |
| 土地整治工程 | 土地整治   | 土地整治    | 2  |
|        | 覆土     | 覆土      | 3  |
| 临时防护工程 | 临时拦挡   | 填土编织袋挡墙 | 4  |
|        | 临时排水   | 临时排水沟   | 7  |
|        | 临时沉沙   | 沉沙池     | 5  |
|        | 临时覆盖   | 彩条布苫盖   | 2  |
| 植被建设工程 | 点片状植被  | 景观绿化    | 2  |
|        |        | 灌木      | 2  |
|        |        | 草皮      | 1  |
| 4      | 8      | 14      | 51 |

#### 4.2.2 各防治分区工程质量评定

本工程已于 2016 年月通过竣工，工程质量评定均为合格。

**工程质量评定**

表 3

| 分部工程名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 评定等级 | 质量控制资料                                                                                                                                                                                    | 观感质量验收                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 地基与基础工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合格   | 质量控制资料核查：<br>共 <u>53</u> 项，经审查符合要求 <u>53</u> 项，经核定符合规范要求 <u>53</u> 项。<br><br>安全和主要使用功能核查及抽查结果：<br>共核查 <u>23</u> 项，符合要求 <u>23</u> 项；共抽查 <u>23</u> 项，符合要求 <u>23</u> 项，经返工处理符合要求 <u>0</u> 项。 | 共抽查 <u>26</u> 项，符合要求 <u>26</u> 项，不符合要求 <u>0</u> 项。 |
| 主体工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 装饰工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 屋面工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 给水排水与采暖工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 建筑电气工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 通风与空调工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 电梯工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 智能建筑工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 建筑节能工程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 合格   |                                                                                                                                                                                           |                                                    |
| 单位工程评定等级：<br><div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             建设单位负责人：           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             (公章)<br/>             2016年1月20日           </div> </div> |      |                                                                                                                                                                                           |                                                    |

#### 4.3 弃渣场稳定性评估

本项目不设弃渣场

|                                                                                                                                                        |      |                              |  |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--|------------------------|--|
| 验收机构意见                                                                                                                                                 | 建设单位 | 符合设计，同意验收                    |  |                        |  |
|                                                                                                                                                        | 勘察单位 | 符合设计，同意验收                    |  |                        |  |
|                                                                                                                                                        | 设计单位 | 符合要求，同意验收                    |  |                        |  |
|                                                                                                                                                        | 施工单位 | 工程已按合同施工，符合国家施工验收规范要求，工程质量合格 |  |                        |  |
|                                                                                                                                                        | 监理单位 | 符合要求，同意验收                    |  |                        |  |
| <p>竣工验收结论：</p> <p>各单位工程按设计文件，合同约定的内容施工完成。</p> <p>经专业验收小组检查验收，符合设计及施工规范要求。</p> <p>各单位工程各分部评定质量控制资料核查，安全和重要使用功能核查及抽查结果均符合要求，观感评价好，单位工程质量等级合格，同意竣工验收。</p> |      |                              |  |                        |  |
| 建设单位<br>(签章)<br>项目负责人:                                                                                                                                 |      | 勘察单位<br>(签章)<br>勘察负责人:       |  | 设计单位<br>(签章)<br>设计负责人: |  |
| 监理单位<br>(签章)<br>监理负责人:                                                                                                                                 |      | 施工单位<br>(签章)<br>法人代表:        |  | 技术负责人:                 |  |
| 2016年1月26日                                                                                                                                             |      | 年月日                          |  | 年月日                    |  |
| 吴晓敏                                                                                                                                                    |      | 吴晓敏                          |  | 吴晓敏                    |  |

水土保持工程验收组检查了主体工程防治区、施工生产生活区防治区、临时堆置区防治区等 3 个防治分区已实施的水土保持工程竣工总结报告、质量验收评定等资料。并对水土保持工程涉及的主材及中间产品的试验报告资料分别进行了抽查，其中查阅了水泥材料报验 10 批次，

砂、碎石报验 8 批次，砂浆配比 3 批次，砼配比 9 批次。以上试验报告单位签字齐全，原材料及中间产品满足质量要求。

#### 4.4 总体质量评价

水土保持措施验收组对调查对象进行了项目划分，并确定抽查比例后，重点核查了主体工程防治区的挡墙、排水、沉沙防护工程，植被恢复等措施。检查结果表明：各防治区的措施布置方式符合设计要求，挡墙墙面密实平整、稳定，轮廓线顺直，质量合格；雨水管外观平整、平直，质量合格。

工程措施验收组检查了工程管理制度、工程质量检验和质量评定记录，现场调查了主体设计中具有水土保持功能的工程，认为水土保持工程措施的施工质量检验和质量评定资料齐全，程序完善，均有施工、监理和建设单位签章，符合质量管理体系要求，满足主体工程和水土保持要求，工程措施质量总体合格，目前水土保持工程措施运行正常，具备竣工验收条件。

验收组通过查阅资料和现场检查，认为该工程实施的水土保持植物措施布局合理，符合设计标准；完成的质量和数量符合设计要求，植被生长及自然恢复基本良好，保存率较好；所栽种的植物种类均为当地常见植物，生长状况良好，适应工程区的立地条件；项目区植物措施景观效果显著，质量合格。综上，植物措施的实施改善了项目区的生态环境，有效地控制了生产建设中的水土流失。

## 5 项目初期运行及水土保持效果

### 5.1 初期运行情况

该工程主体于 2015 年 7 月建成，植被措施于 2015 年 5 月完工。在工程建成初期，方案设计的各项水土保持工程均已随主体工程投入运行，因本工程已经历试运行期，方案中所涉及的水土保持措施均已落实到位，依据现场查勘各分区水土保持措施运行情况及通过对水土保持监测数据进行分析，可以确定项目区已完成的水土保持措施合理可行，能够正常发挥水土保持作用，在防治水土流失方面取得很好的效果。

综合验收组依据工程措施组和植物措施组评估意见，对水土流失防治指标和土地恢复情况进行详细地分析与评价，各项水土保持设施建成运行后，其安全稳定和度汛情况，工程维修、植物补植情况良好。

### 5.2 水土保持效果

#### 5.2.1 扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地面积的百分比。

经验收组核定，项目建设区扰动土地面积共计  $2.04\text{hm}^2$ ，水土保持措施防治面积+永久建筑物面积为  $1.94\text{hm}^2$ ，扰动土地整治率为 95.1%，达到方案设计的 95%防治目标。

#### 5.2.2 水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占项目建设区内水土流失总面积的百分比。

经验收组核定，施工期项目建设区征占地面积全面扰动，水土流失面积达  $2.04\text{hm}^2$ ，施工后期，施工生产生活区、临时堆置区等按规划用地恢复建设；对造成水土流失的区域修筑了排水沟、沉沙池等工程措施，

并进行了植被恢复，水土流失治理达标面积  $1.98\text{hm}^2$ ，水土流失总治理度达到 97.06%，达到方案设计的 97%防治目标。

### 5.2.3 土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。

验收组核定，项目治理后的平均土壤流失强度为  $477\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，防治责任区内容许土壤流失量为  $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，土壤流失控制比为 1.05，达到水土保持方案设计的防治目标要求。

### 5.2.4 拦渣率

拦渣率是指防治责任范围内实际拦挡弃土弃渣量与防治责任范围内弃土弃渣总量之比。

验收组核定，工程建设期间，实际挖方总量 7.33 万  $\text{m}^3$ ，填方量 3.92 万  $\text{m}^3$ 。

本工程所需的主要建筑材料砖、砂料、石料等全部从邻近地区市场采购，采购砂、石料等建筑材料要选择合法的料场，水土流失防治由相应料场经营者负责。

弃方 3.41 万  $\text{m}^3$ ，弃方由平潭综合实验区金井湾组团建设指挥部统一调配至协力科技园区回填工程进行综合利用。

本工程施工过程中地下室本身、基坑、桩基开挖土石方就近临时堆置，施工结束后及时平整、回填，无永久弃渣，施工期因各区均布置有临时防护措施，水土流失轻微，工程拦渣率为 95.11%，达到方案设计拦渣率 95%的防治目标要求。

### 5.2.5 林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。

验收组经调查核定，项目建设区扰动地表面积  $2.04\text{hm}^2$ ，可恢复林草植被面积  $0.57\text{hm}^2$ ，共实施恢复林草植被面积  $0.56\text{hm}^2$ ，林草植被恢复率达到 98.25%，达到方案设计的林草植被恢复率 98 %的防治目标要求。

#### 5.2.6 林草覆盖率

林草覆盖率是指项目建设区内的林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。

验收组经调查核定，项目建设区扰动地表面积  $2.04\text{hm}^2$ ，共实施恢复林草植被面积  $0.56\text{hm}^2$ ，林草覆盖率 27.45%，达到水土保持方案 27% 的防治目标要求。

表 5.2-1 水土流失防治目标评价表

| 防治指标     | 方案设计 | 实际完成   |
|----------|------|--------|
| 扰动土地整治率  | 95%  | 95.10% |
| 水土流失总治理度 | 97%  | 97.06% |
| 土壤流失控制比  | 1    | 1.05   |
| 拦渣率      | 95%  | 95.11% |
| 林草植被恢复率  | 98%  | 98.25% |
| 林草覆盖率    | 27%  | 27.45% |

验收组认为：防治责任范围内土壤流失量总体呈下降趋势，至方案运行初期项目区平均土壤侵蚀模数达到  $477\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ ，低于本地区土壤容许侵蚀模数  $500\text{t}/\text{km}^2\cdot\text{a}$ 。工程建设新增水土流失基本得到控制，水土流失六项防治指标满足方案设计的防治目标值。

### 5.3 公众满意程度

依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》要求，验收组向工程周边沿线群众发放水土保持公众调查表，就工程建设期水土保持工

作开展的情况和施工过程中的水土流失防治是否存在问题与不足、水土保持措施的落实情况等进行了问卷调查。调查的目的在于了解工程建设对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而为本次技术验收工作提供参考和依据。

本次调查，对工程周边的居民和团体共发放调查表 20 份，收回 20 份，反馈率 100%。反馈意见表明：100%的人认为现有平潭综合实验区公安指挥情报中心项目间接对当地经济的发展有保障促进作用，98%的人认为平潭综合实验区公安局项目建设过程中对弃渣管理的好，99%的人认为项目建设过程中环境保持工作做的好，100%的人认为项目区林草植被恢复搞的好，100%的人认为项目建设所扰动土地恢复的好。

调查结果表明，工程在建设过程中采取了有效的水土保持防治措施，工程施工期间对农事活动无影响，无土石方乱堆乱弃现象，工程建设对周边沟渠无影响，林草植被恢复良好。

## 6 水土保持管理

### 6.1 组织领导

根据《中华人民共和国水土保持法》，平潭综合实验区公安局按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。为保证水土保持方案的顺利实施，建立强有力的组织机构是十分必要的。因此，平潭综合实验区公安局和代建单位厦门经济特区房地产开发有限公司指定专人，负责水土保持方案的委托编制、报批和方案实施管理工作。

工程建设施工过程中，平潭综合实验区公安局和代建单位厦门经济特区房地产开发有限公司严格环境和安全管理，对监理单位厦门高诚信建设监理有限公司和施工单位中建三局集团有限公司严格质量要求。为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，项目建设单位在工程建设过程中建立了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管理中，制定了一系列质量管理制定，涵盖了计划管理、招标管理、合同管理、质量和进度控制、结算管理等各个环节。

### 6.2 规章制度

平潭综合实验区公安局建立水土保持工程目标责任制，并制定详细的水土保持方案实施、检查和验收的具体方法和要求，防范建设中不规范的行为及与水土保持方案相抵触的现象发生；同时，将水土保持工程列为质量考核的内容之一，并按年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况。

工程施工生产期间，平潭综合实验区公安局负责与设计、施工、监理单位之间保持联系，协调好水土保持与主体工程的关系，确保水土保持工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工。对水土保持工程现场进行定期或不定期的检查和观测，掌握工程施工生产期的水土流失及其

防治措施落实状况，为相关部门决策提供基础资料。

### 6.3 建设管理

平潭综合实验区公安局建立、健全各项档案管理，不断积累、分析、整编水土保持资料，特别是质量评定资料和临时防护措施的影像资料，为水土保持工程竣工验收提供相资料依据。

平潭综合实验区公安局把水土保持工作列入重要议事日程，真正做到责任、措施和投入“三到位”，认真组织方案的实施和管理，定期检查，并自觉接受社会和主管部门监督。

加强水土保持宣传、教育工作，提高施工人员和各级管理人员的水土保持知识和意识，进行必要的水土保持相关知识培训。

制定详细的水土保持方案实施进度计划，并加强管理，以确保各项目水土保持措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。

注重积累并整理水土保持资料，特别是质量评定的原始资料和临时防护措施的影像资料。

### 6.4 水土保持监测

平潭综合实验区公安局委托福州市闽华工程设计有限公司，负责对平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持生态环境开展动态监测。接受委托后，监测单位福州市闽华工程设计有限公司即组织监测专业技术人员深入现场实地查勘和调查，制定水土保持监测实施方案和监测工作组织管理措施，布设水土保持监测点，采集观测数据，收集资料，整理和分析监测数据。2016年8月，监测单位编制完成了《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持监测总结报告》。

#### 6.4.1 监测工作组织

监测单位福州市闽华工程设计有限公司在接受委托后，组建了监测工作项目部，实行由项目经理负责的项目责任制，技术人员均持有水土

保持专业知识，经理负责制，全面开展监测工作。

#### 6.4.2 监测实施方案制定

为保证工作进度和监测成果质量，监测单位依据工程水土保持方案，并针对项目的具体特性，制定工程水土保持监测实施方案，对监测内容、时段、监测点位布设，主要观测指标及其方法与频率、监测工作组织，实施进度和预期主要成果进行了明确。

#### 6.4.3 工作制度的制定

为规范工作流程，监测单位福州市闽华工程设计有限公司制定了相应的工作制度，实行岗位责任制。每季度对监测结果进行统计分析。监测全部结束后，对监测结果做出综合分析与评价，编制监测报告，整理归档。

#### 6.4.4 监测分区及监测重点

水土保持监测划分为主体工程监测区、施工生产生活区监测区、临时堆置区监测区 3 个监测分区进行监测。

在实地踏勘的基础上，针对本工程区工程特点、施工布置、水土流失的特点和水土保持措施的布局特征，并考虑观测与管理的方便性，本工程共布设共设置 4 个水土保持监测点位，其中主体工程区 2 个、施工生产生活区 1 个、临时堆置区 1 个。

#### 6.4.5 监测内容和方法

监测内容主要围绕水土流失防治责任范围、弃土弃渣量、水土流失因子、水土流失状况和水土流失防治效果。监测内容如下：

（1）水土流失因子监测；

① 地形、地貌和水系变化；

② 建设项目占用地面积、扰动地表面积；

③ 挖方填方数量及面积；

④ 项目区林草覆盖率。

(2) 水土流失状况监测

① 水土流失面积变化；

② 水土流失量变化；

③ 水土流失程度变化；

④ 对下游及周边地区造成危害及其趋势。

(3) 水土流失防治效果监测

① 防治措施数量及质量；

② 林草措施存活率、保存率、生长情况及覆盖度；

③ 防护工程稳定性、完好程度及运行情况；

④ 各项防治措施的拦渣保土效果。

本工程建设内容较为简单，采取调查法进行监测。

实地调查法主要用于施工期和试运行期的水土流失量和水土流失灾害监测。

#### 6.4.6 监测过程

主要对项目区的水土流失防治责任范围及水土流失变化情况进行动态监测。

调查监测工程施工进度、水土保持措施数量及其质量等。

工程措施调查：采用皮尺、钢卷尺、测距仪等实地量测有关断面尺寸，分析判断稳定性、完好程度和运行情况等。

植物措施调查：选择具有代表性的地块作为标准样地布设样方，计算林草覆盖度、成活率等。

气象因子监测数据查询当地雨量站点的实时雨量和累计雨量。

同时,根据监测数据分析确定工程项目是否达到水土保持方案提出的防治目标。

监测时间: 施工期间水土保持现场监测工作时段为 2014 年 5 月~2015 年 5 月, 共计 12 个月。地面观测基本做到每季度 1 次, 累计开展现场监测工作 7 次。运行初期水土保持现场监测工作时段为 2015 年 8 月, 共计 1 个月, 先后 2 次进入现场, 主要是对项目建设区水土流失状况及水土流失防治情况进行了调查监测。

#### 6.4.7 监测结果

通过对项目区进行水土流失动态监测、分析, 平潭综合实验区公安指挥情报中心自开工初期以来, 分阶段分区域实施了水土保持各项防治措施, 发挥了预期的防治效果。

监测结果表明, 工程实际水土流失防治责任范围为  $2.20\text{hm}^2$ , 实际扰动土地面积为  $2.04\text{hm}^2$ 。该工程运行初期, 水土流失防治措施实施后, 施工作业区场地及地下室开挖等区土壤侵蚀模数为  $6471 \text{ t/km}^2 \cdot \text{a}$ , 工程建设新增水土流失基本得到控制。项目建设区扰动土地整治率、水土流失总治理度、拦渣率、土壤流失控制比、林草植被恢复率和林草覆盖率等防治指标均达到了水土保持方案设计的防治目标。

监测单位福州市闽华工程设计有限公司在监测过程中, 组织监测专业技术人员深入现场实地查勘和调查, 认真制定水土保持监测实施方案和监测工作组织管理措施, 布设水土保持调查监测点, 采集观测数据, 收集资料, 整理和分析监测数据。验收组认为: 监测单位福州市闽华工程设计有限公司能够按照开发建设项目水土保持监测有关规定, 开展水土保持监测工作, 监测结果基本满足水土保持方案及水土保持监测技术规程要求。

## 6.5 水土保持监理

平潭综合实验区公安局与厦门高诚信建设监理有限公司签订《平潭综合实验区公安指挥情报中心监理服务合同书》。工程完工后，监理单位于 2015 年底编制完成了《平潭综合实验区公安指挥情报中心监理总结报告》。本项目水土保持措施较为简单，水土保持措施建设的监理已纳入工程建设日常监理当中。

施工监理工作机构的组成，总监理工程师：陈长桥，土建专业监理工程师：薛尔平，水电监理工程师：方智杰，监理员：陈小平、张易勇、刘四英、林船珍。

监理合同履行情况，平潭综合实验区公安局与厦门高诚信建设监理有限公司于 2012 年签订了本工程的监理合同，合同约定 2012 年 5 月开始实施，至工程竣工保修期满后终止。

在整个监理过程中，监理单位遵循公正、独立、自主的原则，严格按照工程监理合同的有关条款进行操作，对业主提供科学、优质的监理服务，并积极做好业主与施工单位的协调工作。

## 6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

平潭综合实验区水土保持监督站不定期对平潭综合实验区公安指挥情报中心项目进行了监督检查。针对检查部门提出的监督检查意见均严格执行落实。

## 6.7 水土保持补偿费缴纳情况

《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书》（报批稿）批复水土保持补偿费 9.20 万元，2013 年 6 月 8 日实际缴纳水土保持补偿费 9.20 万元。

## 6.8 水土保持设施管理维护

平潭综合实验区公安局严格执行国家水土保持法律、法规和当地政

府、发包方及施工技术细则规定的强制性条款。遵照有关水土保持的各项规章和指令，同上级和相关业务部门保持联系，对下做好水土保持指导和服务工作。

组织对下检查和指导工作，深入基层认真调查和收集水土保持好的做法，并在组织推广应用。

建设单位分管领导经常深入施工现场进行监督检查，发现问题及时纠正。

水土保持设施验收合格后，平潭综合实验区公安局仍需加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施安全、有效运行。

## 7 结论

### 7.1 结论

平潭综合实验区公安指挥情报中心项目建设单位在建设中能够很好地履行水土保持法律、法规规定的防治责任，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施。在施工过程中，严格执行工程建设管理程序，施工管理规范，工程质量满足了设计和有关规范的要求。

平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，经过平潭综合实验区公安局等各方的紧密配合，平潭综合实验区水土保持监督站的支持和协作，使防治责任范围内的水土流失得到了有效的治理，各项防护工程质量符合要求，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

水土保持措施实施效果为：扰动土地整治率 95.10%，水土流失总治理度 97.06%，土壤流失控制比 1.05，拦渣率 95.11%，林草植被恢复率 98.25%，林草覆盖率 27.45%。各项指标均达到方案设计的防治目标值。

水土保持设施布局合理，完成的质量和数量基本符合设计标准，实现了保护主体工程安全、控制水土流失、恢复和改善生态环境的设计目标。工程档案管理规范，竣工资料齐全，质量检验和评定程序规范，资料详实，成果可靠，水土保持设施工程质量总体合格，经过试运行的考验，未发现重大质量缺陷，运行情况良好，已具备较强的水土保持功能。水土保持设施所产生的经济效益、生态效益、以及社会效益，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。


综上所述，平潭综合实验区公安指挥情报中心项目水土保持方案审批手续完备，水土保持工程管理、设计、施工、监理、监测、财务等建档资料齐全。水土保持设施按批准的水土保持方案要求建成，六项防治

目标达到了方案目标值。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求，且水土保持设施的管理、维护措施已得到落实。总体达到了验收标准，已具备水土保持设施竣工验收条件，水土保持设施验收合格。

## 7.2 遗留问题安排

（1）加强水土保持设施的管理和维护，及时整修损坏工程，确保水土保持设施功能完善。

（2）平潭土壤相对贫瘠，风沙大，灌草成活率较低，植被恢复较慢，应加强管护，及时补植补种。

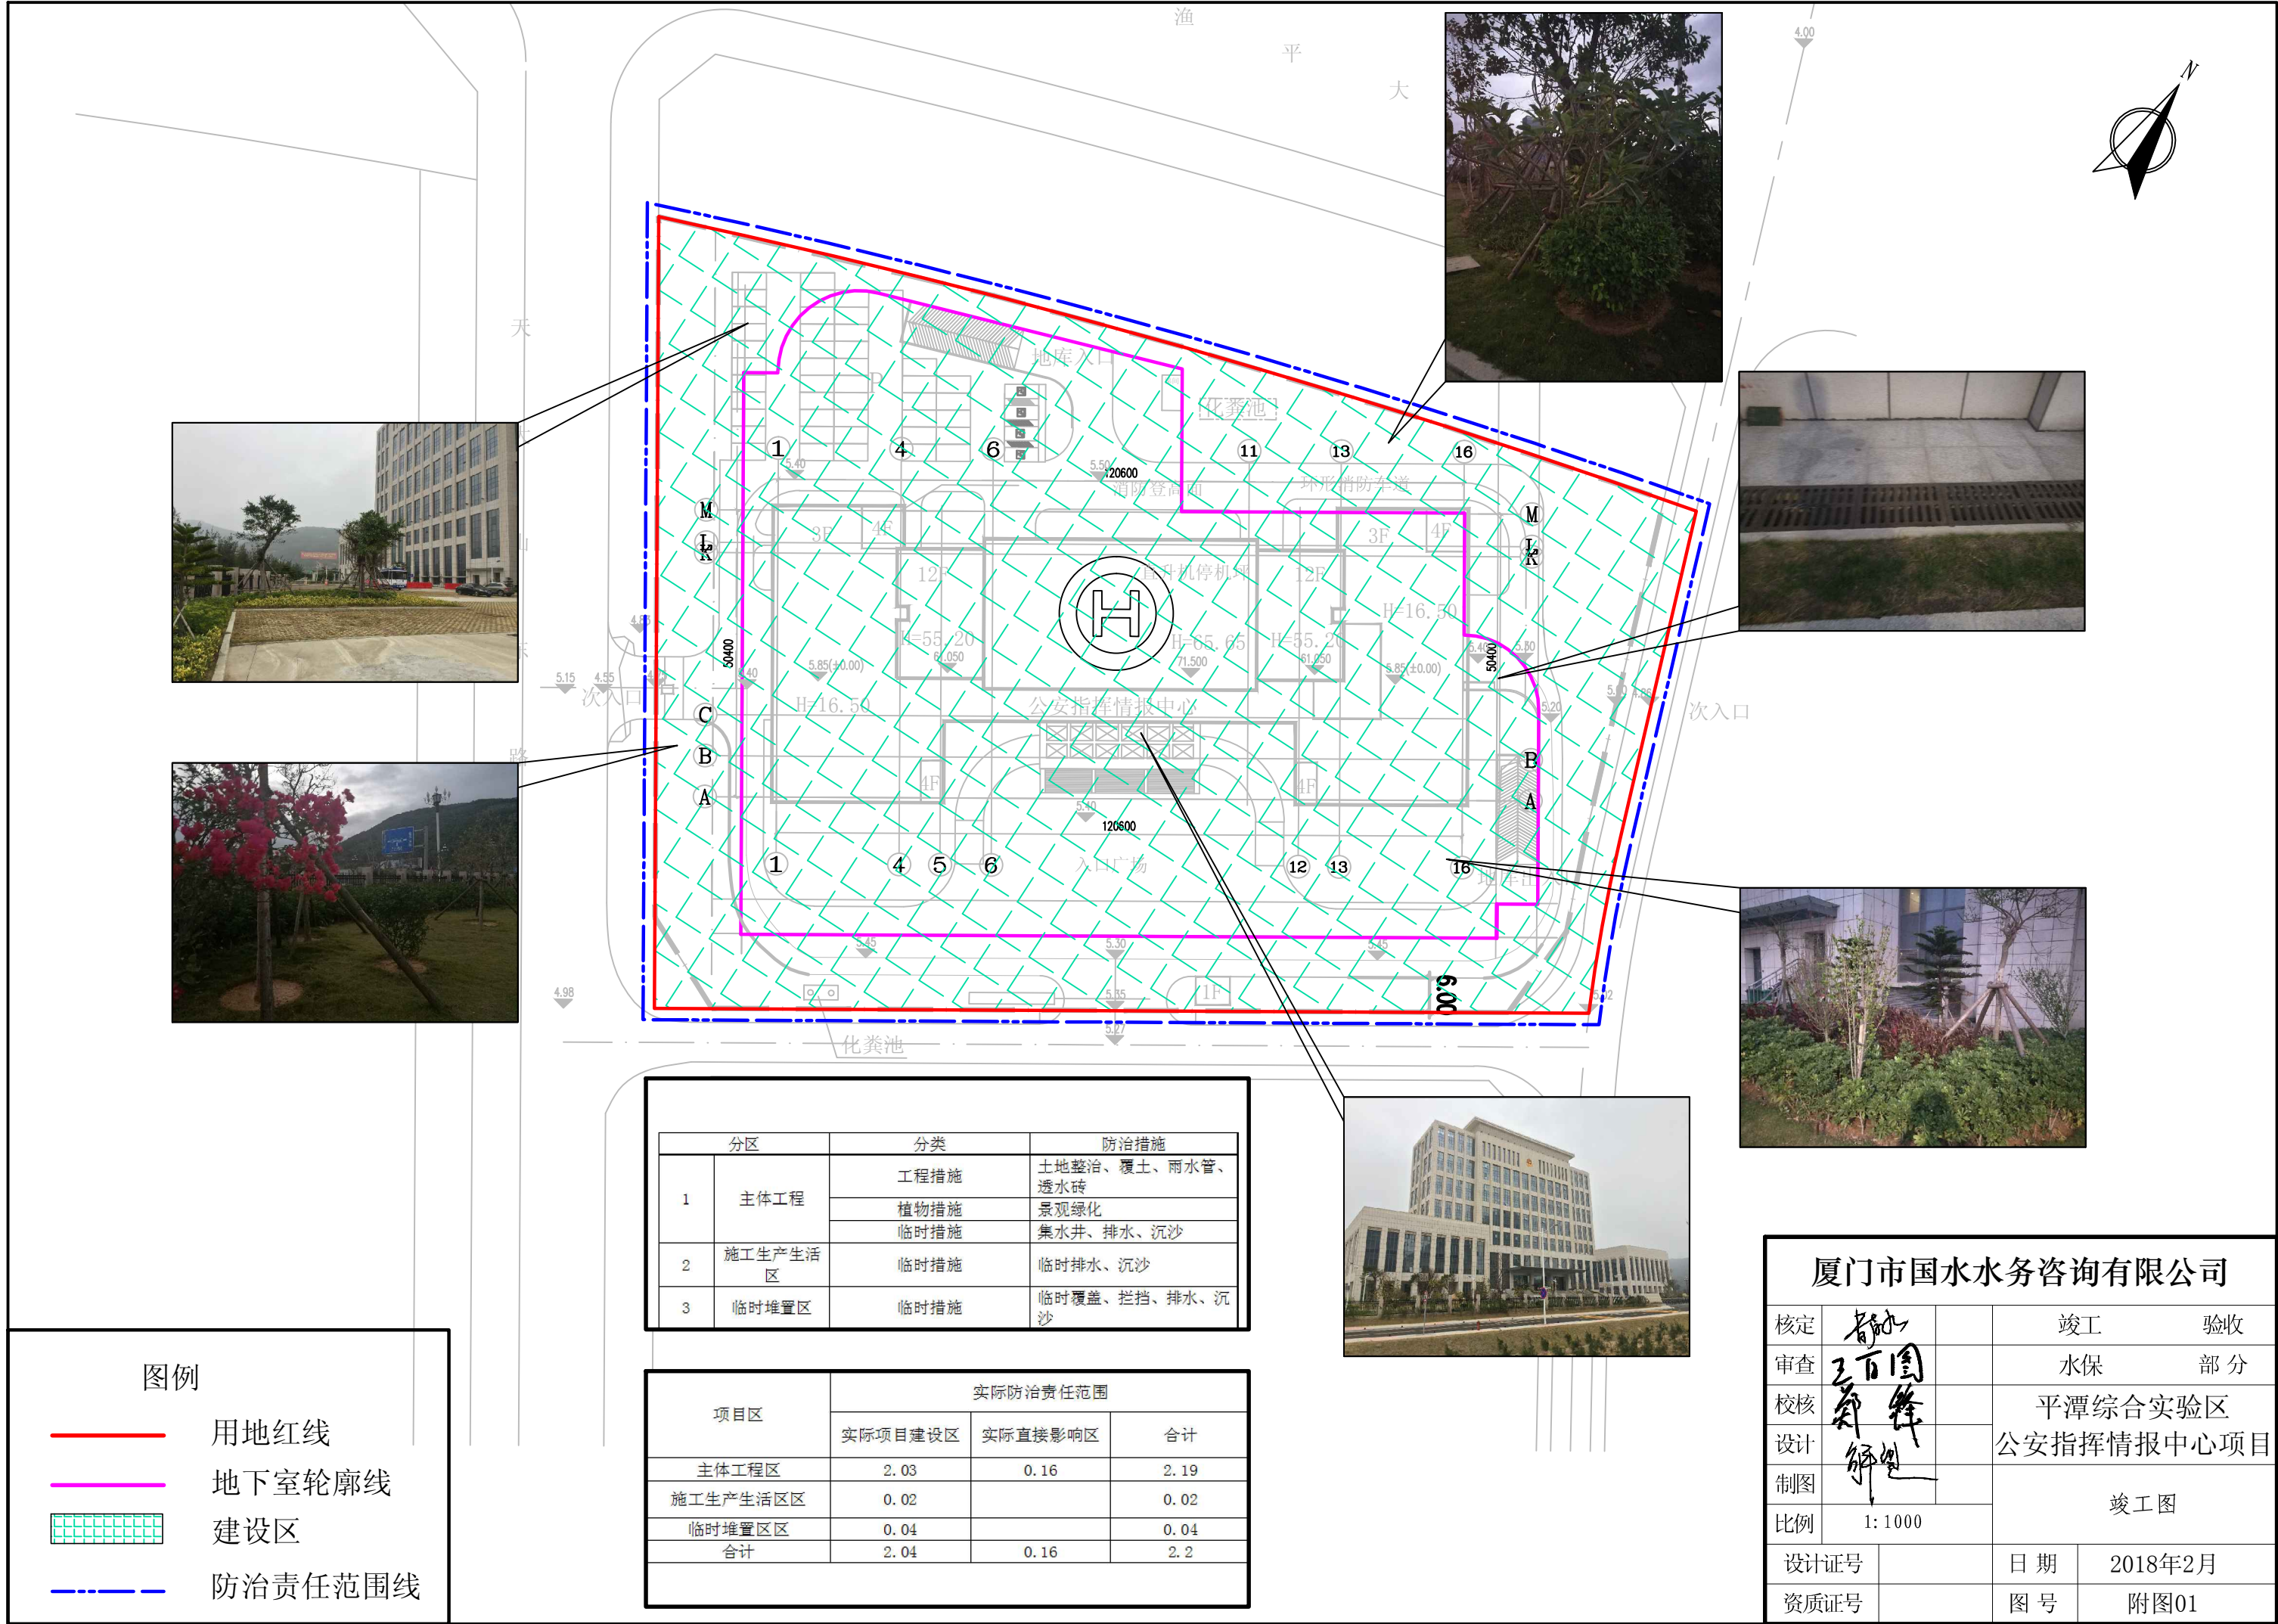

| 分区 | 分类      | 防治措施 |
|----|---------|------|
| 1  | 主体工程    | 工程措施 |
|    |         | 植物措施 |
|    |         | 临时措施 |
| 2  | 施工生产生活区 | 临时措施 |
| 3  | 临时堆置区   | 临时措施 |

| 项目区     | 实际防治责任范围 |         |      |
|---------|----------|---------|------|
|         | 实际项目建设区  | 实际直接影响区 | 合计   |
| 主体工程区   | 2.03     | 0.16    | 2.19 |
| 施工生产生活区 | 0.02     |         | 0.02 |
| 临时堆置区   | 0.04     |         | 0.04 |
| 合计      | 2.04     | 0.16    | 2.2  |

图例

用地红线

地下室轮廓线

建设区

防治责任范围线

厦门市国水水务咨询有限公司

|      |        |            |         |
|------|--------|------------|---------|
| 核定   | 王百国    | 竣工         | 验收      |
| 审查   | 王百国    | 水保         | 部分      |
| 校核   | 王百国    | 平潭综合实验区    |         |
| 设计   | 王百国    | 公安指挥情报中心项目 |         |
| 制图   | 王百国    | 竣工图        |         |
| 比例   | 1:1000 |            |         |
| 设计证号 |        | 日期         | 2018年2月 |
| 资质证号 |        | 图号         | 附图01    |














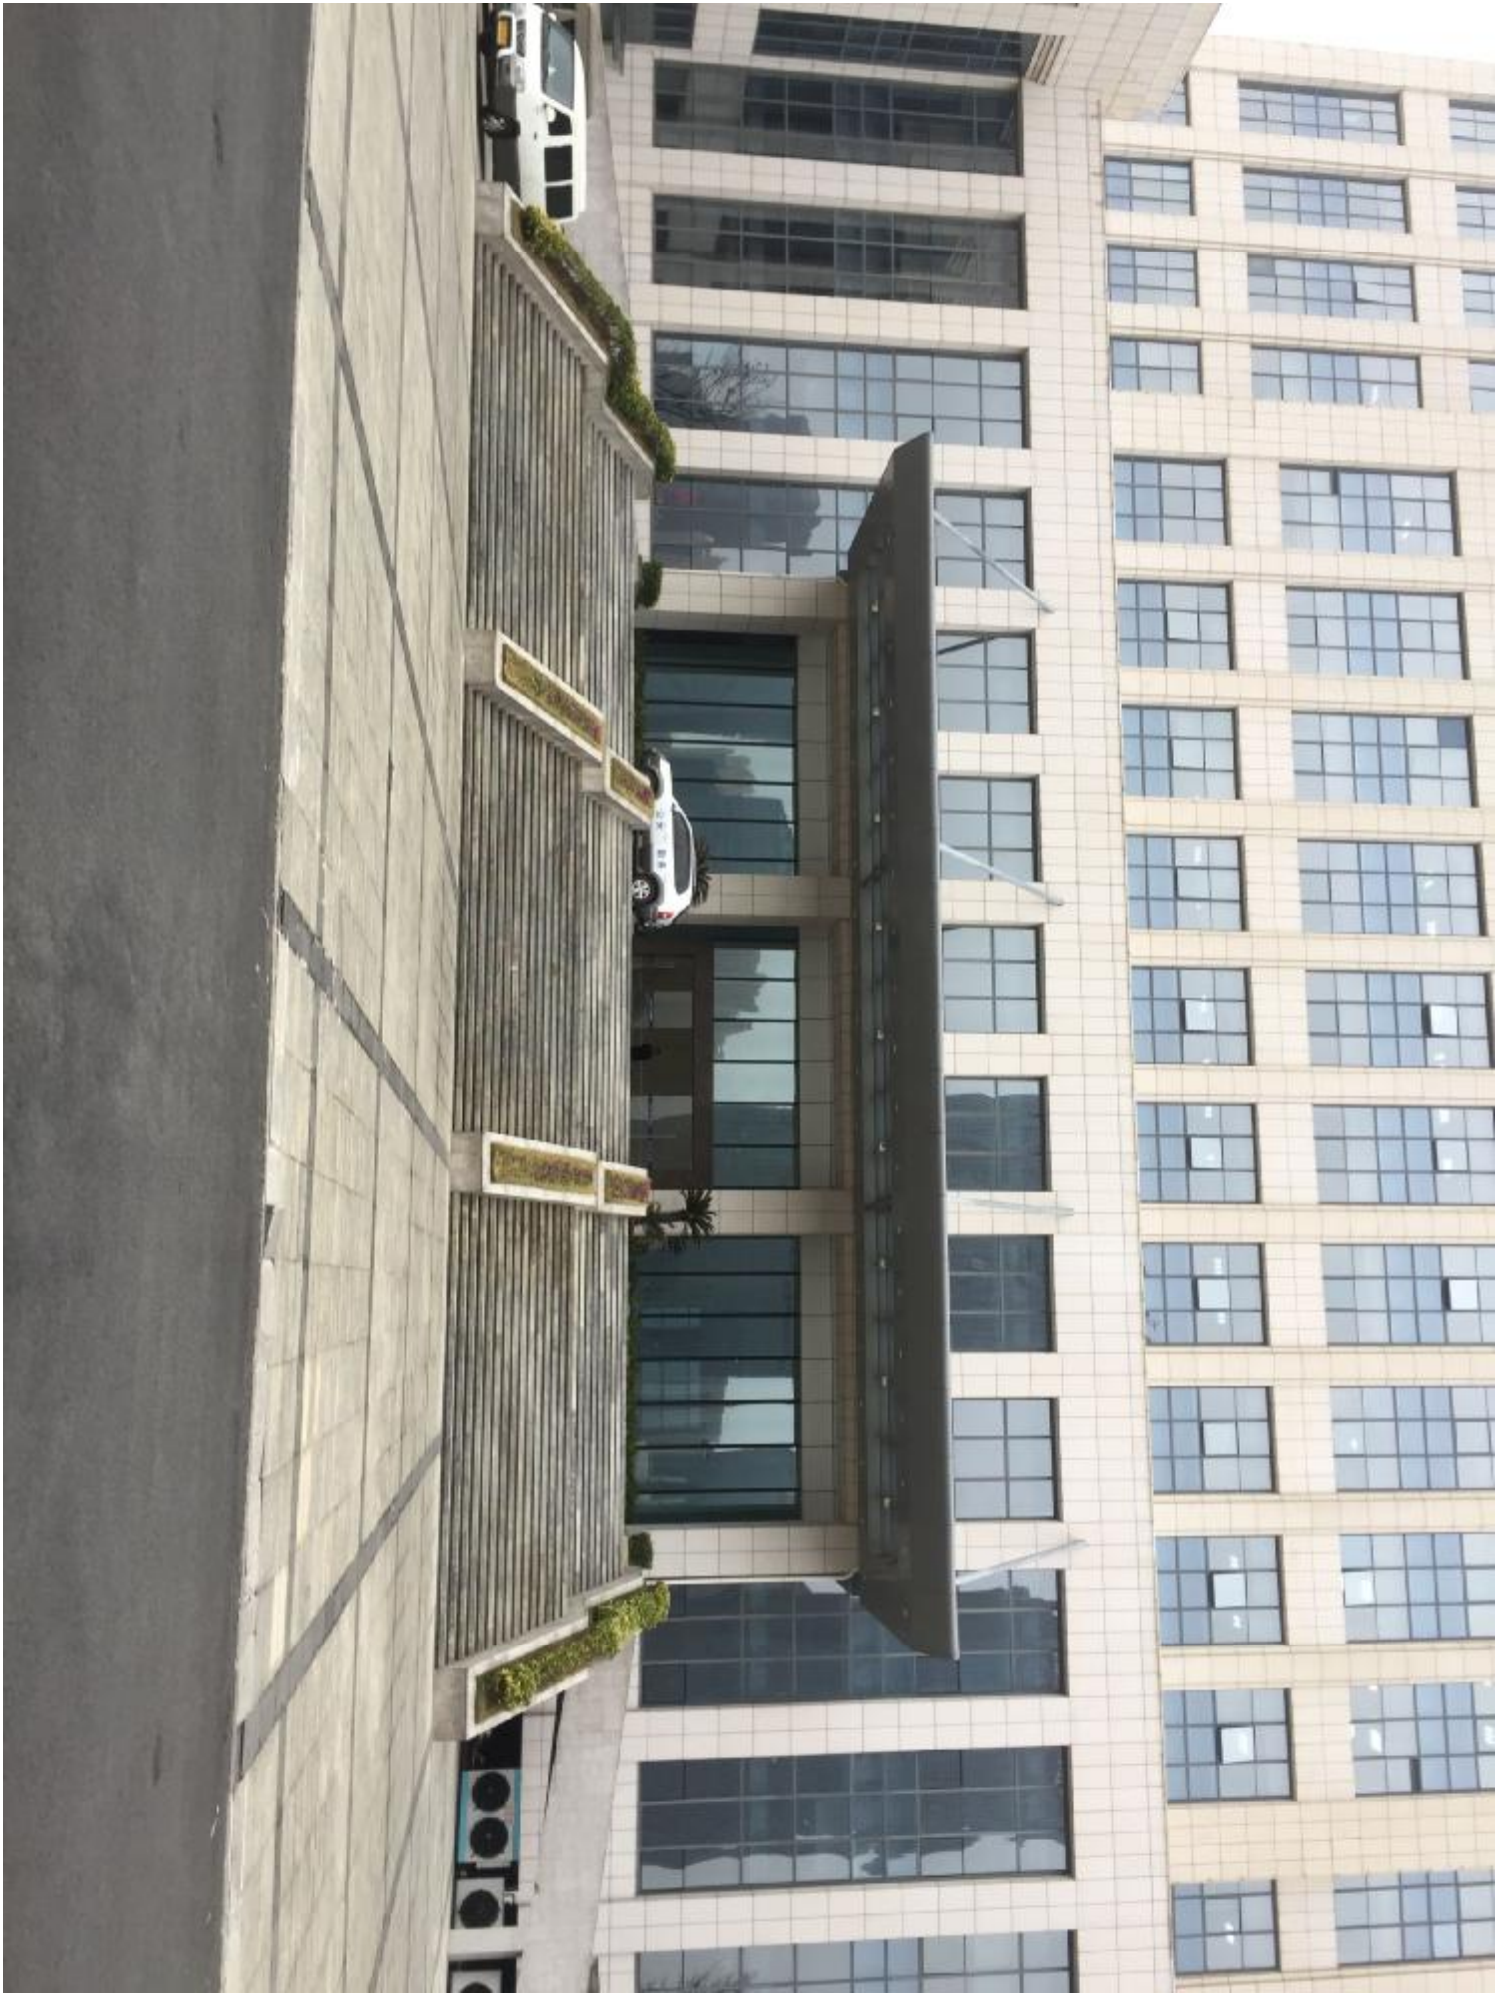











# 平潭县水土保持监督站文件

平水保监审批〔2013〕9号

## 平潭县水土保持监督站关于《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书（报批稿）》的批复

平潭综合实验区公安局：

根据贵局申请，2013年4月28日，我站在福州市召开《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书（送审稿）》技术评审会，贵局会同福建省水利水电勘测设计研究院（方案编制单位）根据评审意见作了修改和完善，形成《平潭综合实验区公安指挥情报中心水土保持方案报告书（报批稿）》（以下简称“报告书”）。现根据专家组评审意见和修改后的报告书（报批稿），批复如下：

一、拟建项目位于平潭综合实验区北厝镇，总用地面积20310.048 m<sup>2</sup>，其中建筑用地面积17453.860m<sup>2</sup>，地上总建筑面积30950 m<sup>2</sup>，地下建筑面积12550m<sup>2</sup>，设地下一层，地上十二层。项目建设总征占土地2.04 hm<sup>2</sup>，其中永久占地2.03 hm<sup>2</sup>，临时占地0.06hm<sup>2</sup>（约有0.05 hm<sup>2</sup>与永久占地重复）。工程土石方开挖总量7.75万 m<sup>3</sup>（自然方，下同），回填总量3.66万 m<sup>3</sup>，弃方4.09万 m<sup>3</sup>。本项目设置施工生产生活区1处，临时堆置区1处。总投资为

19873.74 万元，其中土建投资 16537.52 万元。工程建设计划总工期 28 个月。

二、同意该报告书编制深度达到可研阶段，方案设计水平年为 2015 年；基本同意该工程的水土流失防治责任范围为  $2.31\text{hm}^2$ ，其中项目建设区面积  $2.04\text{hm}^2$ ，直接影响区面积  $0.27\text{hm}^2$ ；基本同意水土流失防治分区和分区防治措施；基本同意该方案水土保持估算总投资 182.28 万元，须依法缴纳水土保持补偿费 9.2 万元。

三、主体工程后续设计中，应将水土保持方案报告书的内容纳入，并单独成章。

四、项目建设各类施工活动，要严格控制在经批准的项目用地范围内，严禁随意压占、扰动、破坏项目用地范围之外的地貌及地表植被。根据立地条件和工程景观要求，优化植被措施树草种选择与配置，合理安排种植季节，完善管护措施。

五、建设单位在工程建设中，应重视做好以下工作：

1、按照批复的水土保持方案落实资金、管理等保障措施，要将报告书建议的内容写入标书，并做好本方案下阶段的水土保持设施设计、招投标和施工组织工作，加强对施工单位的监督与管理，该工程水土保持方案实施要与主体工程建设同步，切实落实“三同时”制度。

2、定期向我站书面报告该项目水土保持方案的实施进展情况，接受并配合我站的监督检查工作。

3、委托具有水土保持监测资质的机构承担该项目水土保持监测任务，并及时向我站提交监测报告。

4、委托具有水土保持监理资质的机构承担该项目水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量。

5、水土保持后续设计方案应报我站备案。水土保持工程发生重大变更时，需及时将变更设计报我站审核同意。

6、应依法缴纳水土保持补偿费，同时落实好水土保持其他各项资金到位。

六、建设单位要按照《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》的规定，在工程投入运营之前，及时申请该项目水土保持方案竣工验收。

二〇一三年六月十七日



主题词：水利 水土保持 方案 批复

抄送：福建省水土保持监督站，福建省水利水电勘测设计研究院  
平潭县水土保持监督站

2013年6月17日印发

福建省非税收入票据

No: 05564610

注册号码: 闽财(2012)票字第02号

数字指纹: 00B7BA9F5A73A1DD

2013年06月08日

收费单位编码: 488511639

平潭综合实验区国库支付中心

| 缴款单位<br>(缴款人)     | 项目编码 | 项目名称    | 计量单位 | 数量 | 标准      | 金额           | 备注          |
|-------------------|------|---------|------|----|---------|--------------|-------------|
|                   | 074  | 水土保持补偿费 |      | 1  | 92000 元 | 92,000.00    | 平潭综合实验区指挥中心 |
| 合计人民币(大写): 玖万贰仟元整 |      |         |      |    |         | ¥: 92,000.00 |             |

电脑打印、手写无效

收费单位(公章):

财务复核:

经办人:

丁峰

注: 本票据使用范围: ①用于收取行政事业性收费、政府性基金; ②用于收取除土地、海域、矿产资源外的其他国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、经财政部门批准的主管部门集中收入等非税收入。

第一联 收据

# 中华人民共和国

# 建筑工程施工许可证

编号 350400201212270201

根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本  
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关



日期

|        |                                                                                                                                                            |        |            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 建设单位   | 平潭综合实验区公安局                                                                                                                                                 |        |            |
| 工程名称   | 平潭综合实验区公安指挥情报中心                                                                                                                                            |        |            |
| 建设地址   | 平潭综合实验区渔平大道南侧、天大山东路东侧                                                                                                                                      |        |            |
| 建设规模   | 43012.92m <sup>2</sup>                                                                                                                                     | 合同价格   | 12757.9 万元 |
| 设计单位   | 厦门中合现代工程设计有限公司                                                                                                                                             |        |            |
| 施工单位   | 中建三局建设工程股份有限公司                                                                                                                                             |        |            |
| 监理单位   | 厦门高诚信建设监理有限公司                                                                                                                                              |        |            |
| 合同开工日期 | 2012.12                                                                                                                                                    | 合同竣工日期 | 2013.10    |
| 备注     | 1.项目经理:江鑫 技术负责人:吴开伙<br>2.总监理工程师:陈长桥<br>3.施工图审查机构:厦门合道施工图审查有限公司<br>施工图审查合格书编号:FJSSJZ-12-01489<br>施工图审查报告书编号:JZ-2012-008-K<br>4.其中计容面积:30388.6m <sup>2</sup> |        |            |

### 注意事项:

- 一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。
- 二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。
- 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。
- 四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。
- 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。
