

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 金顺新光明城（一期、二期）及整体项目 竣工规划条件核实公示

金顺新光明城（一期、二期）项目位于兴港中路（原金井二路）东侧、遂意路（原平岚岭路）南侧、诚意路（原天大北路）北侧。我局于2017年9月15日核发该项目（一期）建设工程规划许可证，编号为：建字第350128201700049号；2017年12月1日核发该项目（二期）建设工程规划许可证，编号为：建字第350128201700062号。

经核对相关报批申请材料并现场踏勘，发现该项目存在实地建设与原审批不一致等问题（详见附件），但实地建设相关指标均符合土地出让合同要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站 <http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2025年1月17日至2025年2月6日。公示期间，如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，

如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图
2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网站公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）
3. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 7 号楼 7 层
4. 联系人：高工，联系方式：0591-23163333，电子邮箱：zystjjgc@163.com

附件：1. 金顺新光明城（一期）实地建设与规划审批不一致对比分析
2. 金顺新光明城（二期）实地建设与规划不一致对比分析

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025 年 1 月 16 日




附件 1

金顺新光明城（一期）实地建设与规划审批 不一致对比分析

一、建筑分层图部分

1、商业 1#楼一层 1 轴至 4 轴交 A 轴至 D 轴，生鲜超市南侧与商业分隔墙未施工，商业内部隔墙未施工，6 轴至 7 轴交 C 轴至 D 轴垃圾收集房西侧隔墙未施工；暂按审批进行分隔计算。

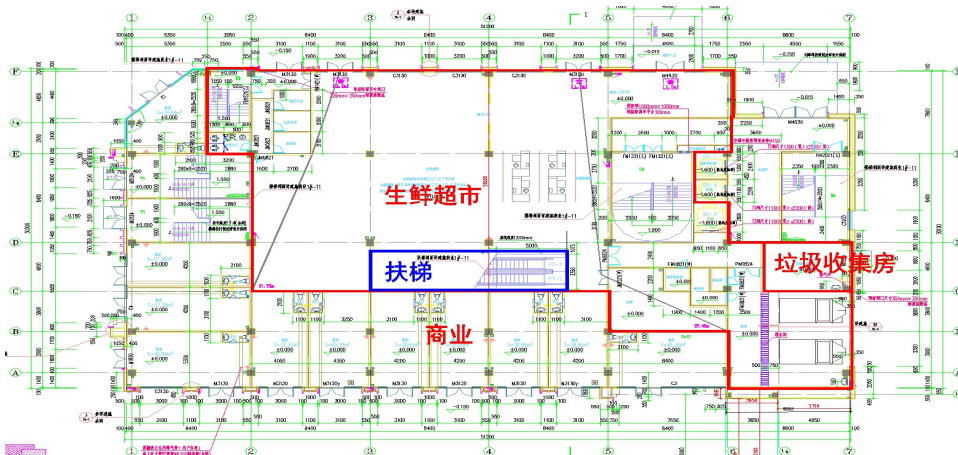

调整原因：建设单位承诺于 2025 年 12 月 31 日前，按照商业楼商铺分户隔墙按照权界钉位置砌筑墙体，不影响项目整体规划。

2、商业 1#楼二层至五层、商业 2#楼二至三层、商业 3#楼二至三层、商业 5#楼二至三层业内部隔墙均未施工，总面积不变（如图 3.1 为 1#商业三层平面图）。

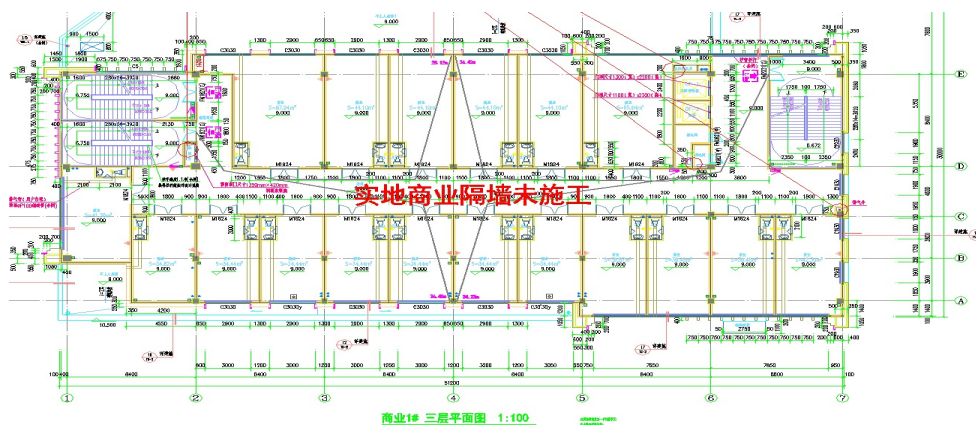


图 3.1

调整原因：建设单位承诺于 2025 年 12 月 31 日前，按照商业楼商铺分户隔墙按照权界钉位置砌筑墙体，不影响项目整体规划。

3、商业 1-1#楼一层 4 轴至 5 轴交 C 轴至 D 轴处的地面设备用房(商业变电所)内部增加隔墙，实地分割为两间，总面积不变（如图 4.1）。


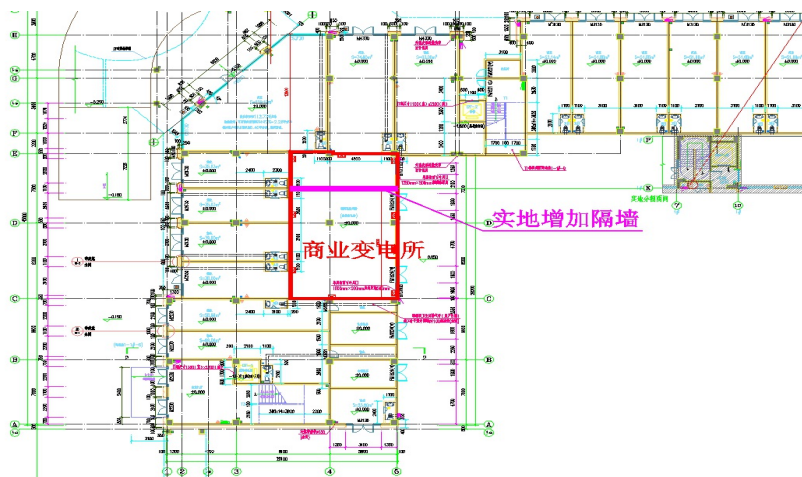


图 4.1


调整原因：根据电力深化图纸，供电需要，实地增加隔墙。

4、商业 7-1#楼一层审批为商业,实地建设为售楼部（商业内部隔墙与审批不一致），总面积不变。

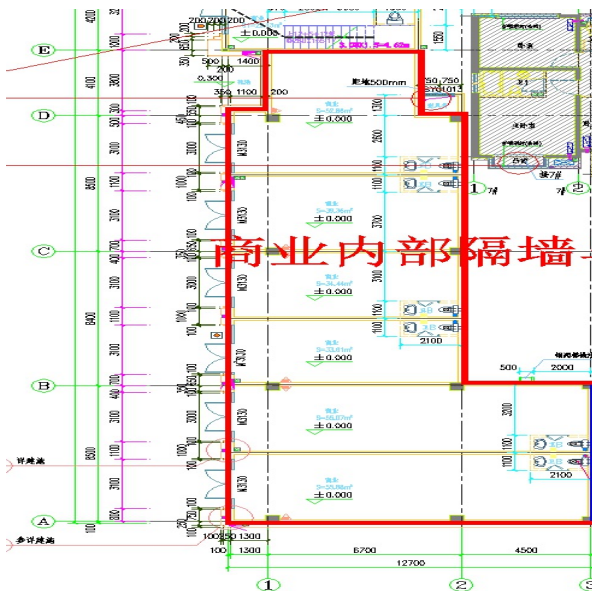


调整原因：建设单位承诺于 2025 年 12 月 31 日前，按照商业楼商铺分户隔墙按照权界钉位置砌筑墙体，但不影响项目整体规划。

5、地下室 71 轴至 72 轴交 TD 轴至 QD 轴处机动车坡道实地增建盖板（面积为 139.20 平方米,不计建筑面积）；47 轴至 58 轴交 LC 轴至 HC 轴机动车坡道下方墙体未施工,坡道下方空间部分净高大于 2.1m,导致机动建筑面积增加 31.78 平方米；(6#)1 轴至 2 轴交 L 轴至 H 轴审批为机动车库，实地围合成设备用房，导致设备用房建筑面积增加 12.51 平方米，机动车库面积减少 12.51 平方米。

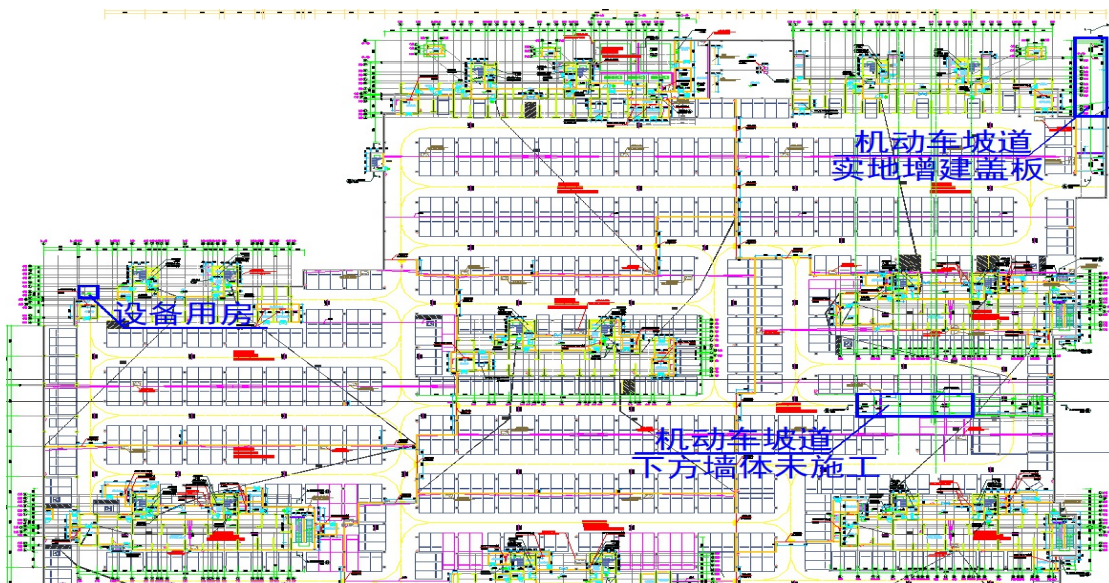


机动车坡道实地增建盖板（不计建筑面积）

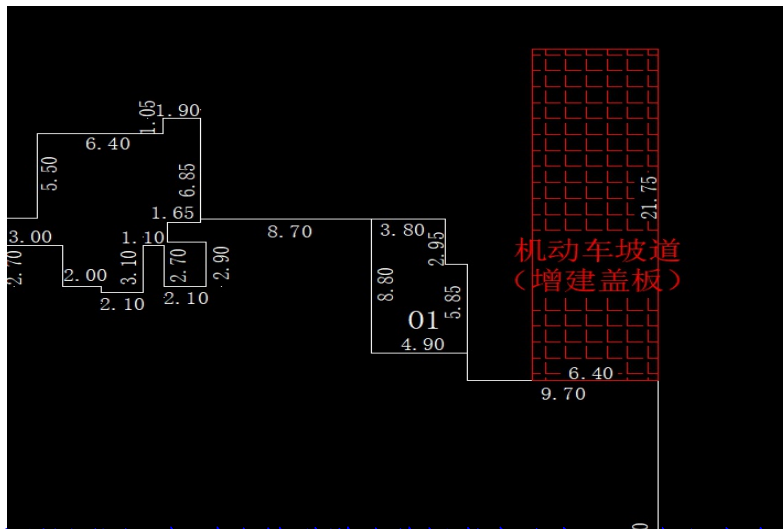


调整原因：机动车坡道增建盖板考虑业主雨天出行安全，坡道打滑，以及防汛等问题，进行了深化设计增建了盖板。

机动车坡道下方墙体未施工

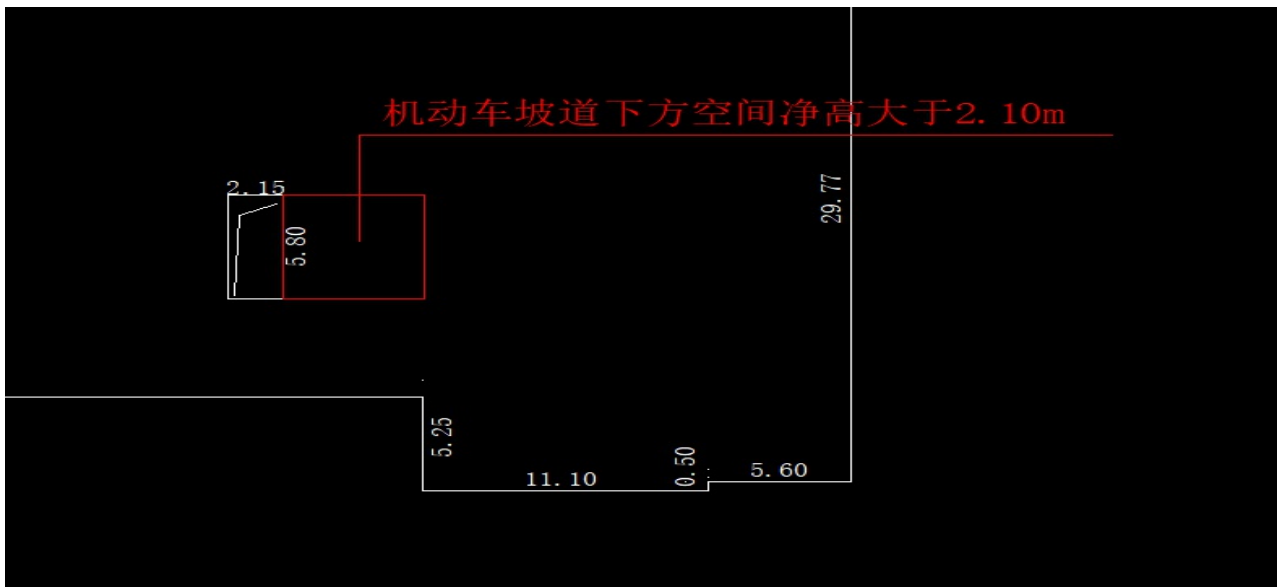

调整原因：机动车坡道下方墙体部位为考虑后期业主非机动车临时停放及通行方便。机动车库实地围合成设备用房

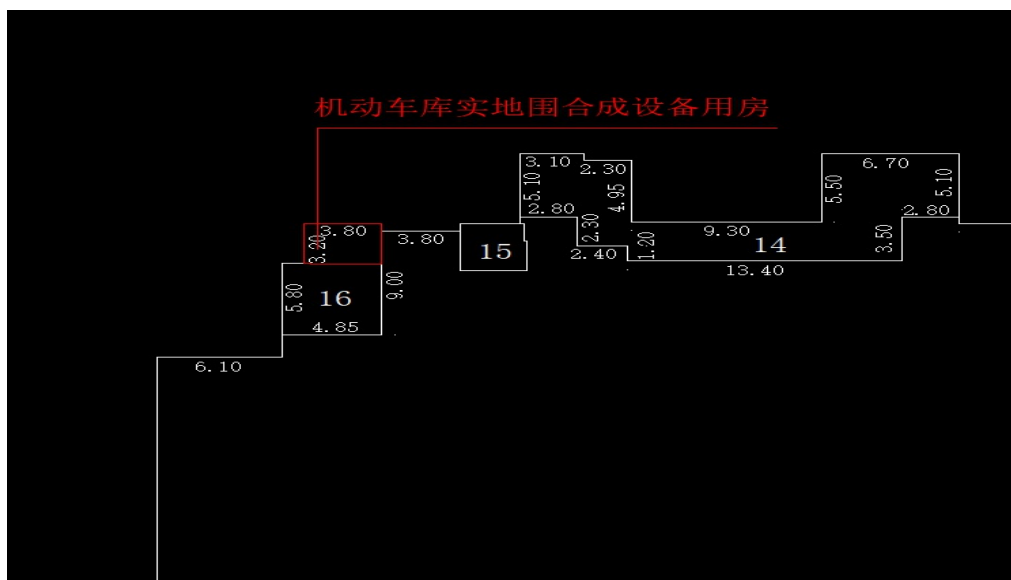


调整原因：此部位地下室建筑图与电气图不符，电气图设计为商业配电间，现场按照电气设计图建设为商业配电间。

二、车位建设情况

审核内容	审批情况 (一期)	实际建设情况 (一期)	备注
地面非机动车停 车位合计	1482 辆 (审批总平面图图面测算)	1454 辆 (面积 2182.10 m ²)	实测地面非机动车位 面积按 1.5 m ² /辆折 算

金顺新光明城（一期）地面车位实地建设与审批不一致对比

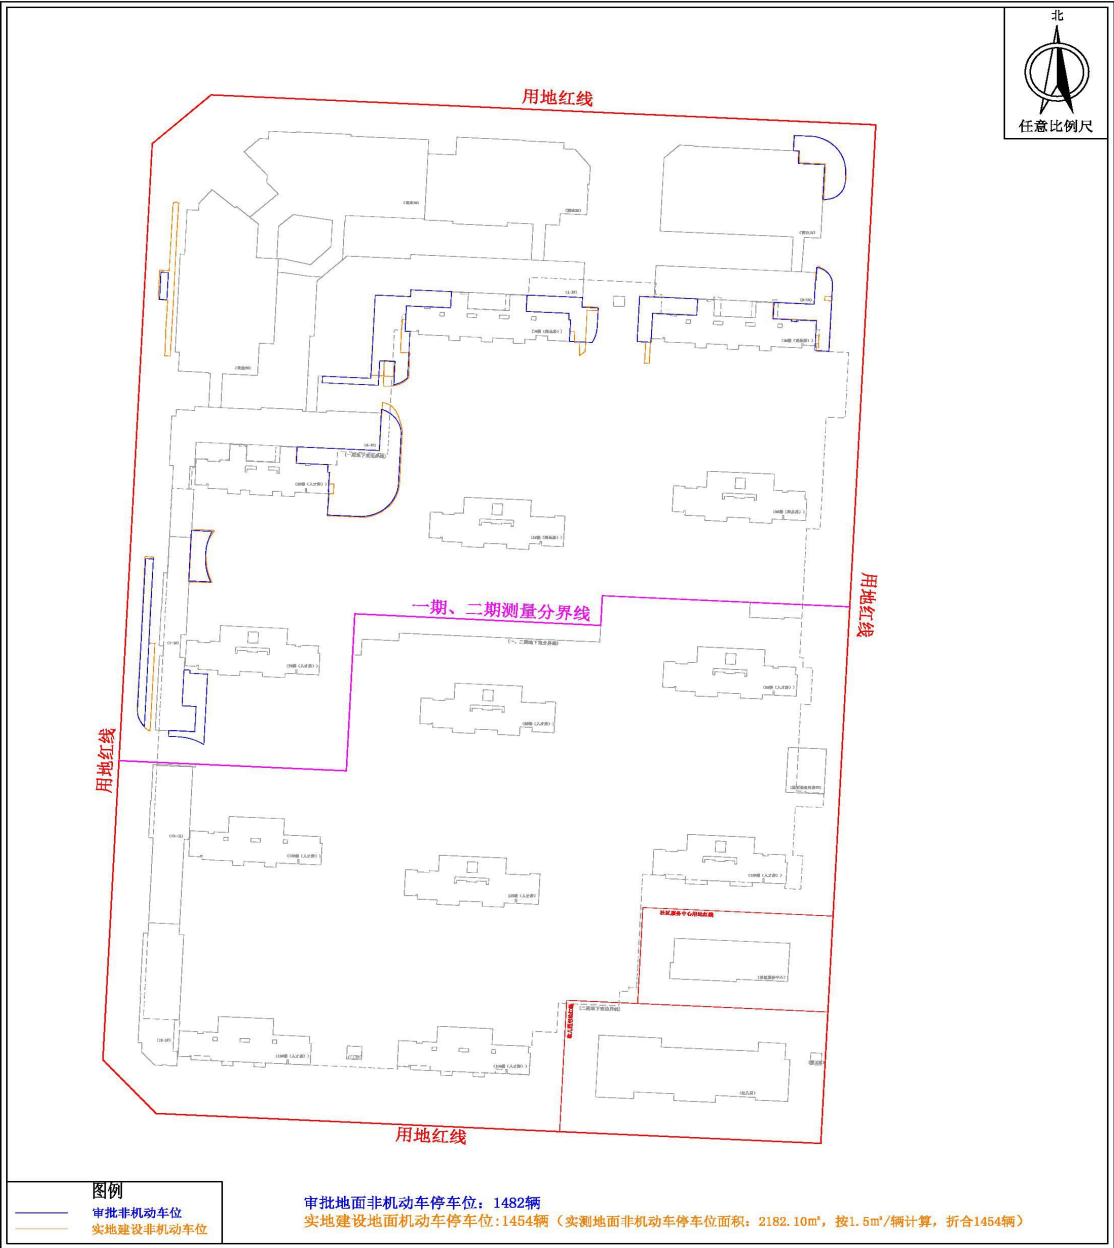


调整原因：地面非机动车停车位一、二期统筹整体考虑，进行了调整，一、二期实地建设地面非机动车停车位数量及面积满足设计规划要求。

三、绿地建设情况

审核内容	审批情况	实际建设情况	备注
	13817.78 m ² (一期审批总平面图图面测算)	13917.64 m ² (一期)	分期建设，部分绿地建设位置实地与审批不一致
	28551 m ² (一期二期(汇总)审批总平面图指标)		

金顺新光明城（一期）绿地实地建设与审批不一致对比

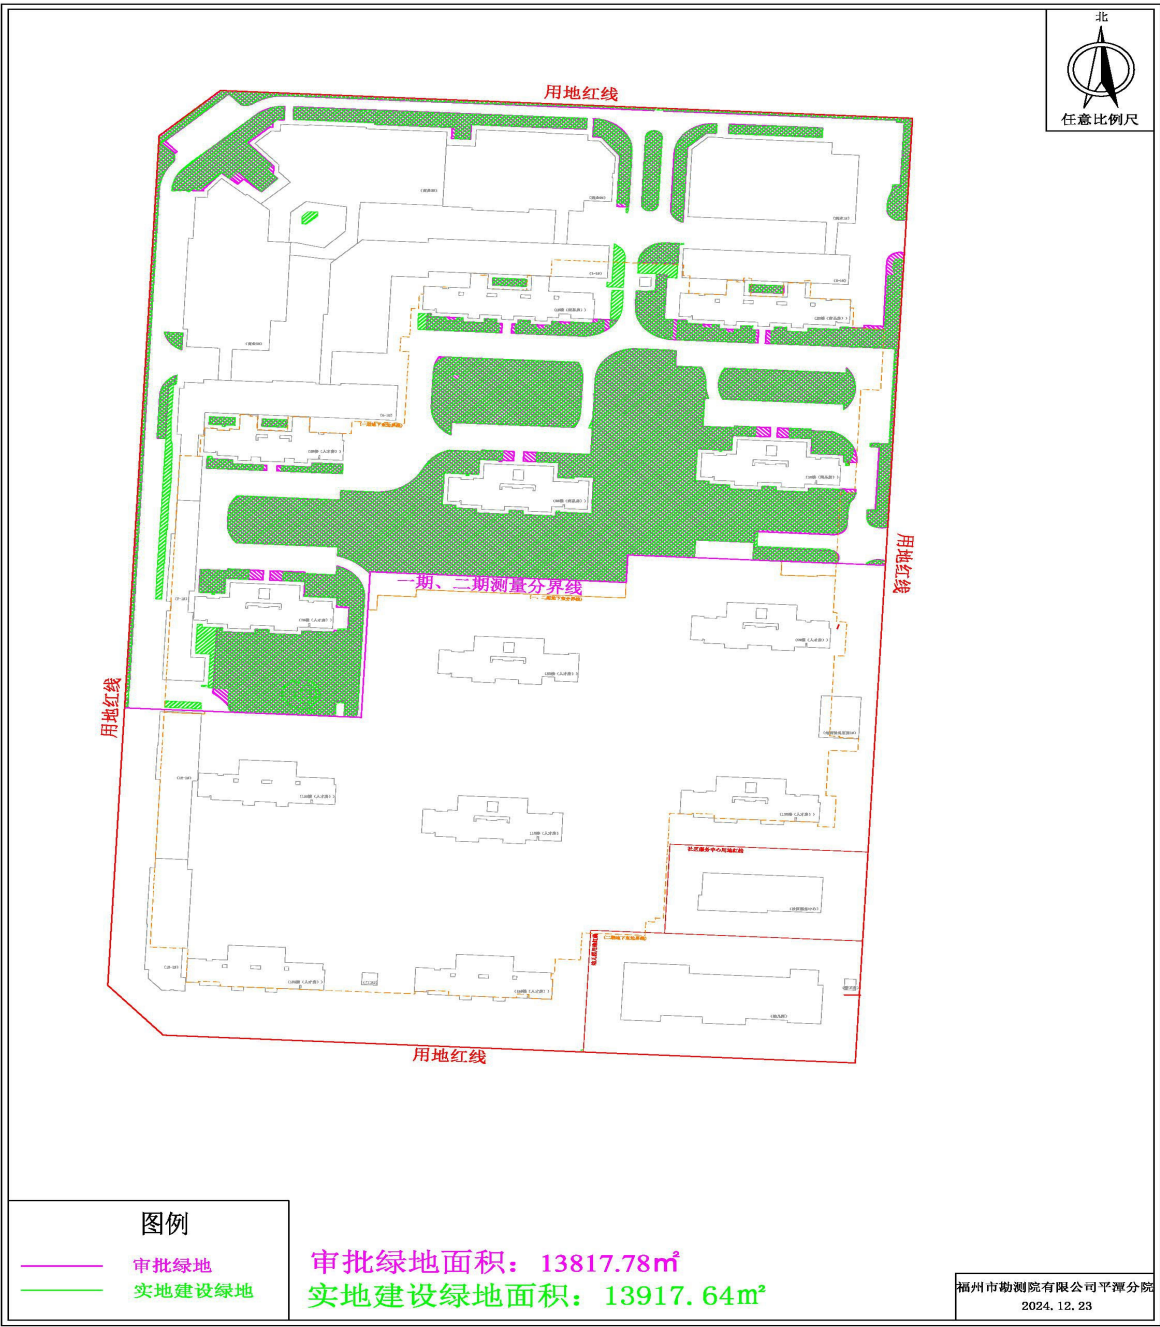

调整原因：因一、二期景观绿化经过专业深化设计，进行部分调整，一、二期实地建设绿地面积满足审批绿地面积。


附件 2

金顺新光明城(二期)实地建设与规划

不一致对比分析


一、建筑分层部分

1、地面设备用房 1#一层 1 轴至 2 轴交 C 轴处的地面设备用房 1(3#住宅专用计量配电间)内部墙体向东位移 0.40 米，计量配电间做小，住宅变电间做大（该部分面积为 0.56 m^2 ,总面积不变）。

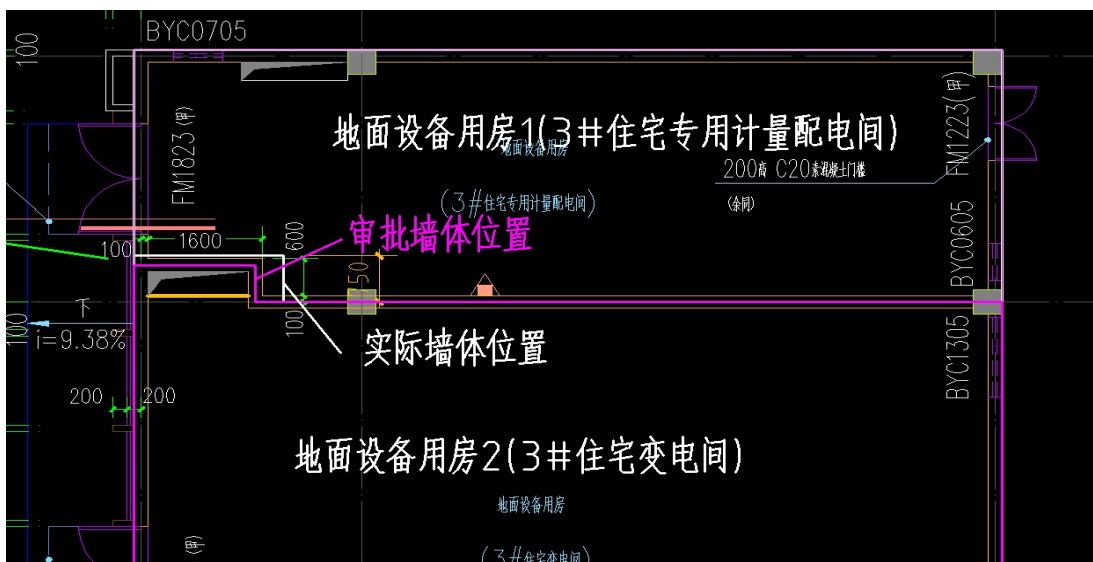

调整原因：由于供电需要，内部墙体北移 0.4m，但总面积不变, 不影响项目整体规划。

2、地下室一层 28 轴至 29 轴交 CA 轴处的顶板往南做大 0.45 米（不计建筑面积为 3.47 m^2 ）。

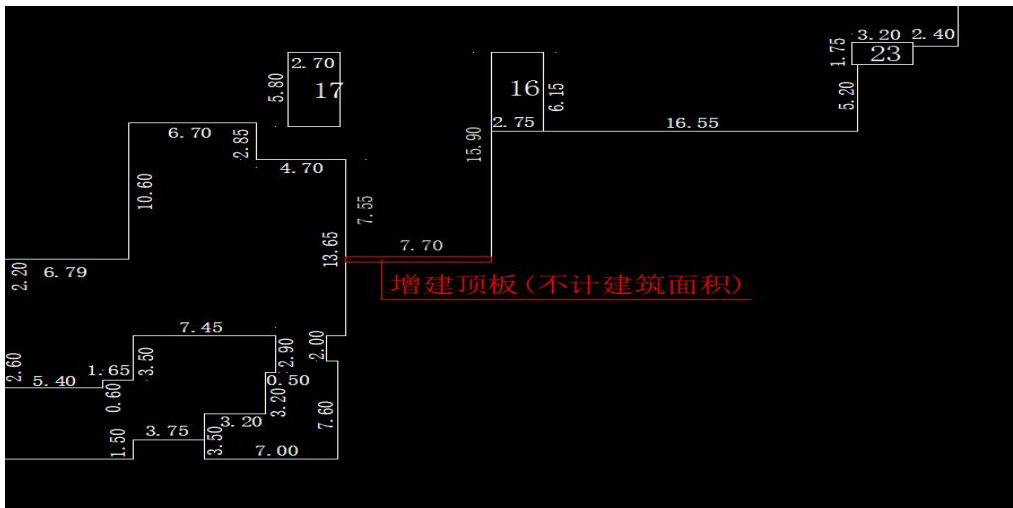

调整原因：增建部分顶板结合施工结构图，为汽车坡道顶板结构梁，但不影响项目整体规划。

3、社区服务中心一至四层内部虚线分隔墙实地未建设（如图 3.1 为社区服务中心一层平面图）。

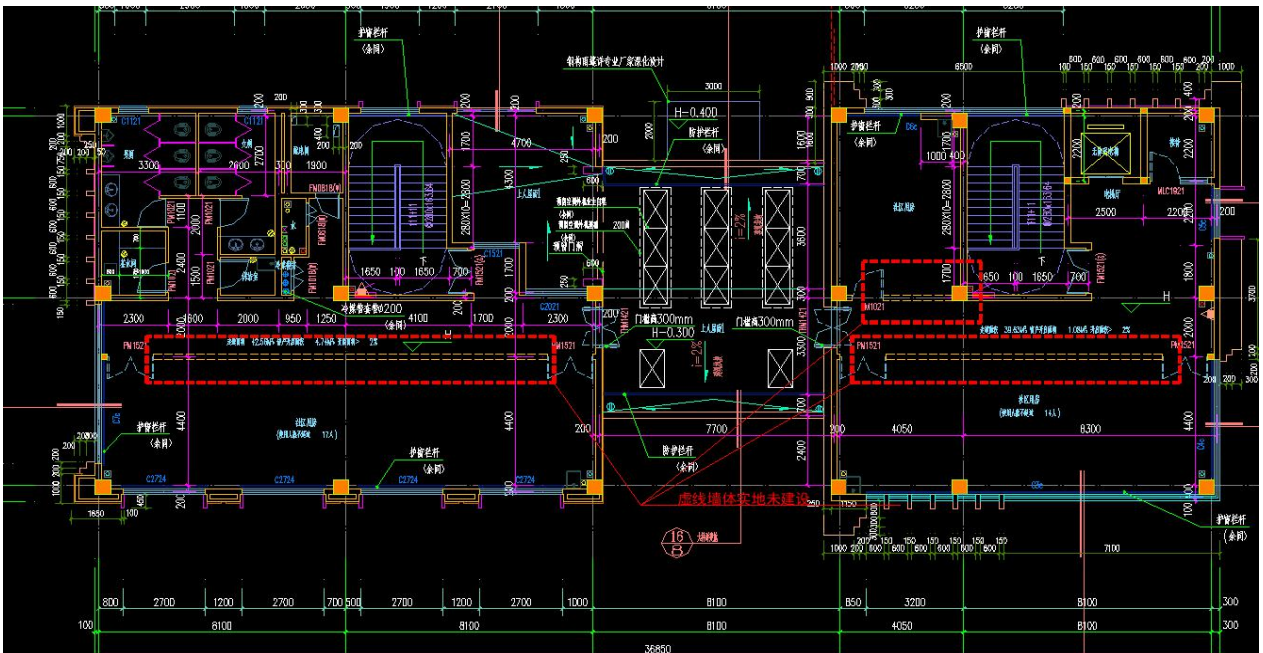


图 3.1


调整原因：现因本项目预重组方案及资金等问题，近期无法完善光明城社区服务中心功能用房内隔墙，待本住宅小区后续扫尾相关工程达到完善，建设单位承诺于 2025 年 6 月 30 日前，待社区办事处入驻光明城社区服务中心投入使用前，按照规划设计指标要求，砌筑社区服务中心功能用房内隔墙，（社区医疗服务站 1000 m²，社区用房 600 m²，老年活动室 100 m²，青少年活动室 100 m²）。

二、车位建设情况

二期车位建设情况

审核内容	审批情况 (二期)	实际建设情况 (二期)	备注
地面机动车停车位合计	146 辆 (审批总平面图图面测算)	145 辆	含 2 辆微型车位按 0.7 折算 为 1 辆普通车位
地面非机动车停车位合 计	975 辆 (审批总平面图图面测算)	1062 辆 (面积 1592.41 m ²)	实测地面非机动车位面积按 1.5 m ² /辆折算

金顺新光明城（二期）地面车位实地建设与审批不一致对比

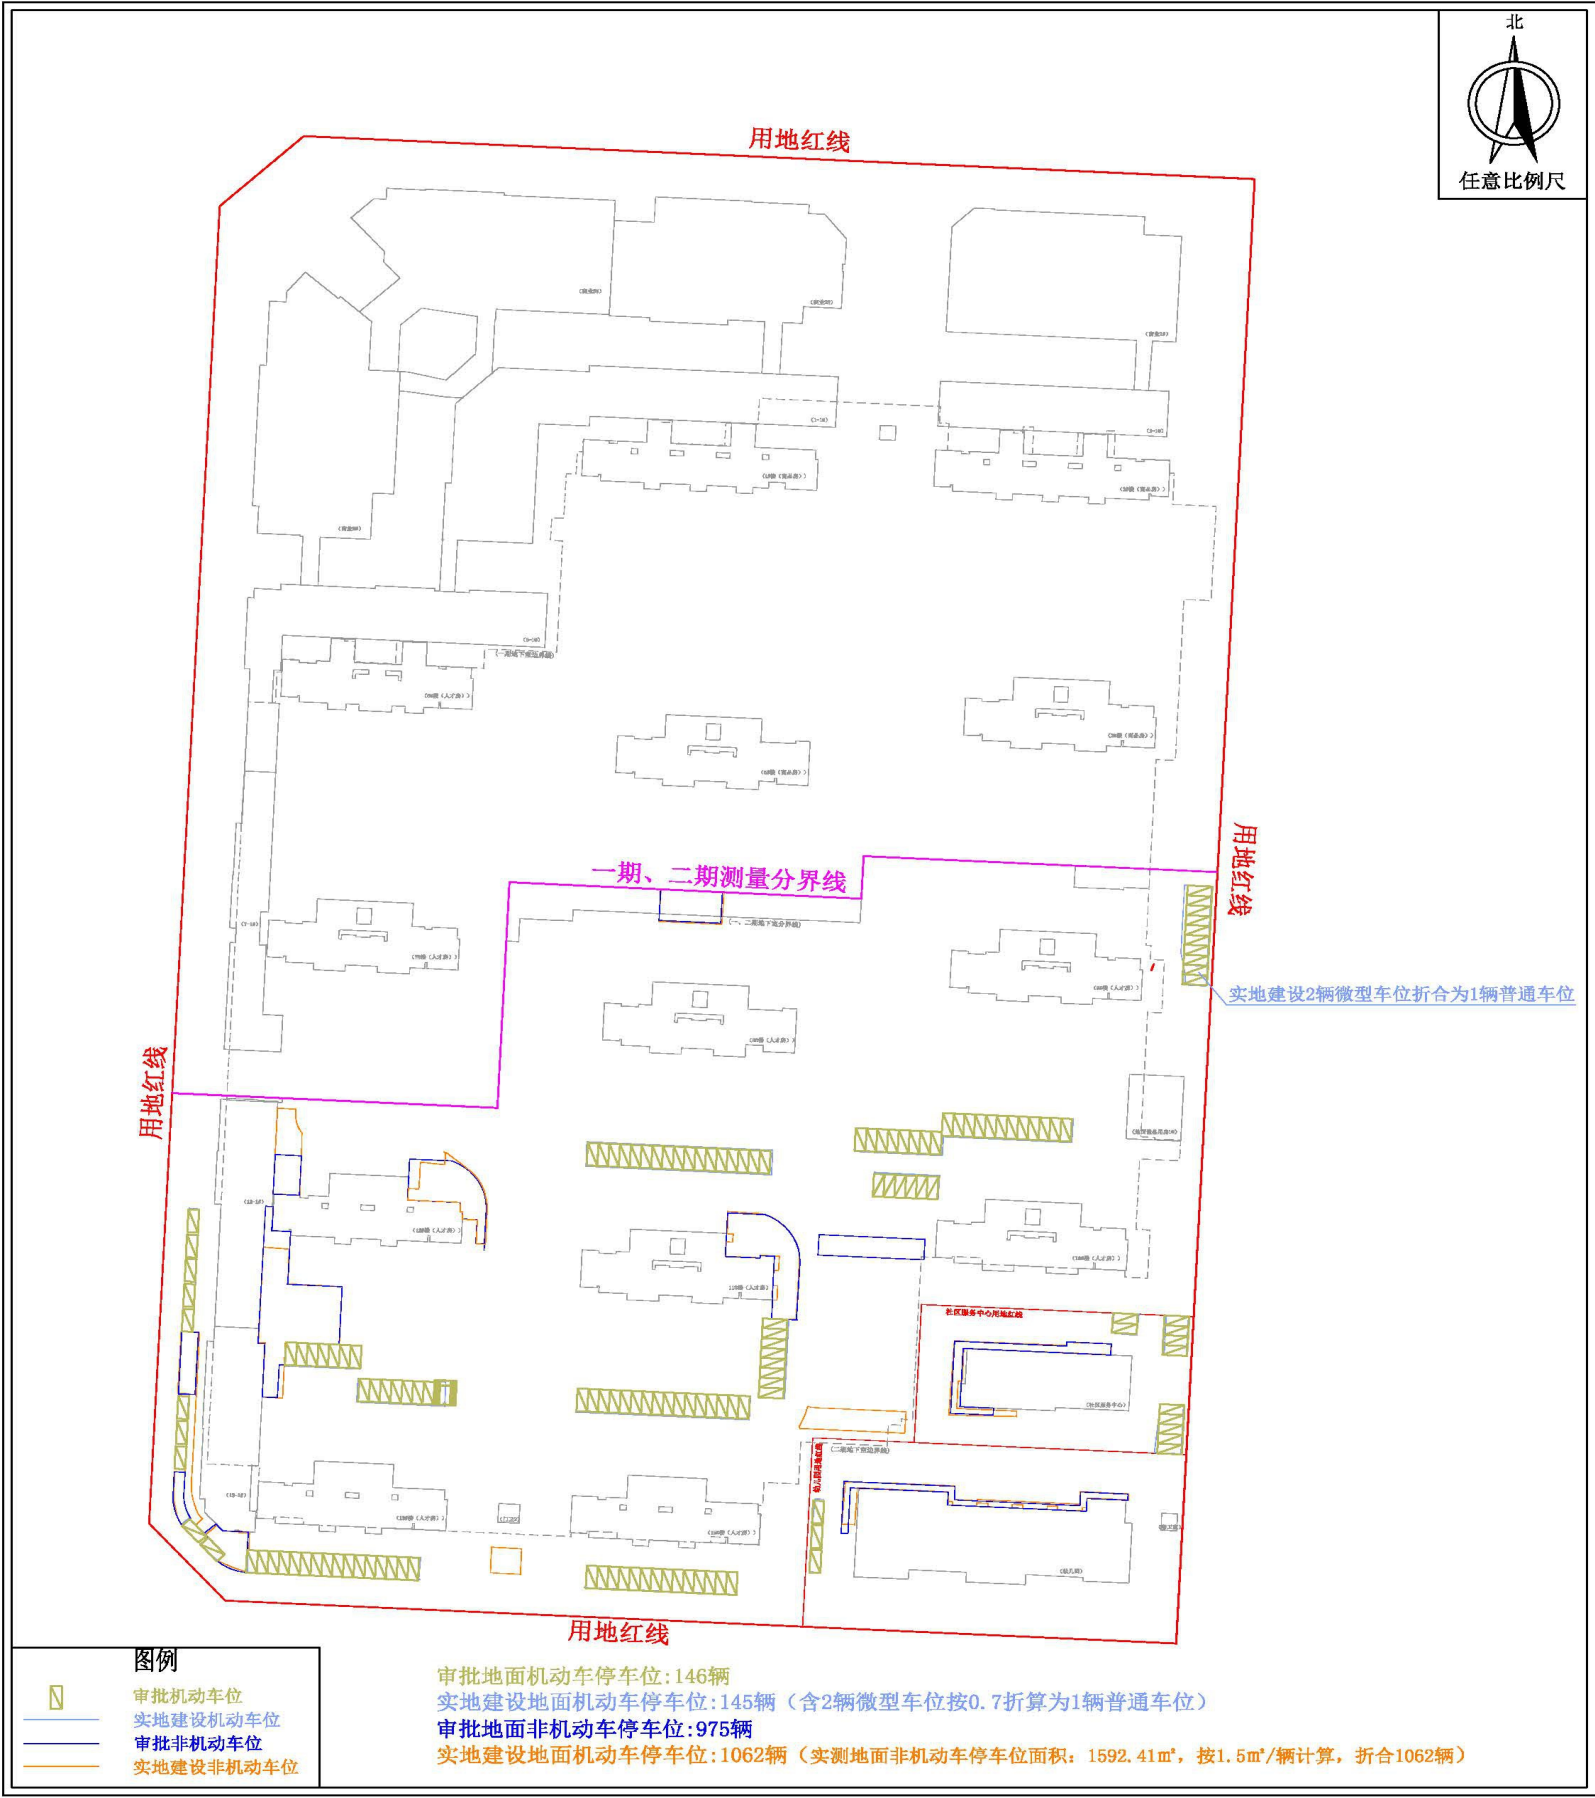


调整原因：图中两辆微型车位因消防道路转弯半径过小，为保证消防主路畅通，而缩小两辆停车位长度，地面非机动车停车位一、二期统筹整体考虑，进行了调整，一、二期地面非机动车停车位数量及面积满足设计规划要求，但不影响项目整体规划。

一期二期（汇总）车位建设情况

审核内容	审批情况 (一期二期(汇总))	实际建设情况 (一期二期(汇总))	备注
地面机动车停车位合计	192 辆	191 辆	含 2 辆微型车位按 0.7 折算为 1 辆普通车位
地面非机动车停车位合计	2457 辆	2516 辆 (面积 3774.51 m²)	实测地面非机动车位面积按 1.5 m²/辆折算

金顺新光明城地面车位实地建设与审批不一致对比

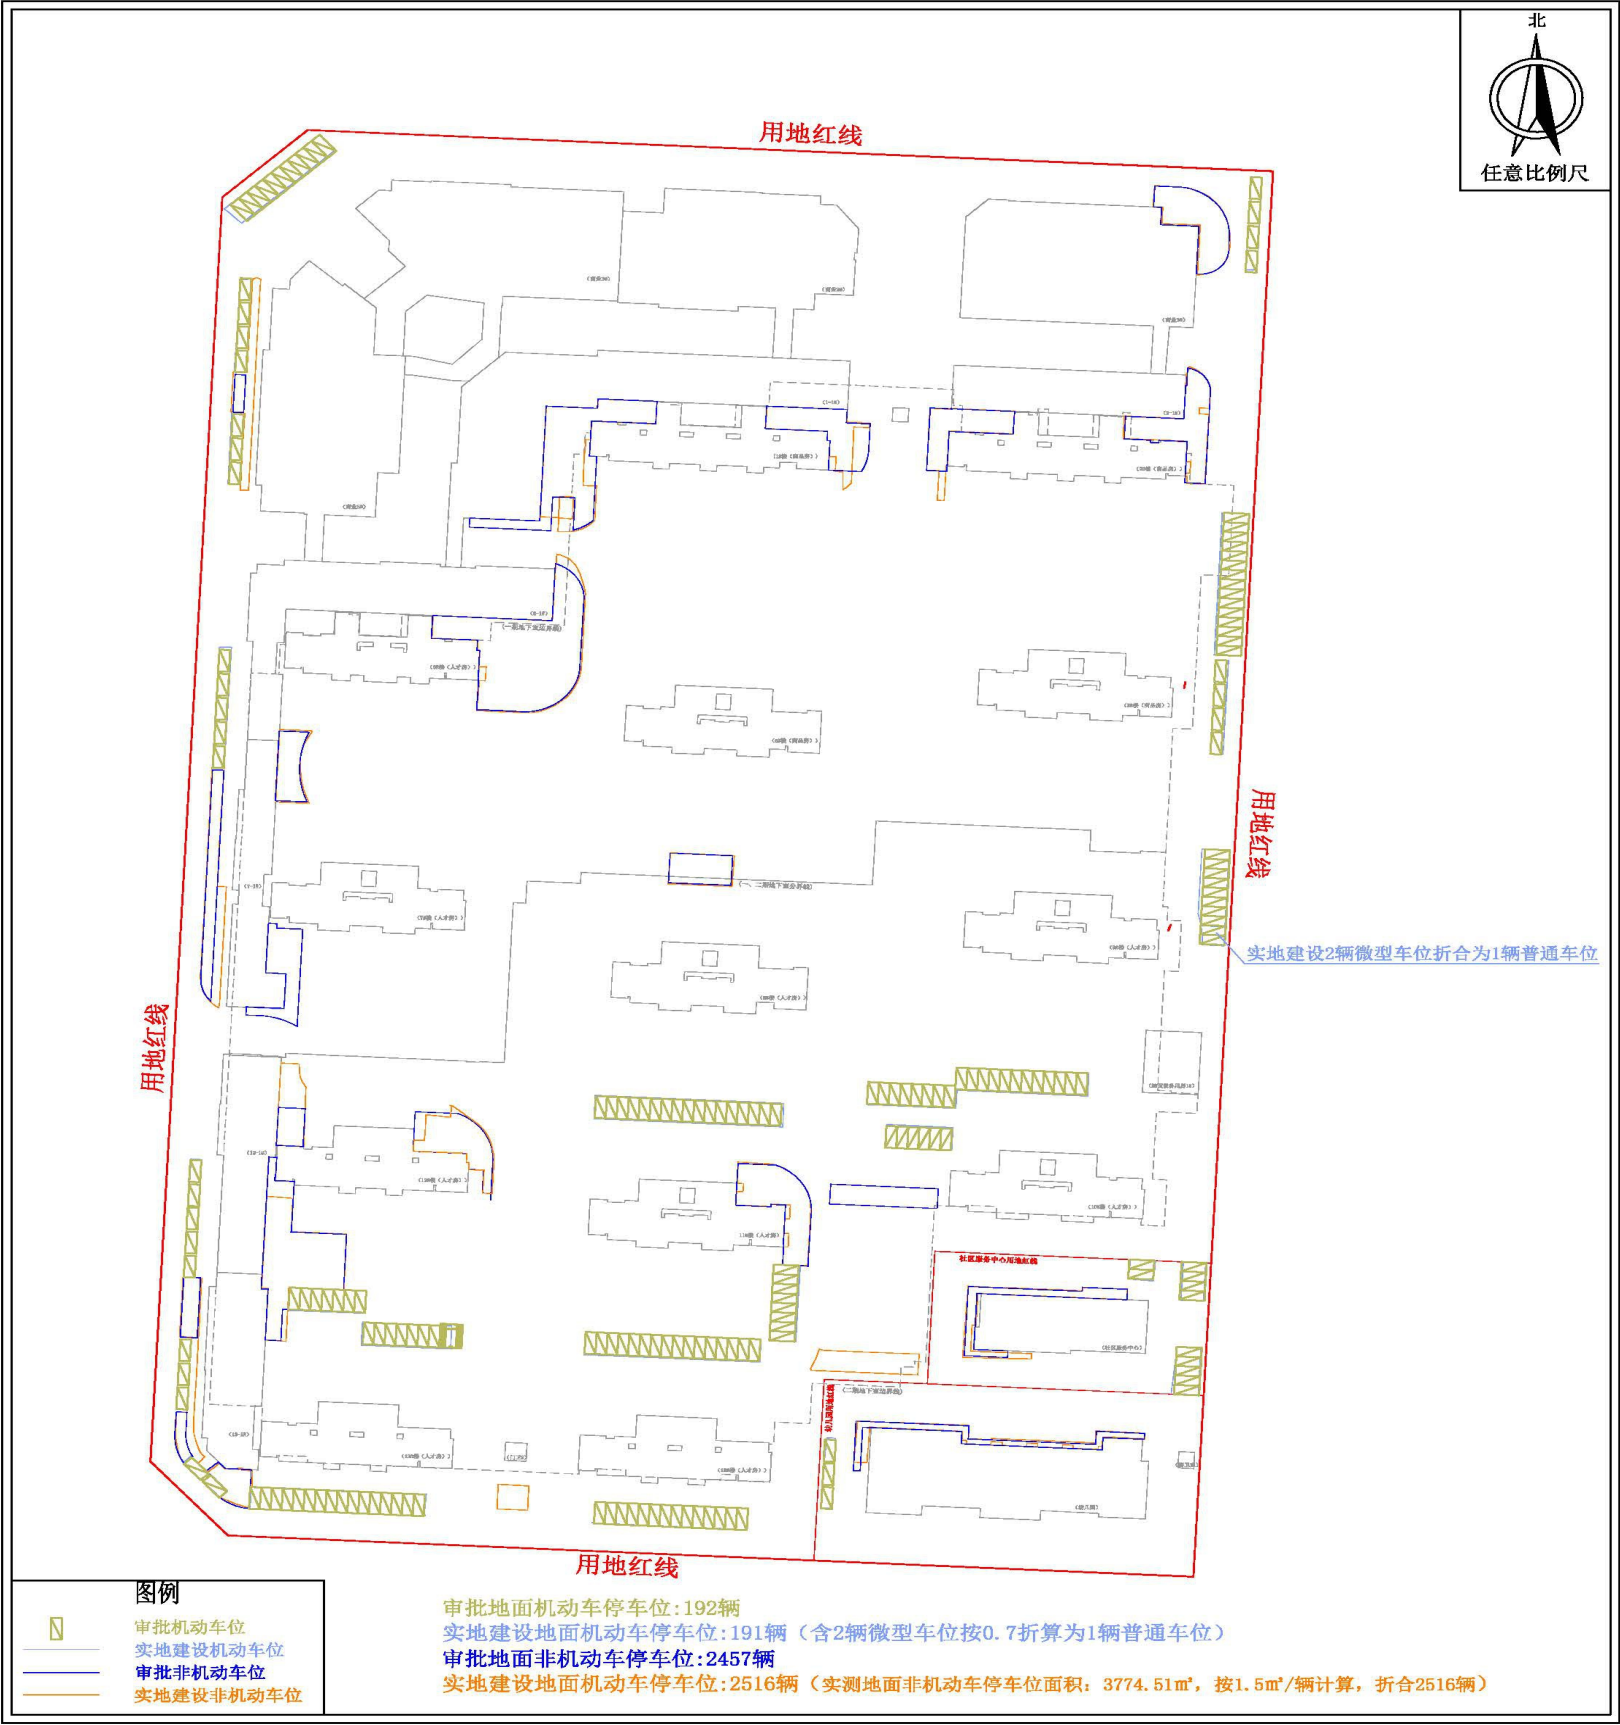

调整原因：地面非机动车停车位一、二期统筹整体考虑，进行了调整，一、二期地面非机动车停车位数量及面积满足设计规划要求，但不影响项目整体规划。


三、绿地建设情况

审核内容	审批情况	实际建设情况	备注
绿地面积	14733.22 m ² (二期审批总平面图图面测算)	14643.17 m ² (二期)	部分绿地建设位置实地与审批不一致
	28551 m ² (一期二期(汇总)审批总平面图指标)	28560.81 m ² (一期二期(汇总))	

金顺新光明城（二期）绿地实地建设与审批不一致对比



金顺新光明城绿地实地建设与审批不一致对比

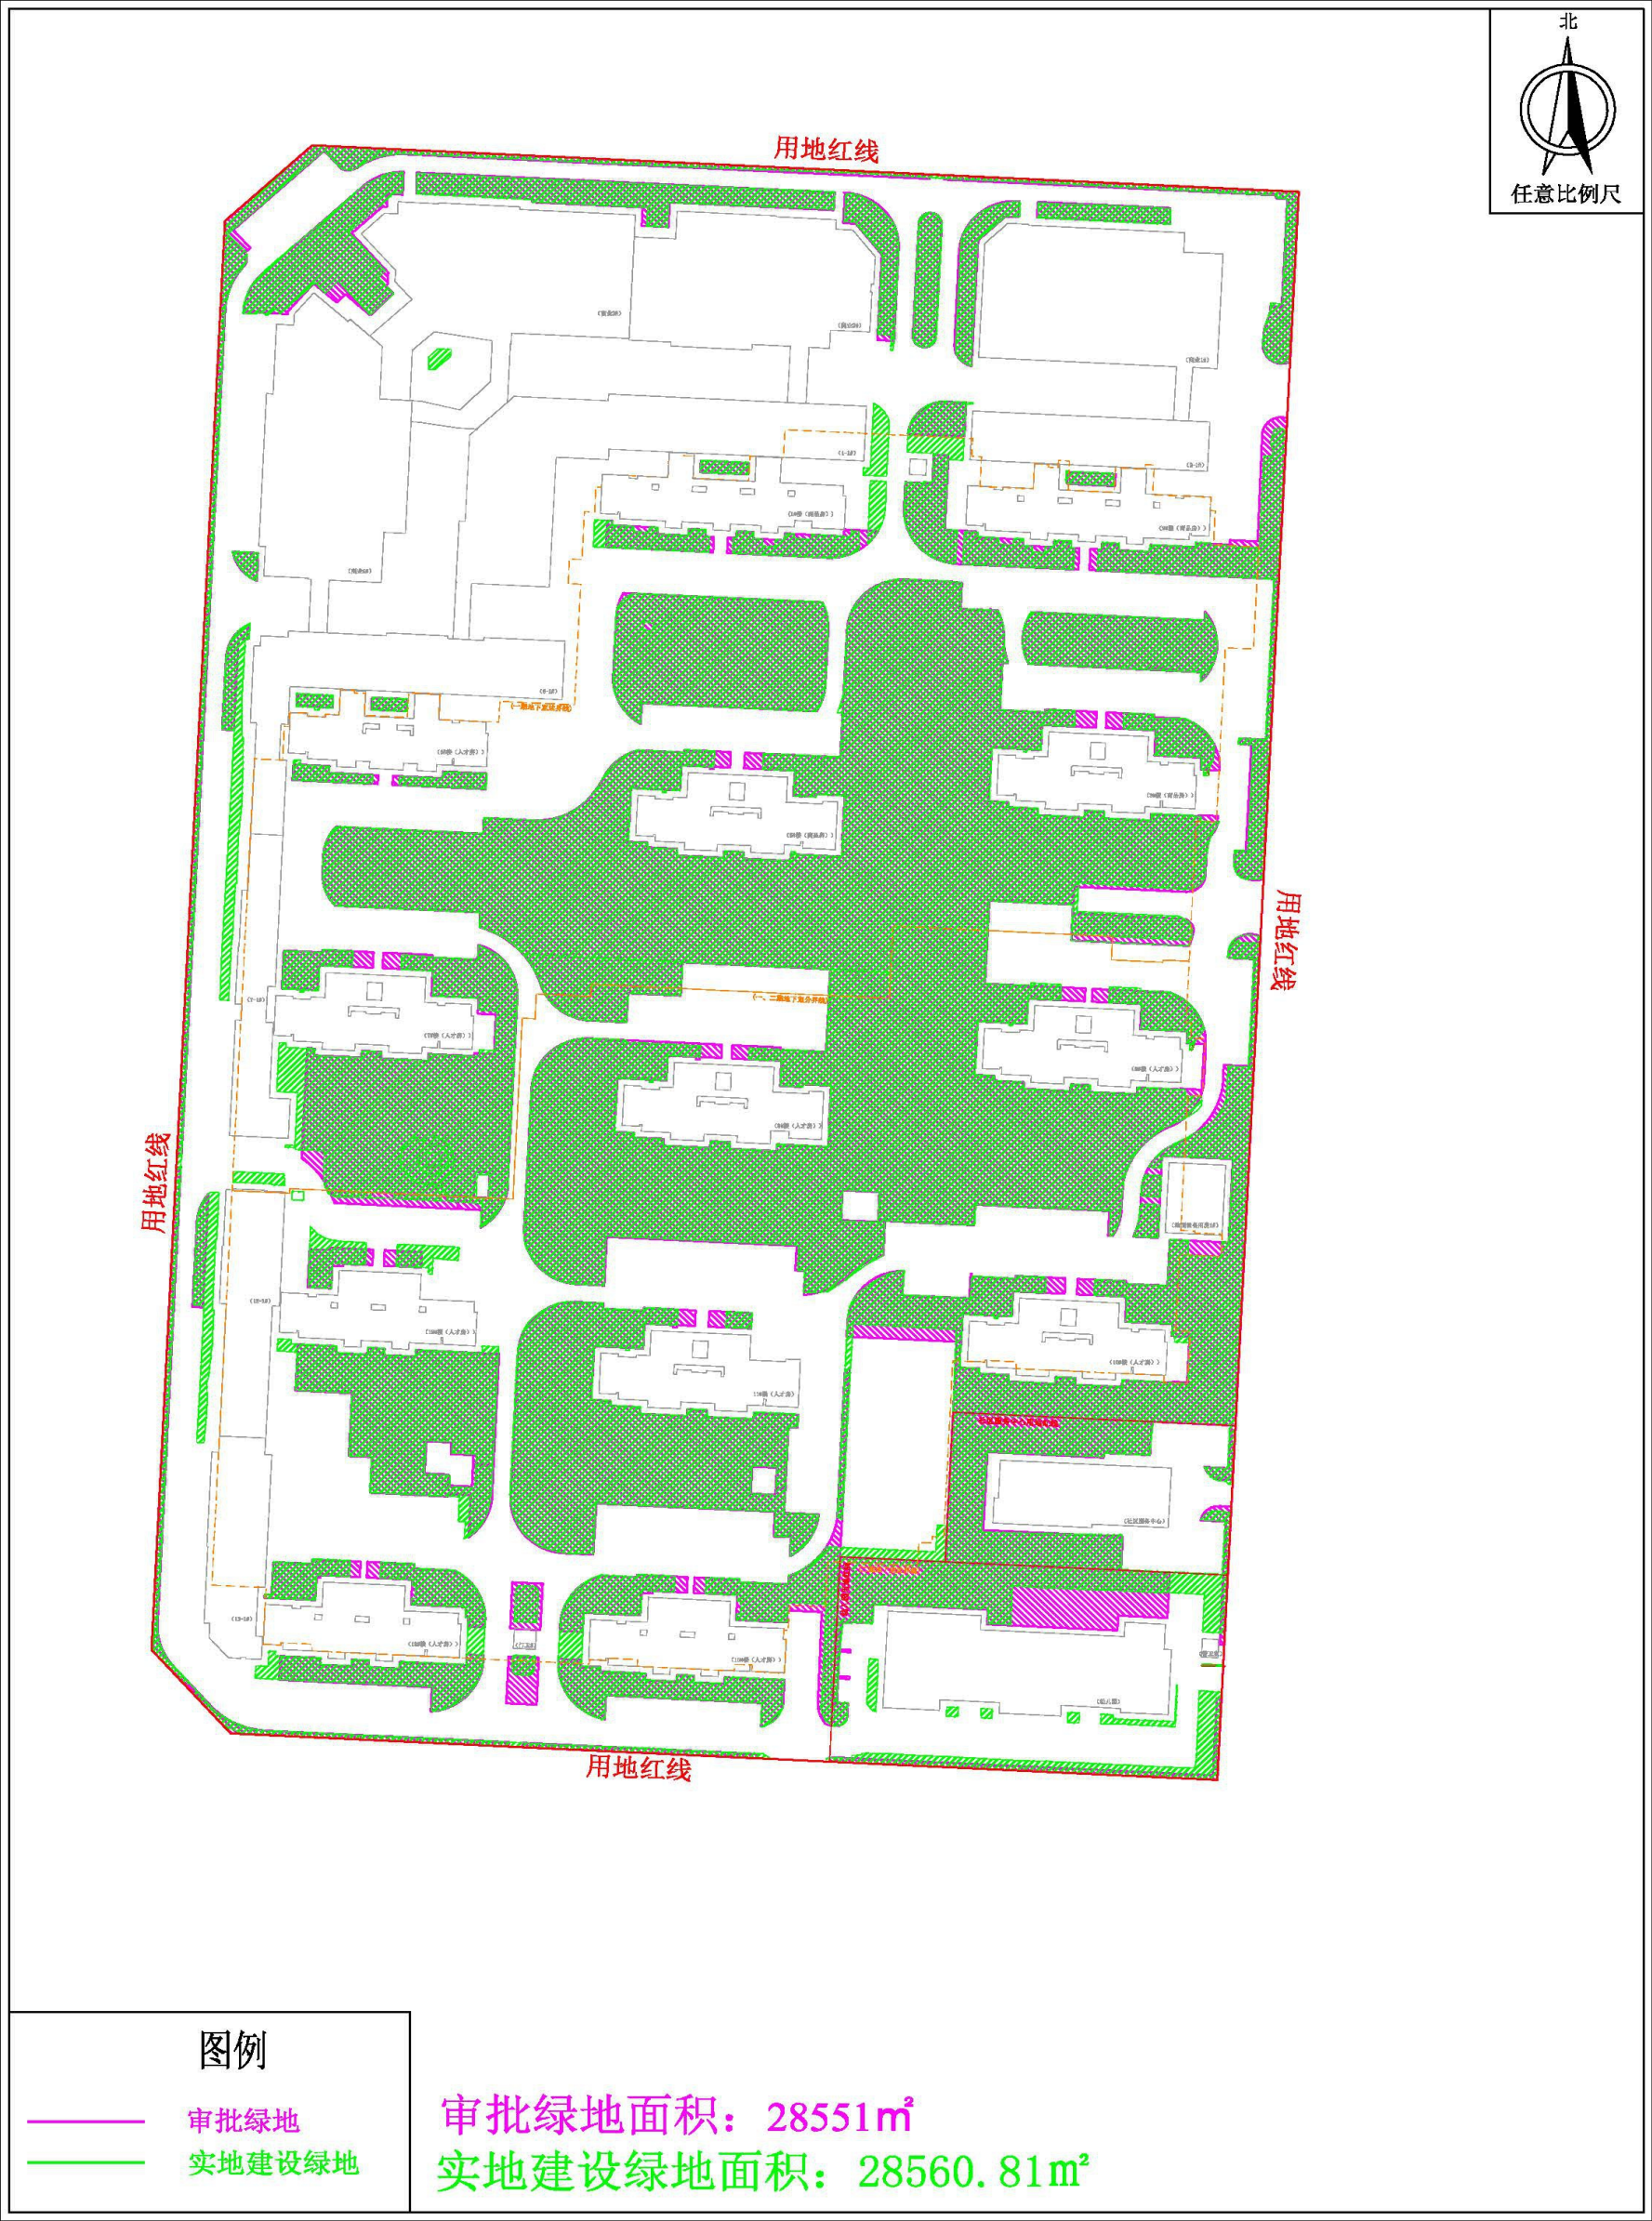


调整理由：因一、二期景观绿化经过专业深化设计，进行部分调整，一、二期实地建设绿地面积满足审批绿地面积，但不影响项目整体规划。


三、活动场地建设情况

审核内容	审批情况	实际建设情况	备注
社区活动场地面积	1004 m ² (审批总平面图指标)	1004.43 m ²	部分绿地建设位置实地与审批不一致
幼儿园活动场地面积	1090 m ² (审批总平面图指标)	1137.91 m ²	

金顺新光明城活动场地实地建设与审批不一致对比

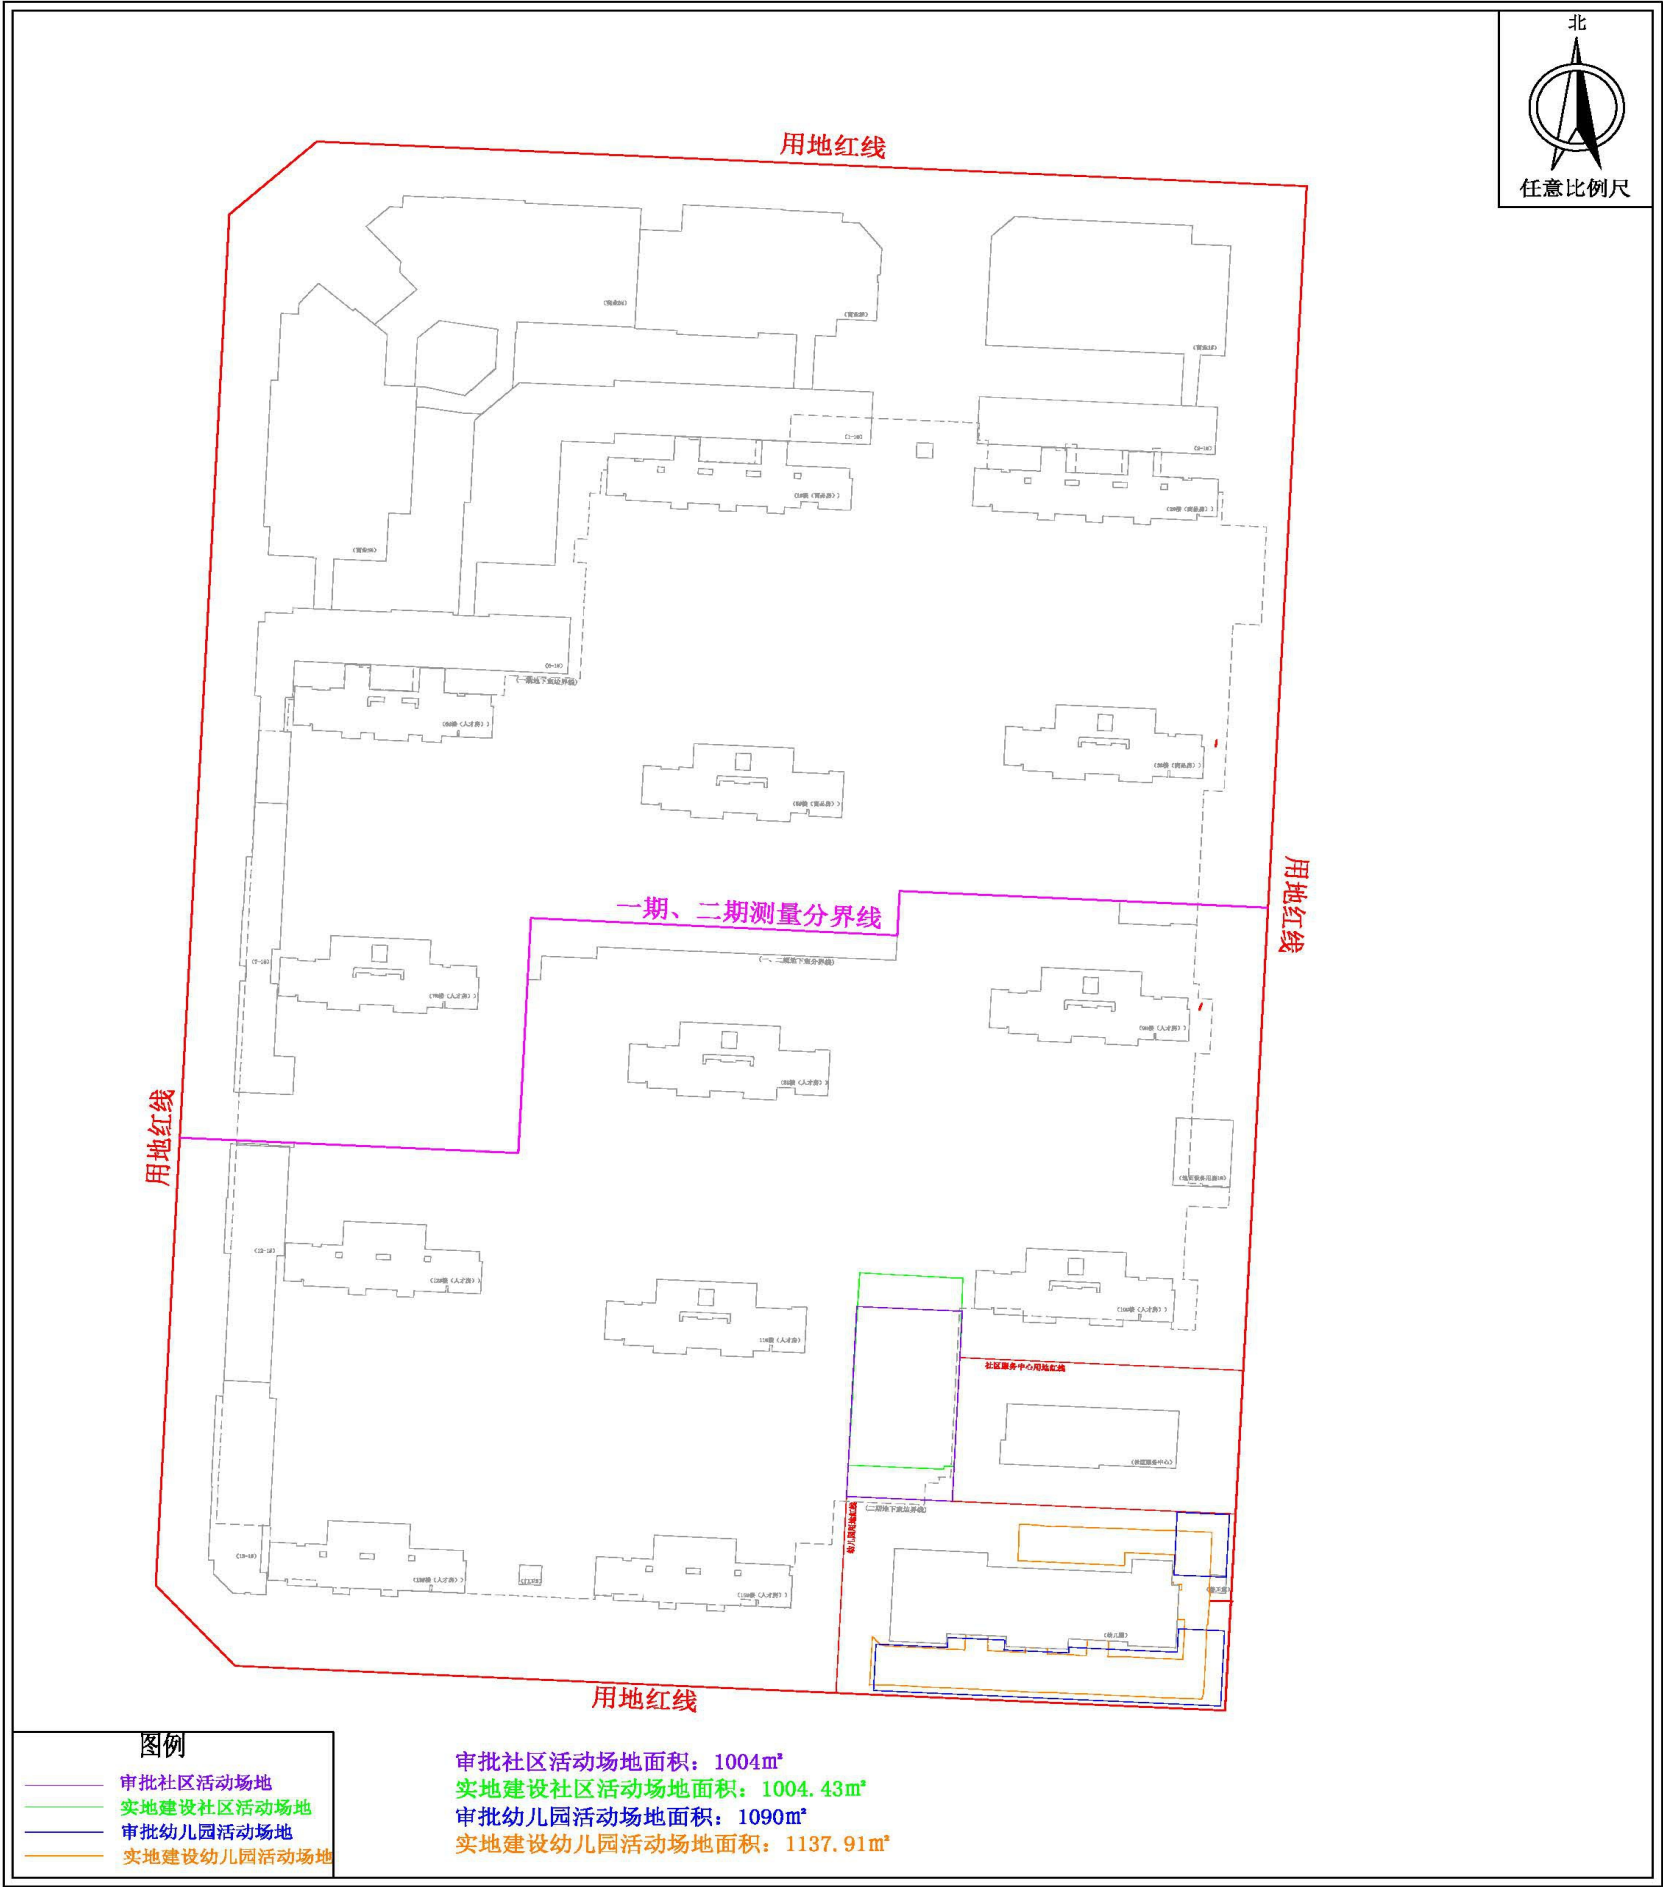

金顺新光明城幼儿园活动场地日照分析详图

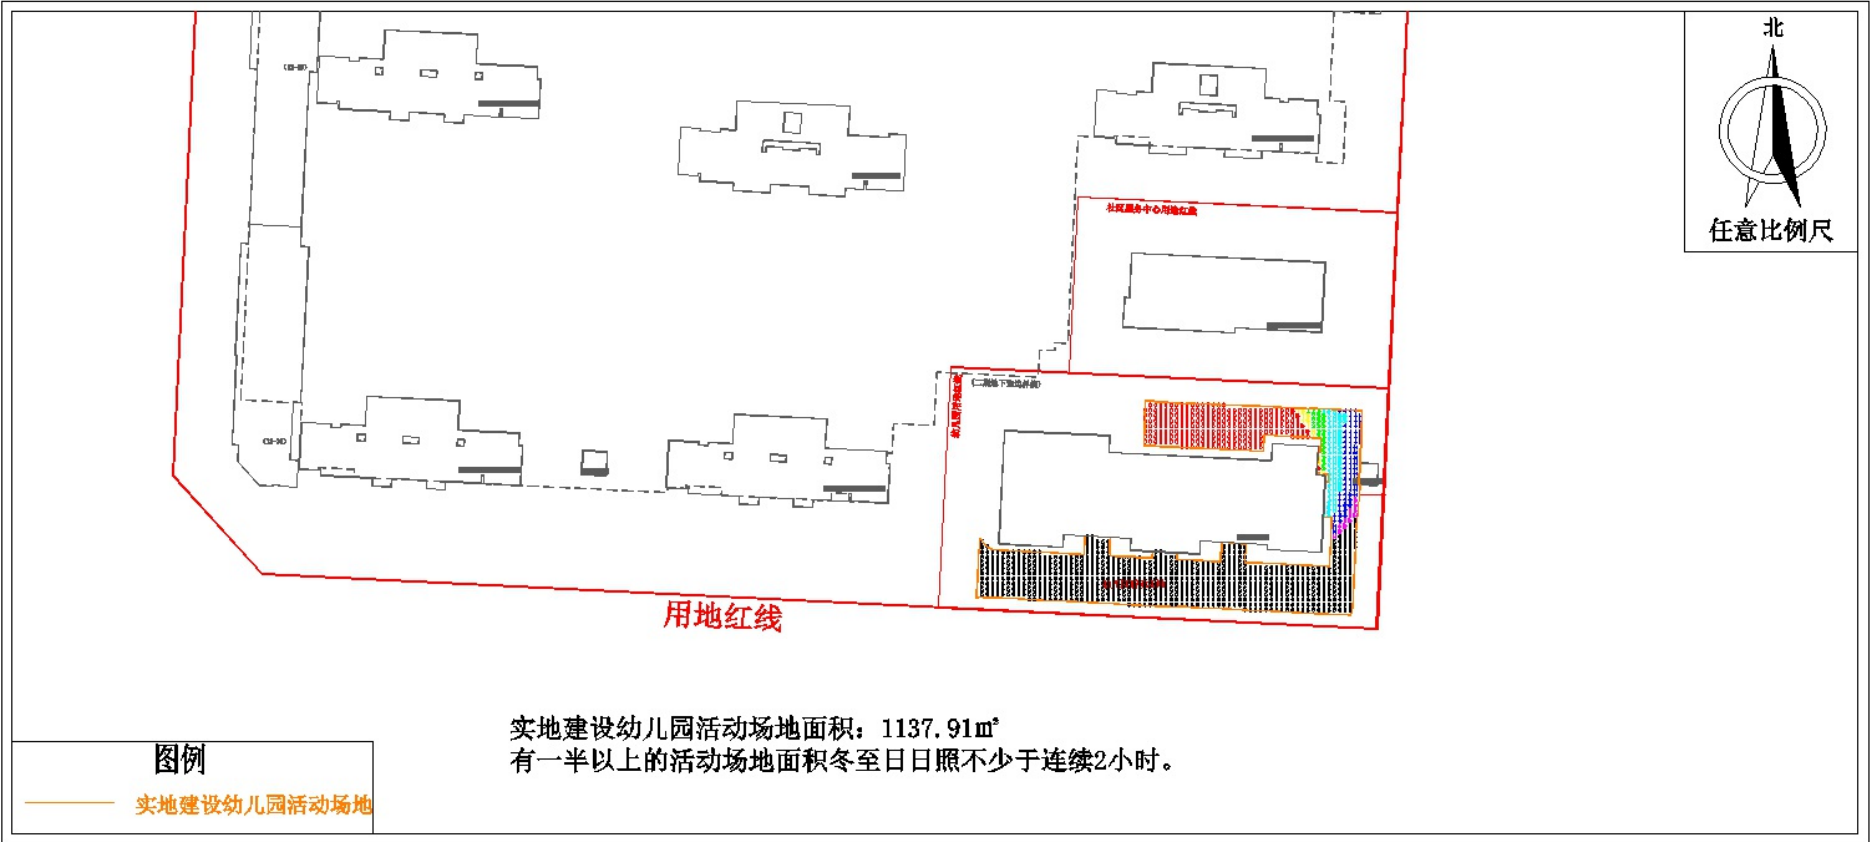

调整原因：因景观绿化经过专业深化设计，进行部分调整，实地建设活动场地满足审批活动场地面积，但不影响项目整体规划。

