

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 平潭中湖小学—教学综合楼、阶梯教室、 文体馆、南大门及围墙、主席台 竣工规划条件核实公示

平潭中湖小学项目位于平潭综合实验区岚城乡中湖村，规划总用地面积 37416.79 平方米（总平面图）。本期申请验收平潭中湖小学-教学综合楼、阶梯教室、文体馆、南大门及围墙、主席台项目，我局于 2020 年 2 月 12 日核发建设工程规划许可证，编号：建字第 350128202000007 号，本期总建筑面积 14215.64 平方米（计入容积率面积 10534.34 平方米，不计入容积率面积 3681.30 平方米），建筑占地面积 3806.30 平方米。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目范围内实地存在南大门及围墙未建设、文体馆内部墙体偏移和室内地坪高度，机动车位、非机动车位，绿化面积和范围等与原审批不一致等问题（详见附件）。针对本期不一致的情况，建设单位承诺在平潭中湖小学项目后续分期统筹补齐，以满足审批的规划条件要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区

党工委、管委会网站 <http://www.pingtan.gov.cn>) 进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 5 月 16 日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图
2. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 7 号楼 7 层。
3. 联系人：方工，联系方式：0591-23163343，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

附件：关于平潭中湖小学-教学综合楼、阶梯教室、文体馆、南大门及围墙、主席台项目实际建设与规划不一致对比分析

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025 年 4 月 30 日



附件

关于平潭中湖小学-教学综合楼、阶梯教室、 文体馆、南大门及围墙、主席台项目 实际建设与规划不一致对比分析


一、建筑面积对比分析

1、原审批南大门及围墙实地未建设


说明：

根据《平潭综合实验区社会事业局关于调整平潭中湖小学项目删除南大门及围墙单位工程划分的函》(岚社会建函[2022] 20号), 因征地赔偿问题未能达成协议, 暂无法完成征地, 取消南大门及围墙单位工程, 故实地未建设。

南大门及围墙审批文本总平面图:

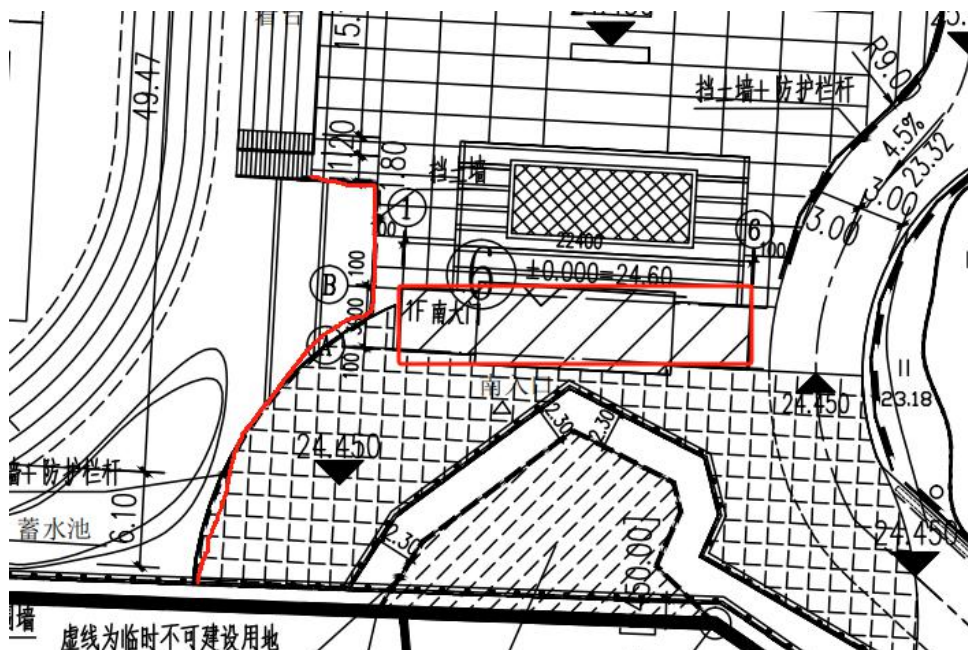

南大门及围墙实地建设总平面图纸:

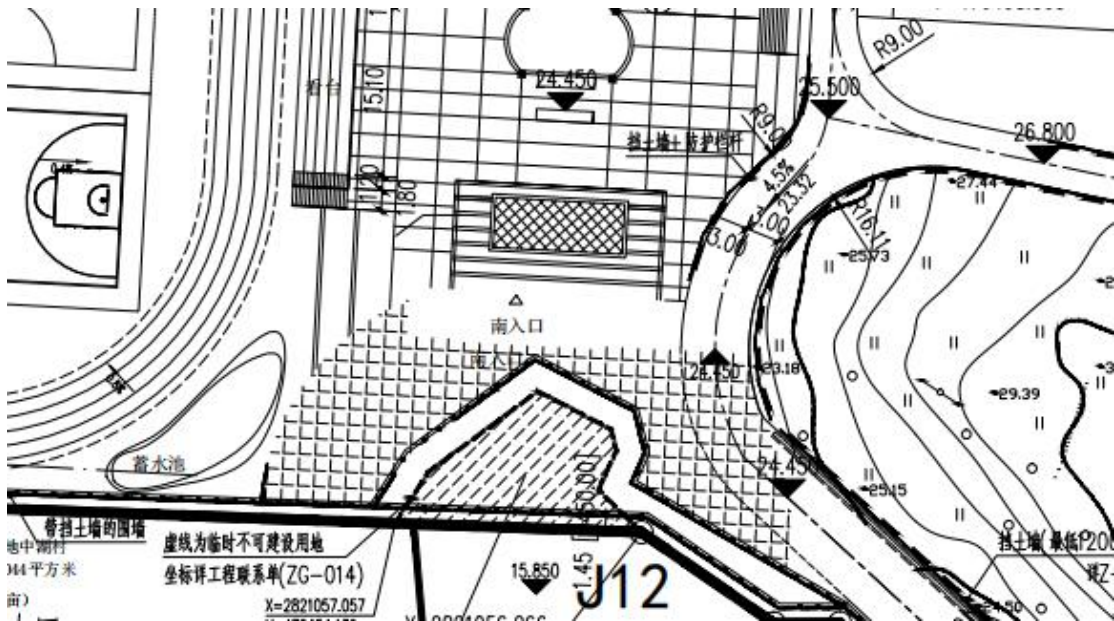


2、文体馆地下室 5 轴至 5-1 轴交 F 轴北侧墙体向北偏移 0.35 米，导致车库建筑面积增加 1.14 平方米，设备用房建筑面积减少 1.14 平方米，总计容、建筑面积不变。

说明:

文体馆地下室 5 轴至 5-1 轴交 F 轴北侧墙体因施工单位施工错误导致向北偏移 0.35 米，导致车库建筑面积增加 1.14 平方米，设备用房建筑面积减少 1.14 平方米，但总计容、建筑面积未变，不影响规划指标。

审批文本文体馆与实地建设文体馆轮廓线对比:

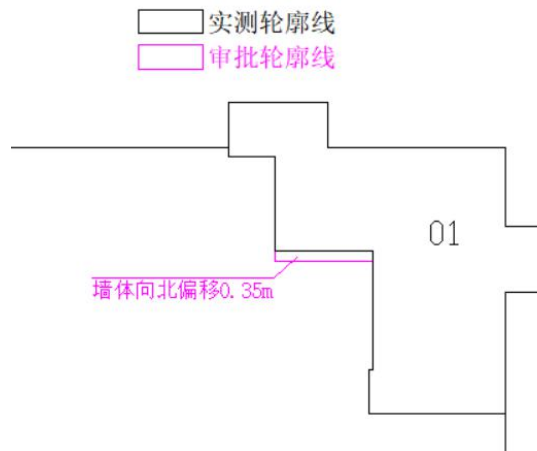

实地建设文体馆及地下室图纸：



二、测量范围内车位建设情况（分期建设）

机动车位：

审批机动车停车位 49 辆（方案总平面图），（其中地面机动车位 16 辆，地下机动车位 33 辆）；

审批机动车停车位 61 辆（审批施工图），（其中地面机动车位 16 辆，地下机动车位 45 辆（含 5 辆普通充电停车位，1


辆快速充电停车位))；

实测机动车停车位 45 辆（其中文体馆地下室地下机动车位 45 辆，（含 5 辆普通充电停车位，1 辆快速充电停车位，充电桩实地未安装））。

说明：

根据《平潭综合实验区社会事业局关于调整平潭中湖小学项目删除南大门及围墙单位工程划分的函》（岚社会建函〔2022〕20 号），因征地原因南大门前面道路无法到达，地面机动车位 16 辆暂时无法设立，将于后续分期统筹设置补齐剩余 16 个车位。本期文体馆地下室的 5 辆充电车位及 1 辆快速充电车位的充电桩将于后期统筹安装。

审批文本总平面图机动车：

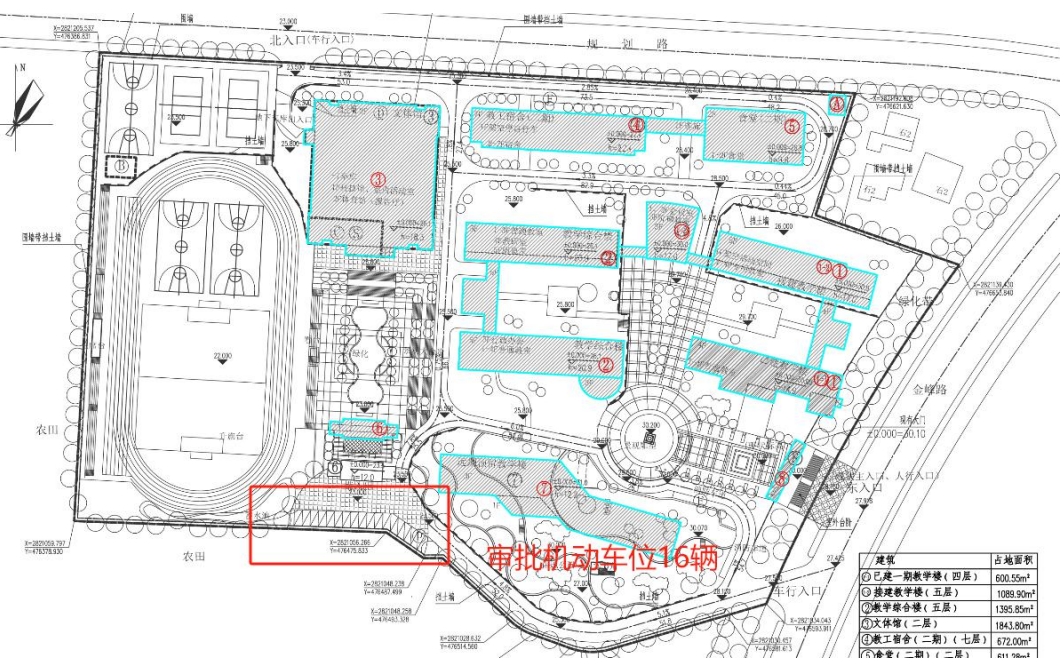

非机动车位：


审批非机动车停车位 540 辆（总平面图），分期测量范围内无审批非机动车位；

实测非机动车停车位 57 辆（其中地面非机动车停车位 57 辆）。


说明：

审批非机动车停车位 540 辆（总平面图）位于二期范围，因二期还未建，现考虑一期实际需要，实际新增非机动车停车位 57 辆，剩余未建设非机动车位 483 个，将于后续分期统筹补齐建设。

审批文本总平图非机动车：

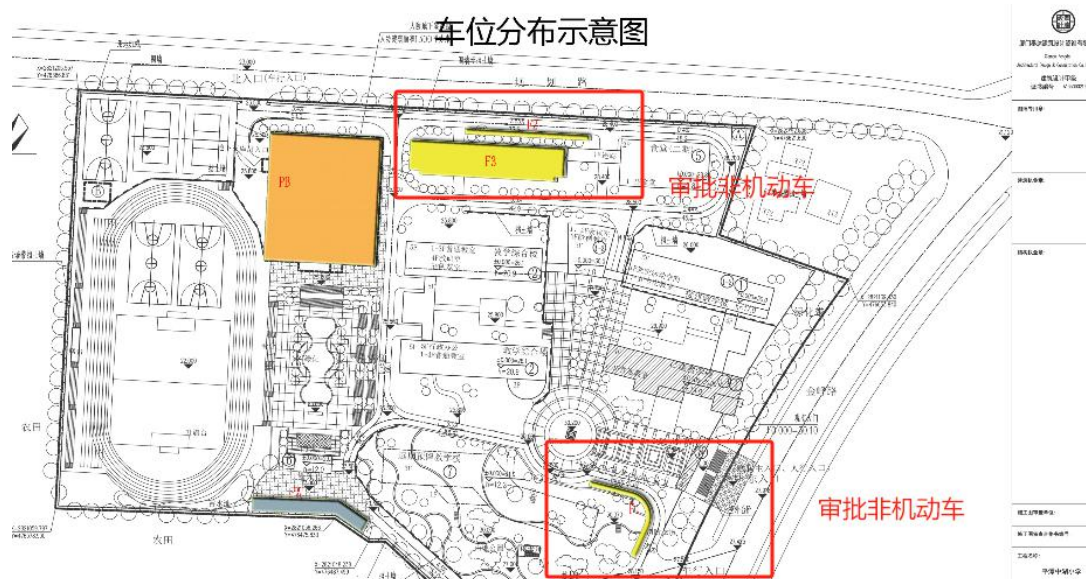

实地建设非机动车总平面图纸：

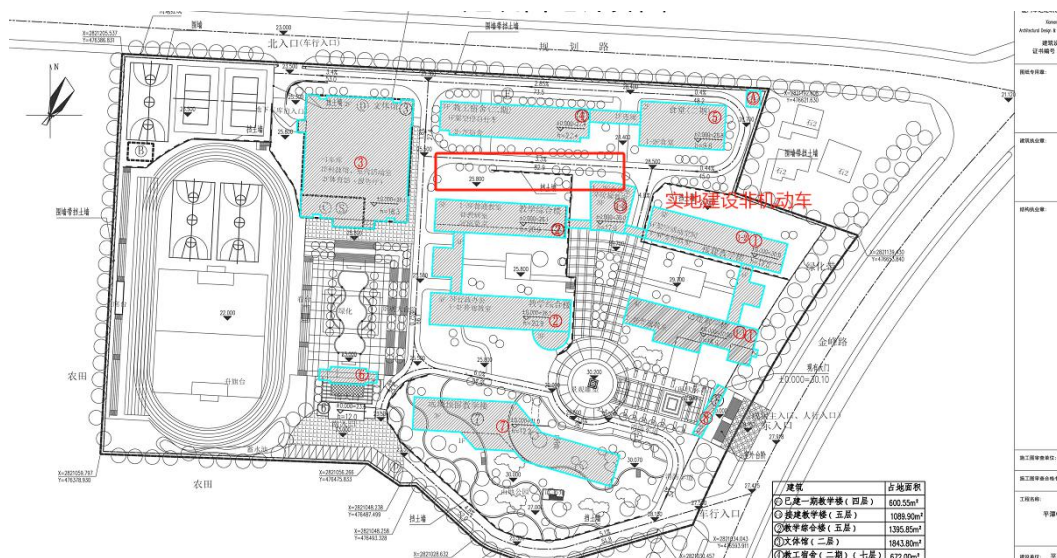

三、绿地建设情况（分期建设）

1、部分绿地轮廓与审批不一致，审批绿地面积 11078.88 平方米（根据总用地面积*绿地率折算），本期测量范围内测算审批绿地面积为 4555.85 平方米，本期测量范围内实测绿地面积 4274.71 平方米。

说明：


1、因拆迁原因，南大门取消，围墙及围墙外绿化无法按审批图纸施工到位，实地部分场地进行方案调整，围墙外部分绿地面积减少。

2、因文体馆北侧北入口未施工、南大门取消等原因，结合实地场地提升实地景观面，对内部道路进行优化调整。

3、原审批图纸审批较早，结合学校建筑功能及学生通行实际需求对部分绿地进行优化合理硬化处理。


以上 1-3 项原因导致本期测量范围内绿化面积比原审批减少 281.14 平方米；减少的绿地面积将于二期补足，已规划二期预留补充绿化面积约 285 平方米（详见实测绿地及二期预留绿

地分布图)。
审批文本绿地图纸：

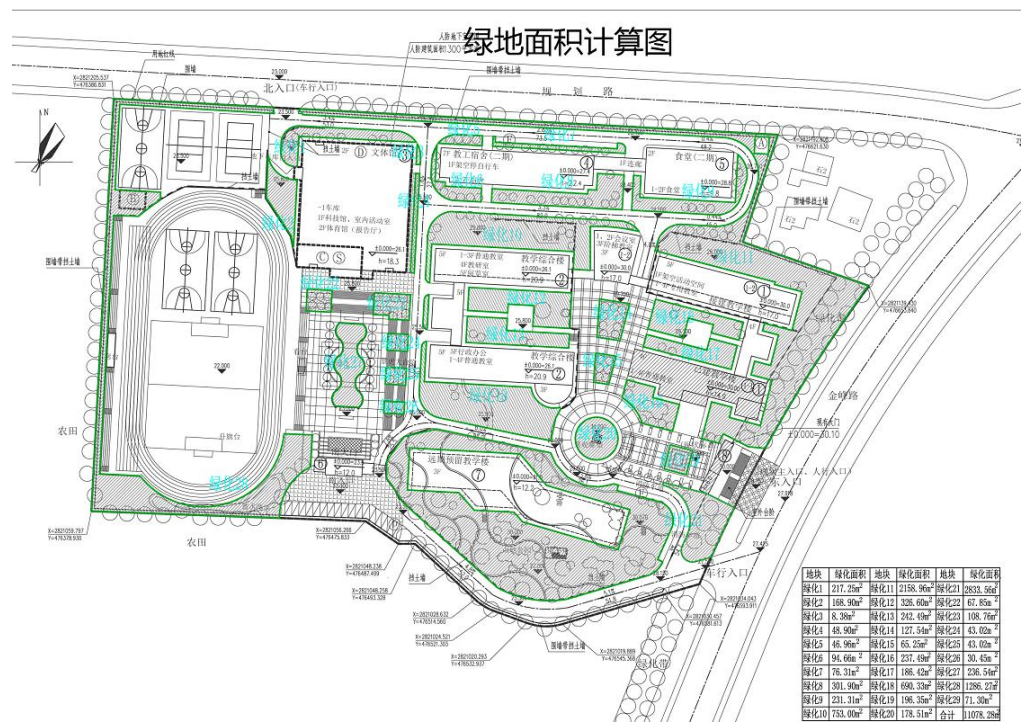

实测绿地及二期预留绿地分布图：

实测绿地及二期预留绿地分布图

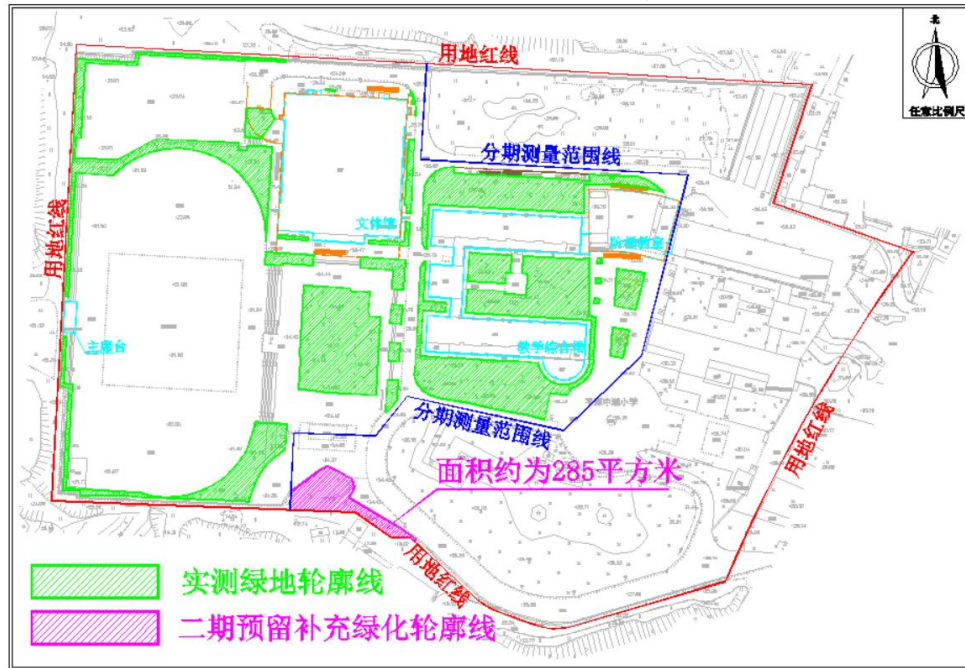

四、其他

1、文体馆（原审批 ± 0 （室内地坪）高程为 26.10 米（黄海高程）=26.07 米（1985 国家高程），实测室内 ± 0 高程为：25.82 米（高程：1985 国家高程基准）。

说明：

施工过程中根据现场实际需求，将文体馆室内+0 高程变更为 25.8 米，详总平面及桩基图纸，实测室内+0 高程为 25.82 米，现场施工与设计误差 0.02m，误差 0.02m 对建筑单体及总平面未造成不利影响。

人工挖孔桩设计说明

本工程本建筑基础设计为乙级， ± 0.00 相当于绝对高程 文体馆:25.800m;教学综合楼:26.100m;阶梯教室:30.000m。

本建筑基础采用人工挖孔灌注桩，施工前应作好桩基施工组织设计，严格按照《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第6章

C. 钢材: HPB300(Φ); HRB400(Φ).

3. 本图采用相对标高, ± 0.000 相当黄海高程 25.800m。(与建筑图纸核对无误后方可施工)

4. 未注明的独立基础、承台、底板上皮标高均为 -5.080, 未注明的底板厚度均为 350mm, 配筋均

外板厚 650mm 配筋双层双向 $\Phi 20 @ 180$ 不足处附加

2、原审批文体馆北侧北入口（车行路口）实地未建设

说明:

因文体馆北侧北入口外面车行路未施工, 暂时无法设北侧北入口（车行路口）, 后续分期待路面施工后再行建设。

审批文本文体馆北侧入口:

