

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于万吨冷链产业园（变更）项目 竣工规划条件核实公示

万吨冷链产业园（变更）项目位于翠园北路西侧，楼仔路南侧，我局于2021年5月27日核发项目建设工程规划许可证（编号：建字第350128202100019号）。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目实地配建绿地面积及位置，机动车泊位位置、非机动车泊位位置与原审批不一致等问题（详见附件不一致分析）。调整后，整个项目的各项指标均符合土地出让合同及相关规范、规定要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站<http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2025年3月14日至2025年3月27日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈

意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图。

2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网站公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）。

3. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。

4. 联系人：施工，联系方式：0591-23163343，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025年3月13日




附件

实地建设与规划审批不一致对比分析

1. 办公楼屋面层机房北侧墙体往南建小 0.30m，建筑及计容面积减小 2.88 m²。

说明：实际施工中机房与客梯井此处的墙上下对齐，导致该区域建筑面积略有减小。


分层图对比：

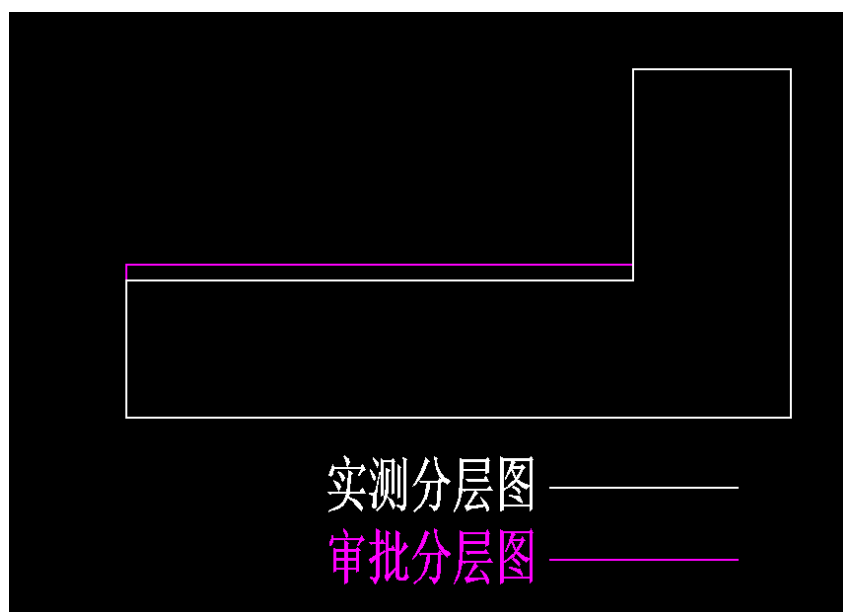



2. 1#水产品冷库一层封闭月台西南侧增建竖井，占地及建筑面积增大 1.75 m²，不计容；封闭月台东、西两侧门廊实地围合至封闭月台使用，建筑及计容面积增大 2.10 m²。

说明：设计过程中，暖通专业需设置排风井及进风井，施工过程中按需调整了封闭月台两侧门的位置。导致该区域建筑面积略有增大。



审批文本图纸：

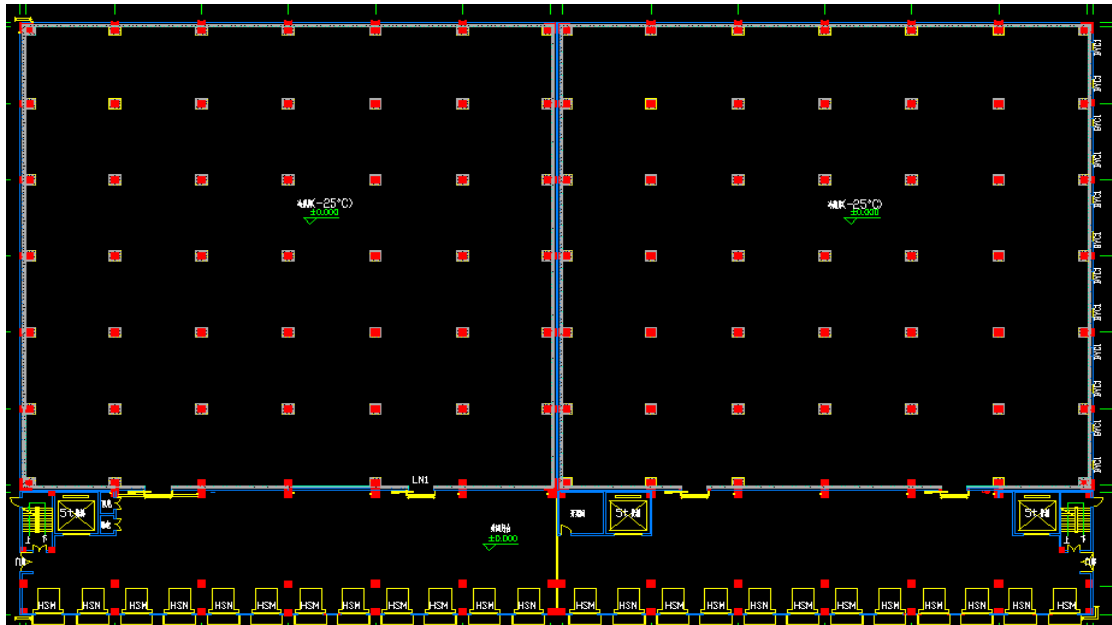

局部放大图:

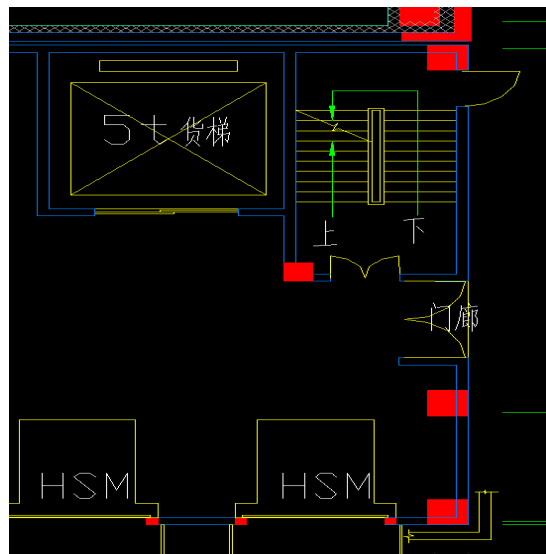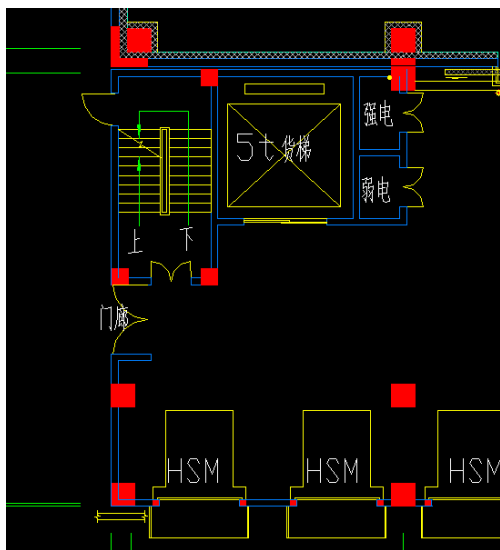

实地建设图纸:

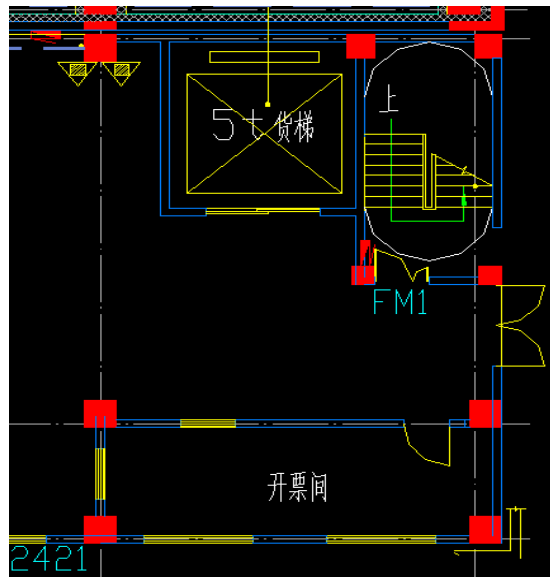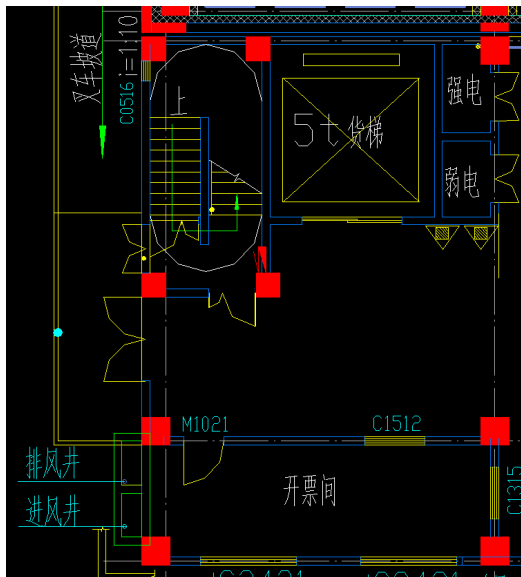


3. 1#水产品冷库二、三层穿堂东、西两侧走廊实地围合至穿堂使用，建筑及计容面积增大 4.20 m²。（图同上）

说明：施工过程中按需调整了穿堂东西两侧门的位置，导致该区域建筑面积略有增大。



4. 1#水产品冷库屋面层西侧梯间南侧墙体北移，部分梯间变为雨披，建筑及计容面积减小 3.00 m²；东侧梯间南侧结构柱未建，柱廊变为雨披，建筑及计容面积减小 3.00 m²。

说明：施工中优化了雨披的形式，梯间外轮廓变小，导致该区域建筑面积略有减小。

审批文本图纸：

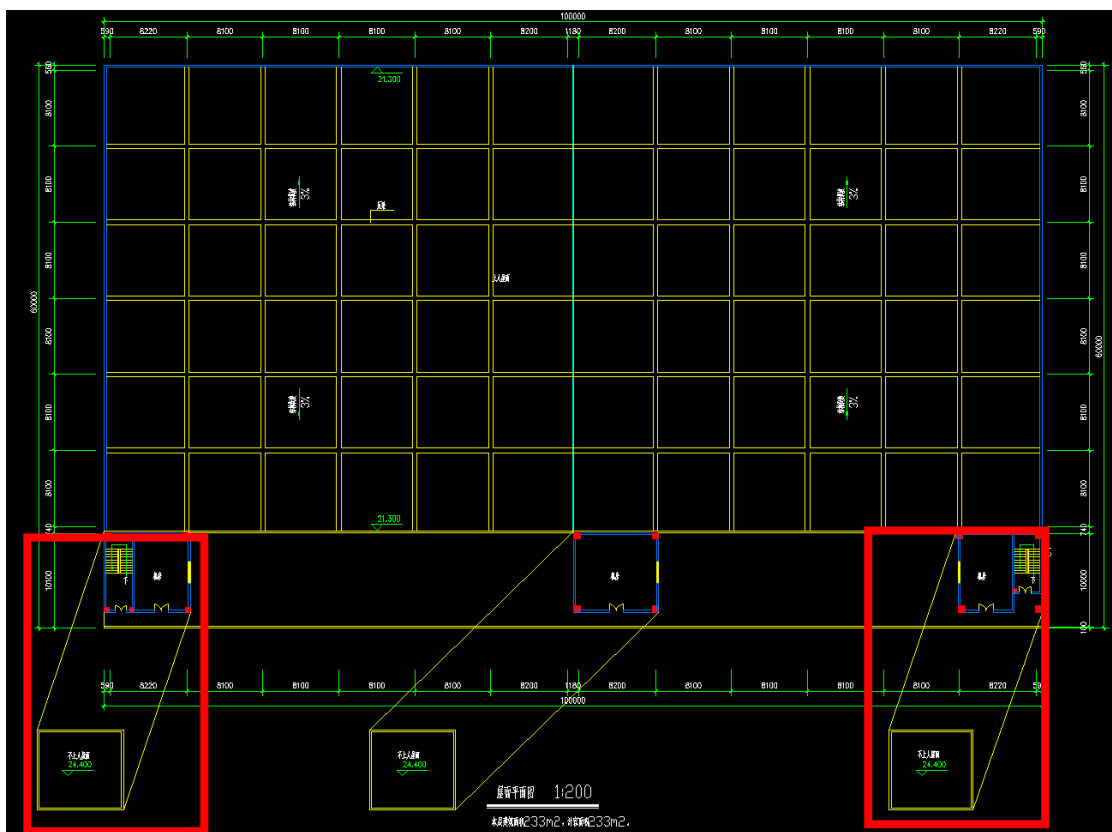

局部放大图:

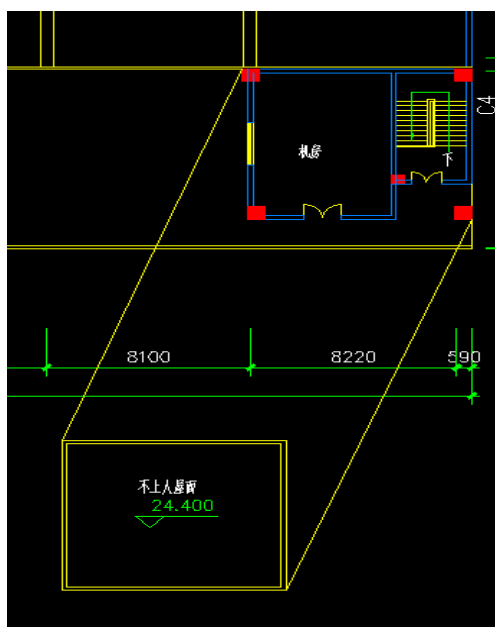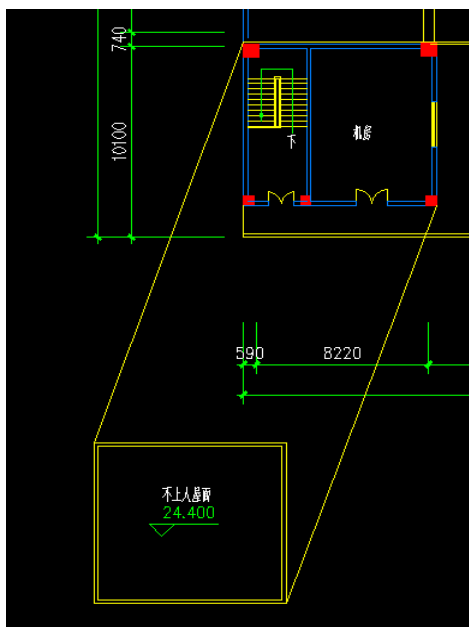


实地照片：





5.2#水产品冷库及加工车间一层封闭月台西侧门廊实地围合至封闭月台使用，建筑及计容面积增大 1.05 m^2 ；加工车间货梯出入口增建门廊，建筑及计容面积减小 1.22 m^2 。

说明：施工过程中按需调整了月台西侧门的位置，导致该区域建筑面积略有增大；优化了货梯的入口形式，导致该区域建筑面积略有减小。



审批文本图纸：

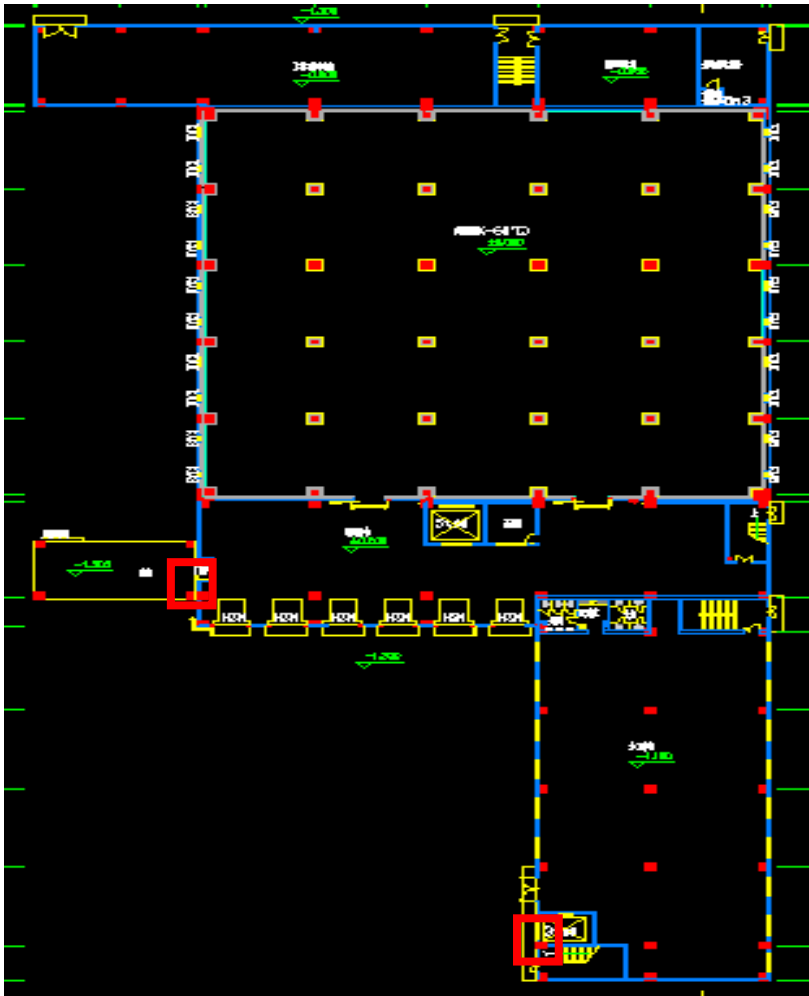

局部放大图：

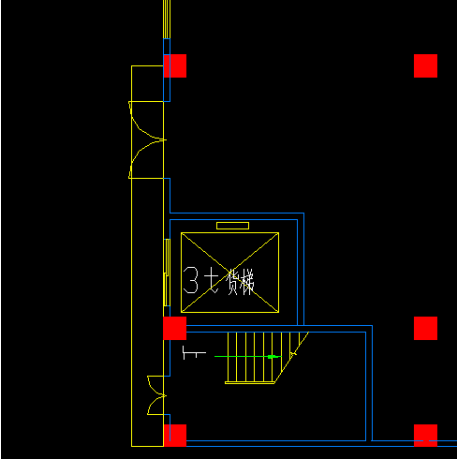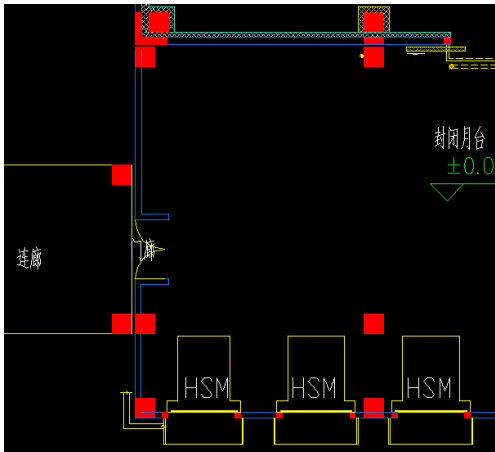

实地建设图纸：

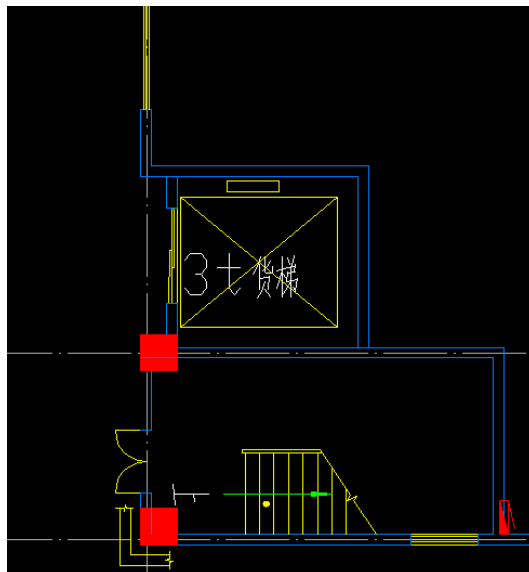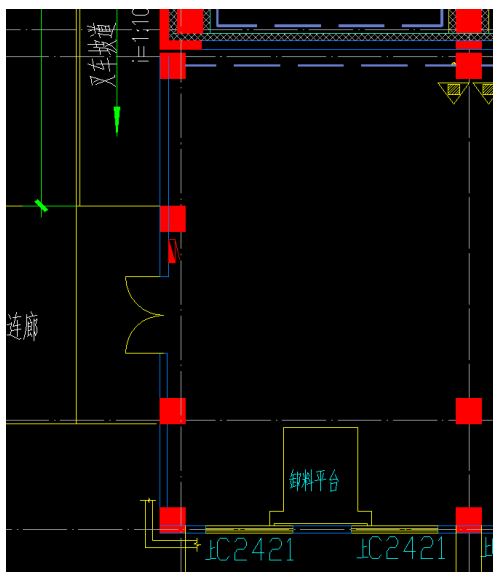

6.2#水产品冷库及加工车间制冷机房东侧梯间一、二层楼梯转台处分隔出隔间，按夹层计算，建筑及计容面积增大 25.80 m²。

说明：施工中按需设置墙体，变成夹层的形式，导致该区域建筑面积略有增大。

实地照片：




7.2#水产品冷库及加工车间二层、三层穿堂西侧走廊实地围合至穿堂使用，建筑及计容面积增大 2.10 m²。（图同问题 6）

说明：施工过程中按需调整了穿堂西侧门的位置，导致该区域建筑面积略有增大。

8.2#水产品冷库及加工车间三层机房北侧墙体南移 0.90m，建筑及计容面积减小 7.48 m²。

说明：施工过程中按需调整机房北侧墙体的位置，机房四周外轮廓变小，导致该区域建筑面积略有减小。


分层图对比：

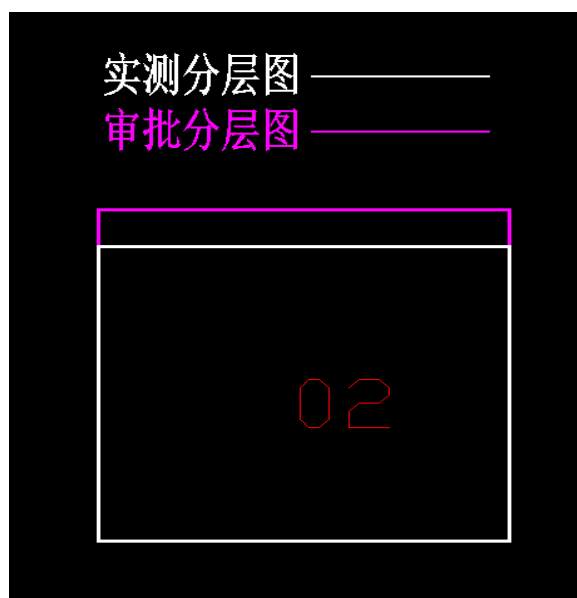



9. 水产品加工车间一层封闭月台东侧门廊实地围合至封闭月台使用，建筑及计容面积增大 1.05 m²；加工车间货梯出入口增建门廊，建筑及计容面积减小 1.24 m²。

说明：施工过程中按需调整了月台东侧门的位置，导致该区域建筑面积略有增大；优化了货梯的入口形式，导致该区域建筑面积略有减小。


审批文本图纸：

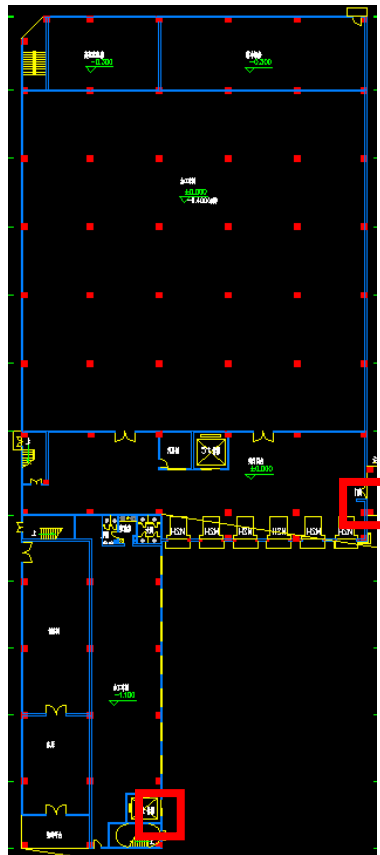

局部放大图:

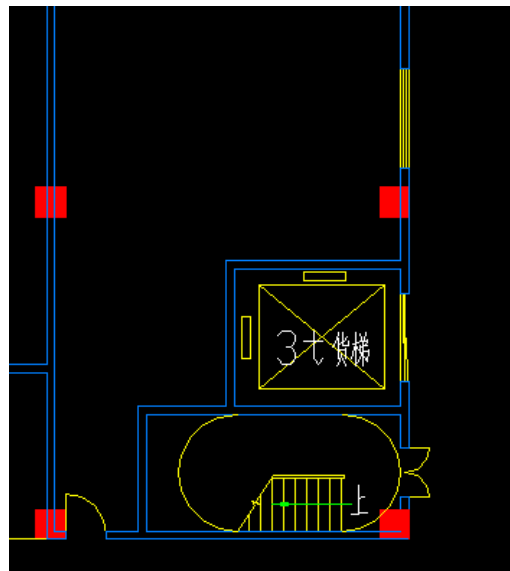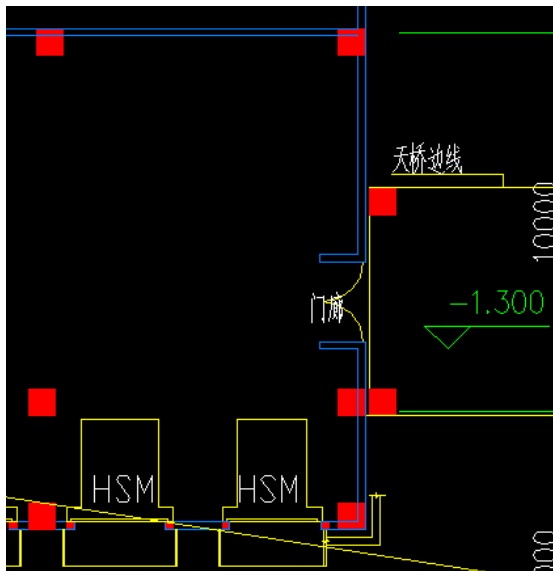

实地建设图纸：

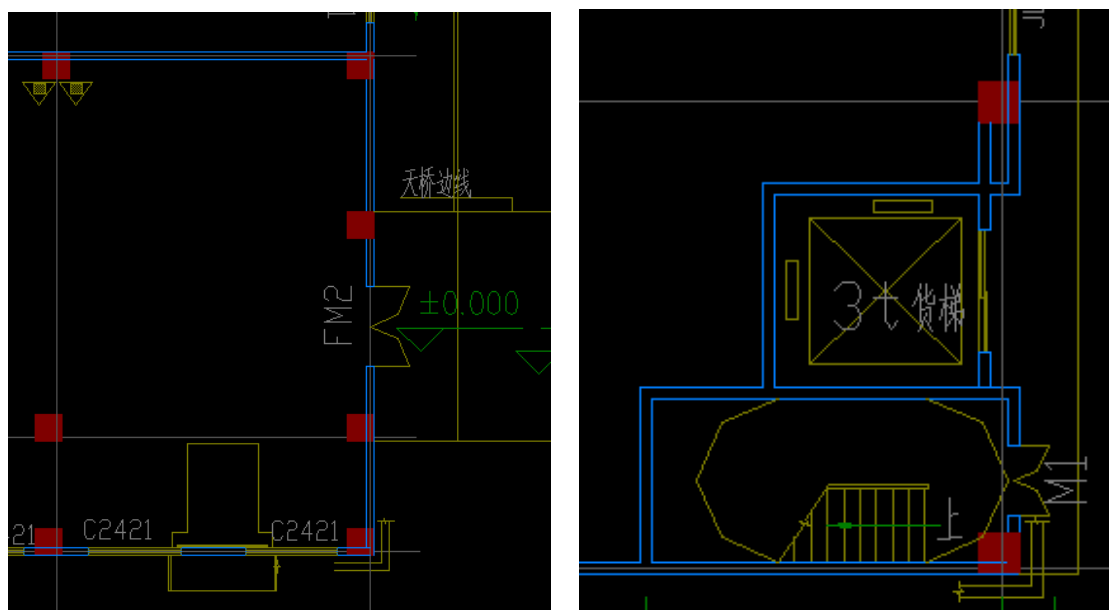


10. 水产品加工车间二层、三层外走廊实地建设为内走廊，建筑及计容面积增大 2.10 m^2 。（图同上）

说明：施工过程中按需调整了穿堂东侧门的位置，导致该区域建筑面积略有增大。


11. 水产品加工车间屋面层东侧增建一个设备间，建筑及计容面积增大 40.37 m^2 。

说明：施工过程中按工艺要求增设设备间，导致该区域建筑面积略有增大。

审批文本图纸：

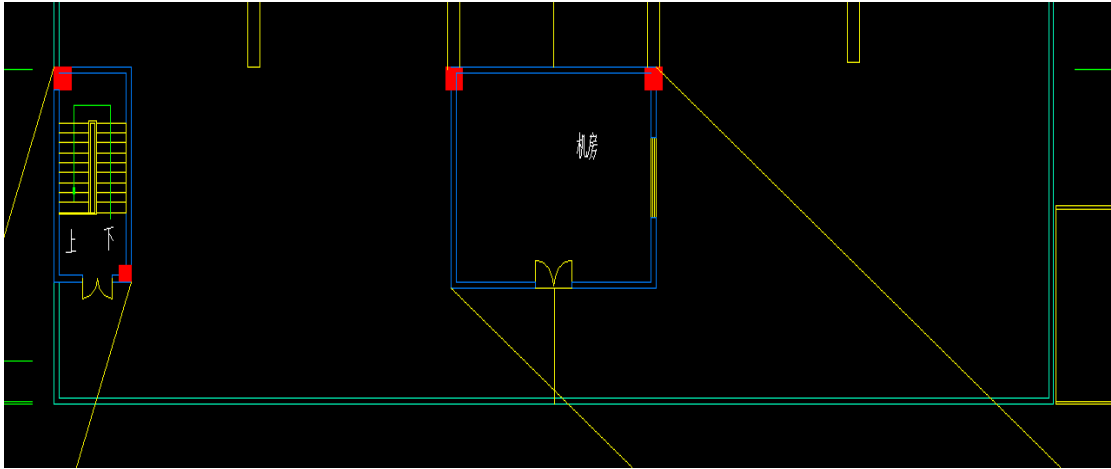

实地建设图纸：

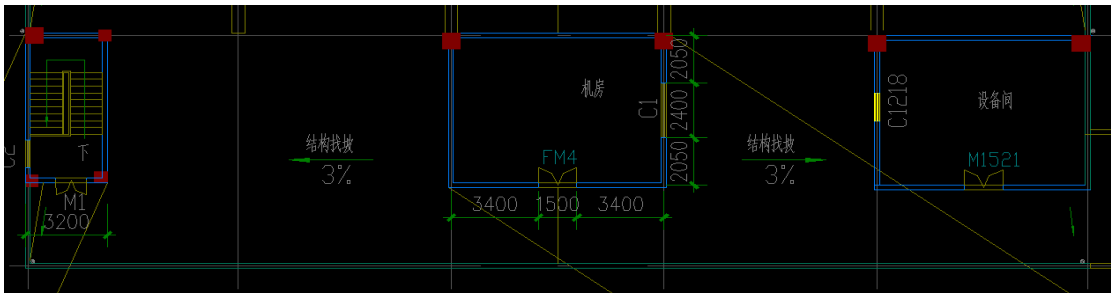

12. 传达室西侧墙体向西移动 0.62m，南侧墙体向北移动 1.50m，占地、建筑及计容面积减小 8.61 m²。

说明：施工过程中按实际需求西侧和南侧墙体的位置，传达室的外轮廓变小，导致该区域占地、建筑及计容面积略有减小。

分层图对比：



13. 部分建筑层高与审批值不一致。

楼号/层次	审批高度 (m)	实测高度 (m)
办公楼 6 层	3.60	3.70
2#水产品冷库及 加工车间 1 层 (加 工车间)	5.00	5.19
2#水产品冷库及 加工车间夹层 (加 工车间)	4.20	4.01
水产品加工车间 1 层 (附属 楼)	5.00	5.20
水产品加工车间夹层 (附属 楼)	4.20	4.00
传达室 1 层	6.00	5.92
传达室建筑高度	7.10	6.79


说明：根据实际生产及施工需要对局部层进行微调整导致建筑层高产生误差，与审批值不一致。

14. 部分绿地轮廓与审批绿地轮廓不一致，审批绿地面积

4003 m²，实测绿地面积 4094.98 m²。（详见附件）


说明：根据实际生产需要对局部绿化进行深化调整，目前调整后绿地率仍然满足规划审批。

万吨冷链产业园（变更）建筑占地、绿地分布对比略图

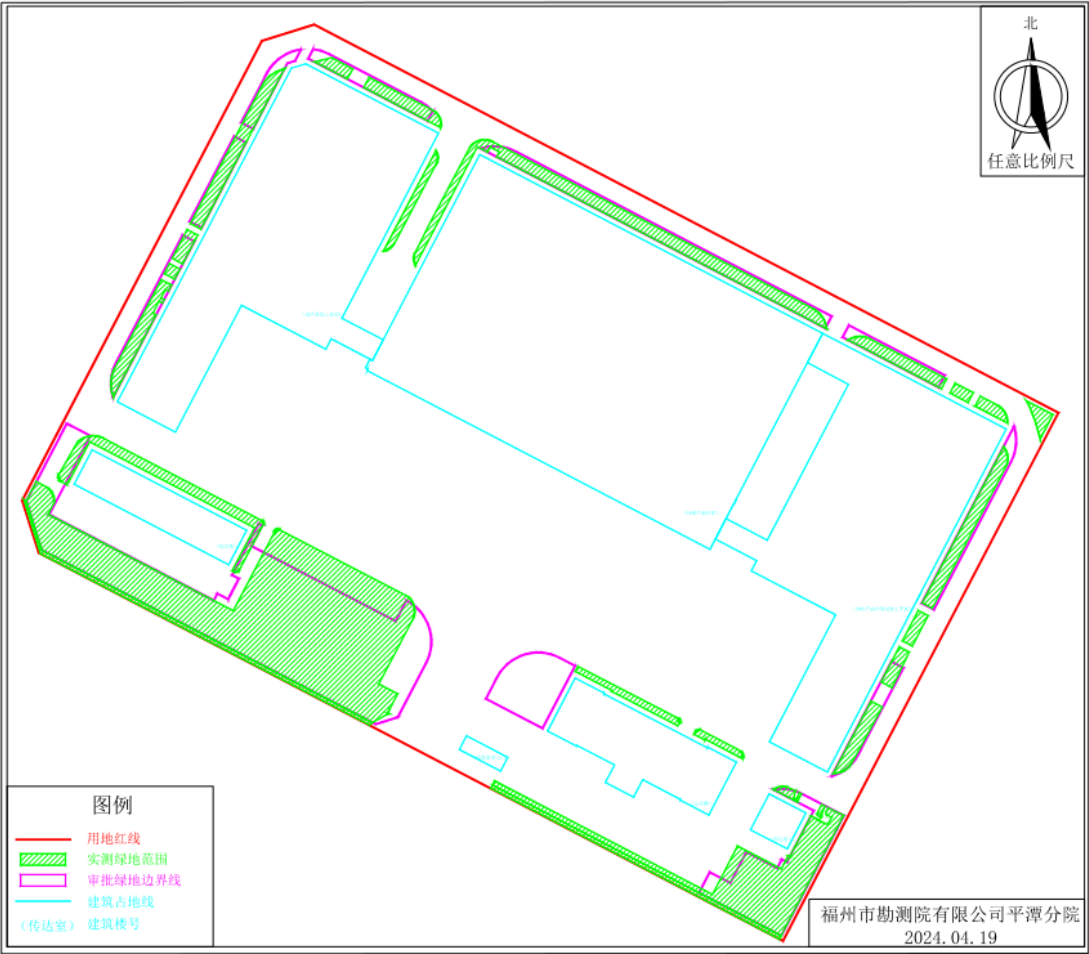

15. 部分非机动车位位置调整，部分机动车位位置调整；
审批机动车位 46 部，其中快充车位 5 部，慢充车位 10 部，
实地机动车位 48 部，充电车桩未安装。（详见附图）

说明：充电线路已经预留，由于资金及室外天气腐蚀，且暂时
实际不需要，我司承诺后期需要安装完整

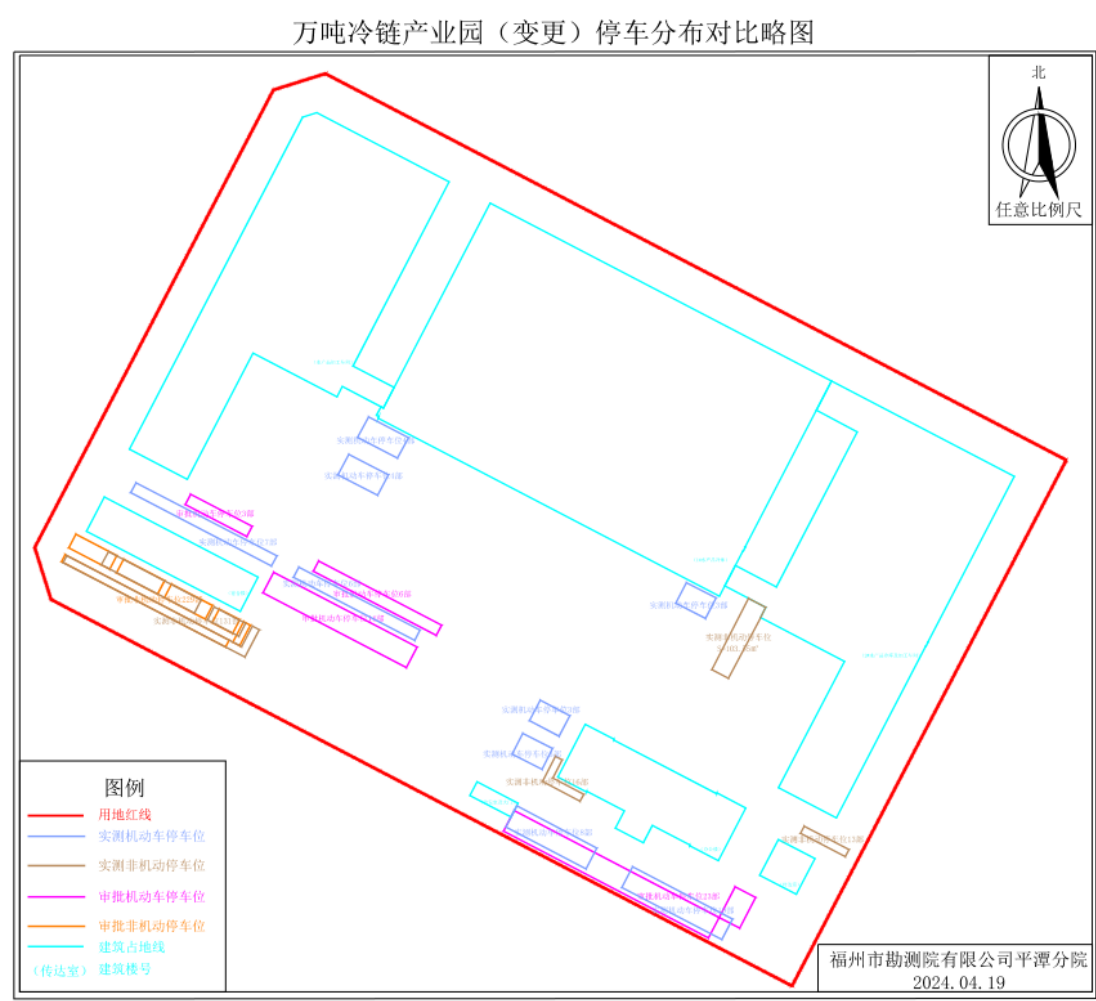

16. 埋地式污水处理池、隔油池、化粪池实地无法测量，
轮廓及位置依据甲方提供的《室外排水总平面图》测算所得。
埋地式隔油化粪池位置调整，审批隔油化粪池构筑物占地面积
 60 m^2 ，实地建设隔油池及化粪池构筑物占地面积 46.52 m^2 。（详见附图）

说明：根据实际生产需求深化调整。

万吨冷链产业园（变更）构筑物分布对比略图

