

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 高铁消防站暨战勤保障大队项目 竣工规划条件核实公示

高铁消防站暨战勤保障大队项目位于平潭综合实验区中楼乡和平大道与麒麟大道交叉西北侧。我局于2020年7月16日核发该项目建设工程规划许可证，编号为：建字第350128202000049号。

经核对相关报批申请材料并现场踏勘，发现该项目存在实地建设与原审批不一致等问题（详见附件），但实地建设相关指标均符合规划要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站 <http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2025年5月20日至2025年6月3日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，

视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图。

2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网站公示公告栏（<http://www.pingtan.gov.cn>）。

3. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。

4. 联系人：高工，联系方式：0591-23163333，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局
2025年5月19日




附件


高铁消防站暨战勤保障大队项目 实地建设与规划审批不一致对比分析

1、战勤、高铁消防站一层 A-A 轴交 A-2 轴处雨披西侧东移 0.15m，东侧西移 0.25m，南侧北移 0.05m，建筑及计容面积减小 0.84 m²。

分层图对比：

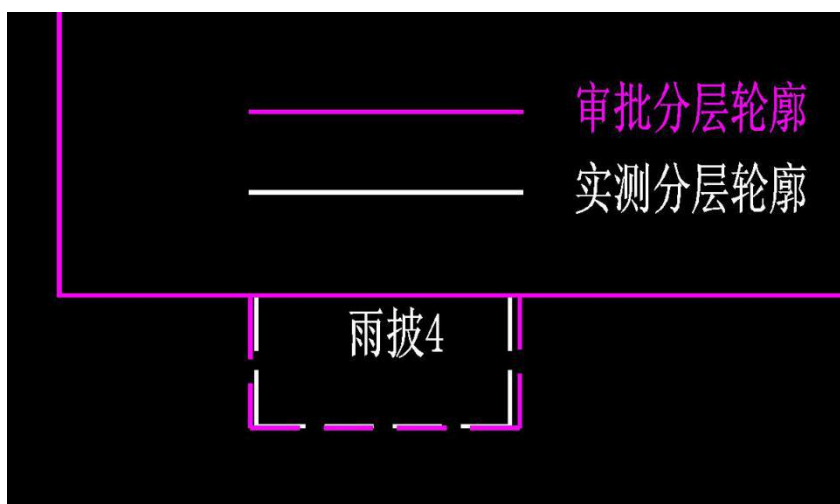


实测分层图叠套审批图纸：

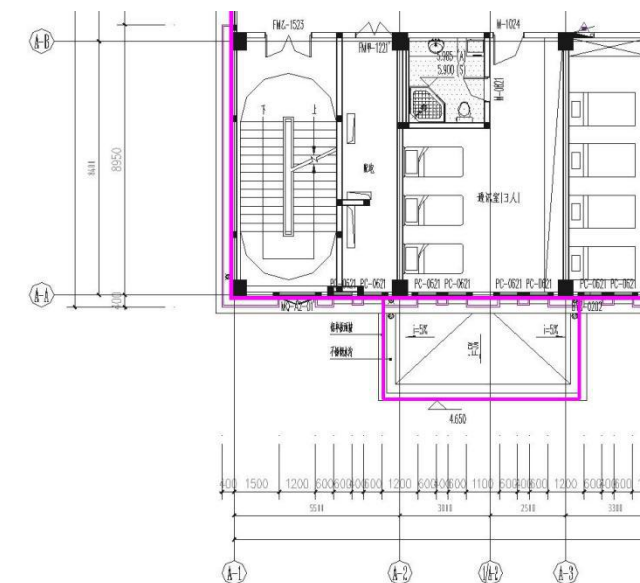


调整原因：根据建筑出入口位置及建筑部位整体协调性进行微调，未改变原设计使用功能。

2、战勤、高铁消防站屋面层 A-C 轴交 A-3 轴及 A-7 轴、A-K 轴交 A-4 轴南侧、A-L 轴交 A-8 轴北侧排烟风机遮雨罩实地未建，建筑及计容面积减小 59.75 m²。

实测分层图叠套审批图纸：

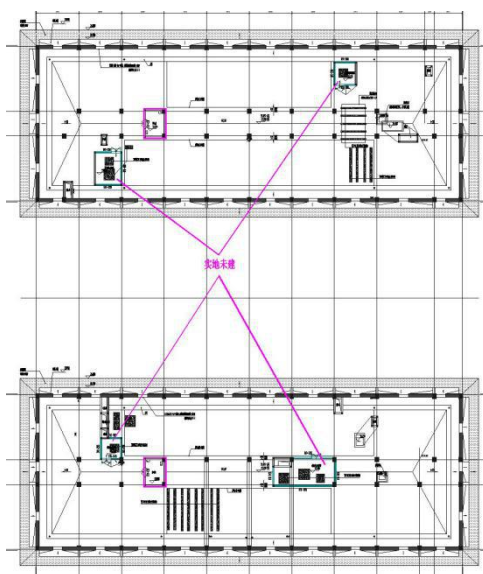


未建排烟风机遮雨罩：

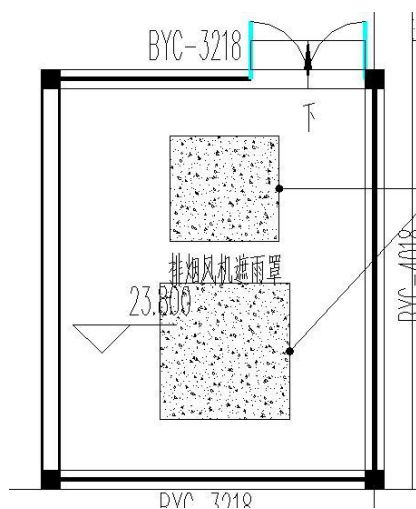


调整原因：排烟风机上方已有专用雨披，考虑排烟风机排烟效能及设备维护，未建设遮雨罩，不影响项目整体规划。

3、业务及体能训练馆一层 B-E 轴交 B-3 轴处雨披西侧东移 0.25m，北侧南移 0.30m，东侧西移 0.15m，建筑及计容面积减小 1.81 m²。

分层图对比：

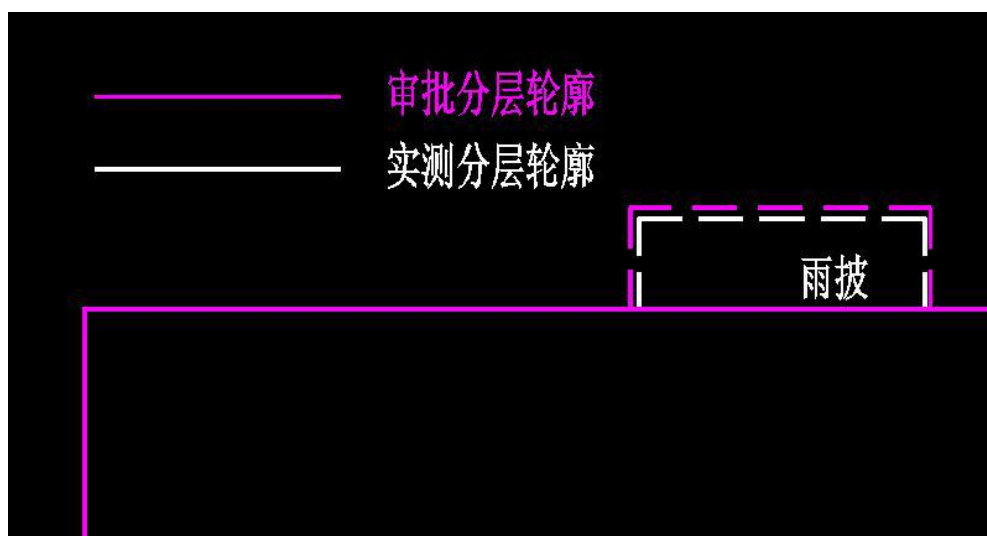


实测分层图叠套审批图纸：

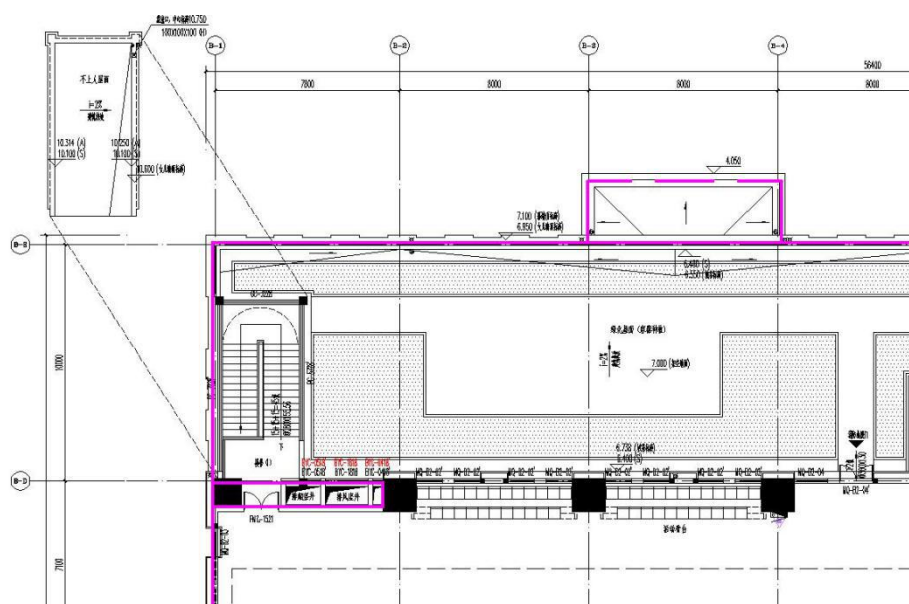

4、业务及体能训练馆屋顶 B-D 轴交 B-6 轴至 B-7 轴北侧中空西侧墙体东移 0.25m，东侧墙体西移 0.25m，屋顶层 B-D 轴南侧墙体南移 0.20m，建筑及计容面积增大 6.62 m²。


 审批分层轮廓
 实测分层轮廓

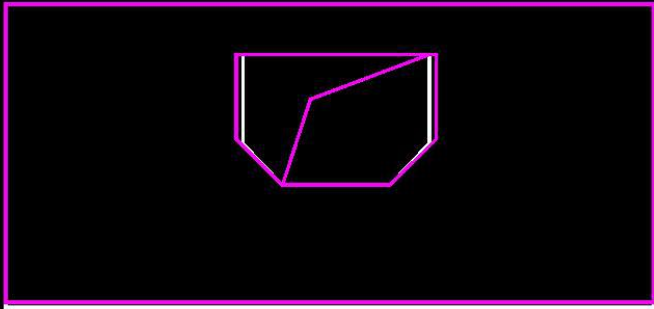[illegible]


调整原因：根据现场实际建设情况进行优化，不影响项目整体规划。

5、执勤生活辅助用房一层 C-C 轴交 C-9 轴处竖井南侧墙体南移 0.35m，占地及建筑面积增大 1.05 m²，计容面积不变；C-E 轴交 C-7 轴处雨披北侧南移 0.35m，东侧东移 0.30m，建筑及计容面积减小 0.54 m²。

分层图对比：

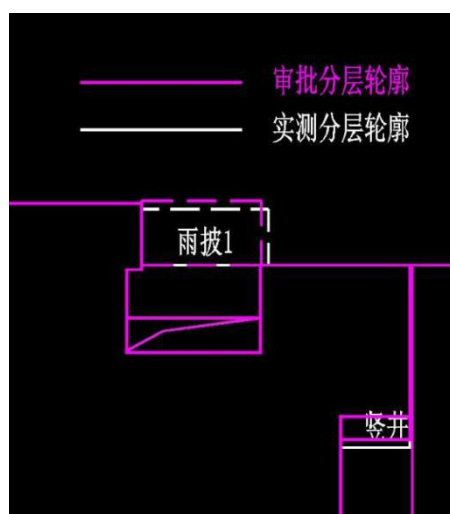

实测分层图叠套审批图纸：

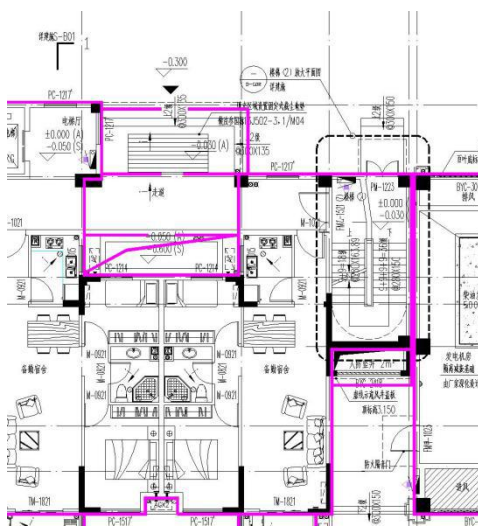


调整原因：考虑建筑出入口位置、建筑部位整体协调性


及竖井的长期维护检修进行调整，，不影响项目整体规划。

6、2#门卫一层 D3-A 轴交 D3-1 轴至 D3-2 轴部分墙体南移 0.30m，建筑及计容面积增大 0.72 m²。

分层图对比：

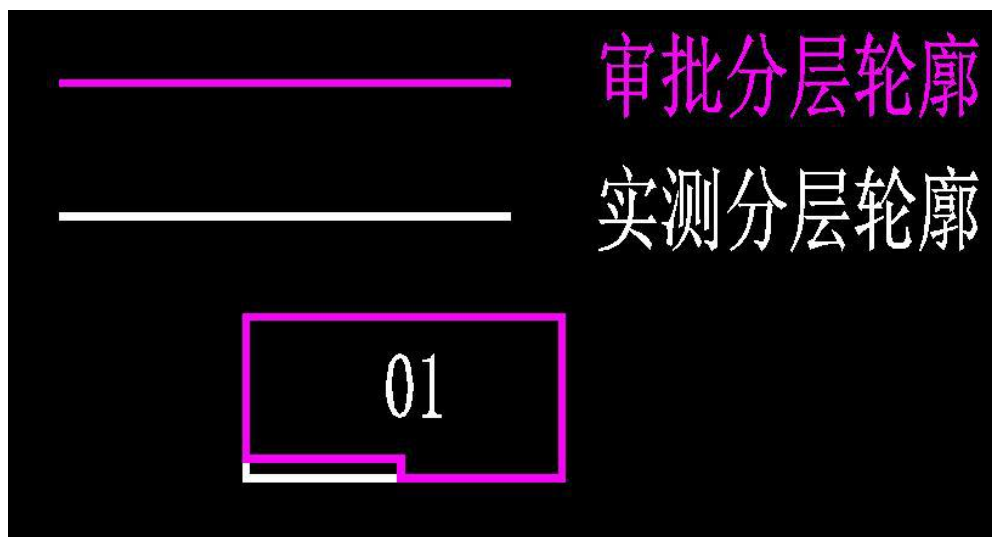

实测分层图叠套审批图纸：

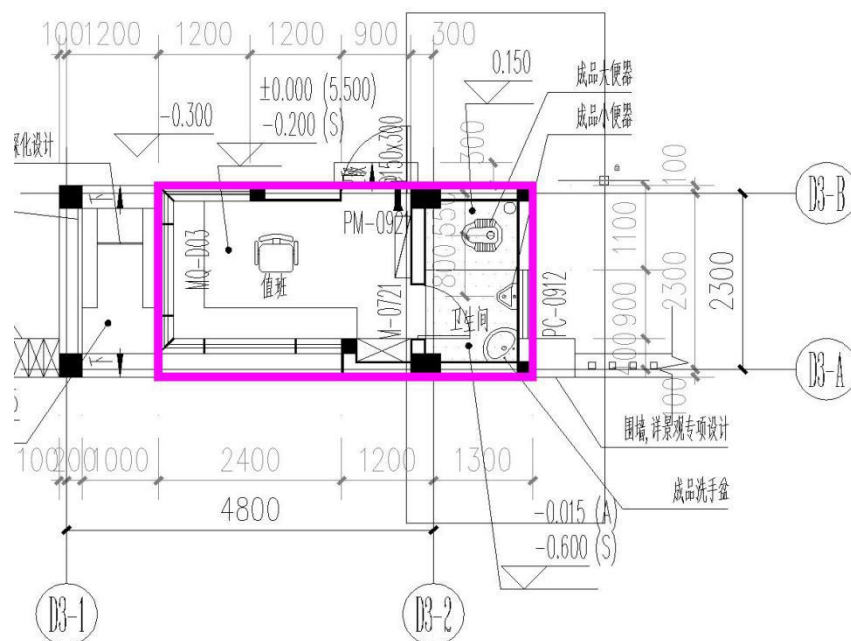

调整原因：根据建筑整体协调性进行调整，不影响项目

整体规划。

7、实测室内±0标高与室外标高均比审批值抬高约0.70m。

楼号	审批±0 标高	实测±0 标高
战勤、高铁消防站	4.70m	5.46m
业务及体能训练馆	4.70m	5.44m
执勤生活辅助用房	4.70m	5.45m
1#门卫	4.70m	5.41m
2#门卫	4.70m	5.42m
综合训练塔	4.70m	5.38m


调整原因：根据周边市政道路实际标高进行调整，不影响项目内部及周边道路排水问题，不影响项目功能使用和整体规划。

8、审批地下室机动车位 44 辆，其中慢充车位 7 辆，快充车位 1 辆；实测地下室机动车位 45 辆（2 辆微型车位实地施工为标准车位），充电桩未安装。审批地面非机动车位 160 辆（双层非机动车位），实地非机动车位 178 辆（非机动车位面积 267.12 m²，非机动车位轮廓调整）。

审核内容		审批情况	实际建设情况	备注
地下机动停车位		40 辆（总平面图）	45 辆	/
		44 辆（施工图）		
其中	标准停车位	35 辆	45 辆	/
	普通充电停车	7 辆	/	充电桩未安装

	位			
	快充停车位	2 辆	/	充电桩未安装
非机动车停车位合	计	160 辆	178 辆	/
地面非机动车停车	位	160 辆 (双层非机动车 位)	178 辆 (267.12 m ²)	地面非机动车位 按 1.5 m ² /辆计算

高铁消防站暨战勤保障大队非机动车位分布对比略图

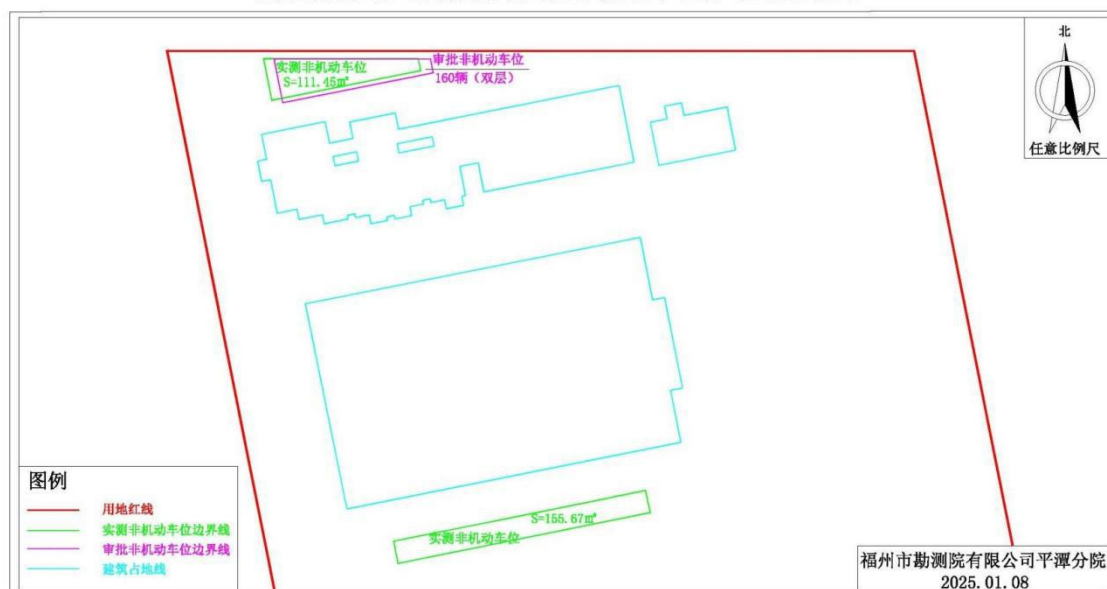


调整原因：（1）因项目还未投入使用，目前正在采购相关配套设施，建设单位承诺在 2025 年 12 月 31 日前建设充电桩投入使用。（2）根据现场情况对非机动车位进行调整，满足车位审批指标要求。

9、总平面图审批绿地面积 4930.82 m²，绿地率 25%；实测绿地面积 4992.71 m²（含操场绿地面积 1944.14 m²），绿地率 25.32%；实地部分绿地轮廓与审批绿地轮廓不一致。


调整原因：绿地轮廓根据现场实际建设情况进行优化调

整，绿地率满足规划审批要求。

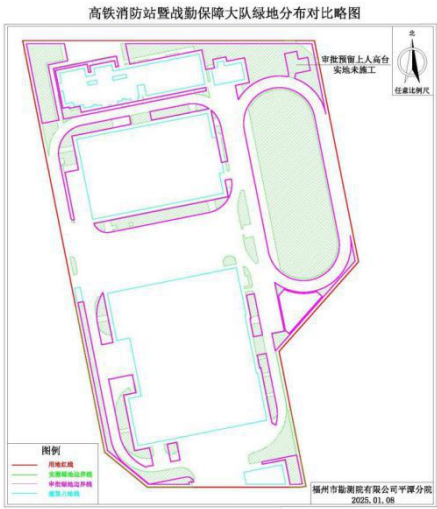

10、实地围墙形式与审批方案文本不一致，东北侧围墙部分超用地红线。

审批围墙形式：

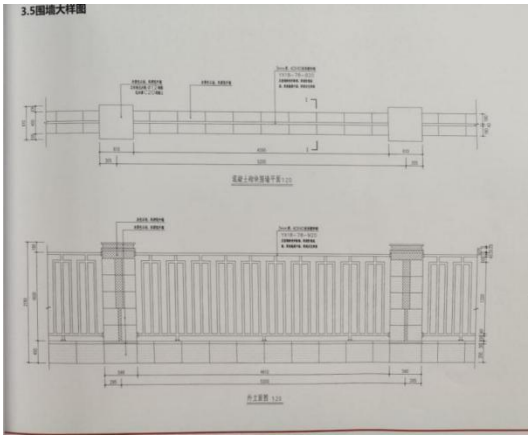

实地围墙照片：



调整原因：（1）围墙形式根据项目实际建设情况进行优化调整，不影响项目功能使用和整体规划。（2）本项目东北侧围墙边为韩厝村 116 号民房（民房主体建筑入户门正对围墙），原征地拆迁范围未将其纳入拆迁范畴，经区重点项目建设总指挥部、君山片区管理局、韩厝村协商，最终确定暂时将原红线内的围墙“削尖取直”进行调整施工，并留出与居民房外墙有一定安全距离的位置建设过渡期围墙，建设单位承诺待今后居民房拆迁后，再恢复至项目原审批红线位置建设永久性围墙。
